


陕西路桥统计简报

(第8期总期286期)

主办：陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一三年九月



施工计划完成动态图

二〇一三年十月九日

2013年9月份计划执行情况分析

一、主要经济指标

截止本月底累计完成施工产值 189866.27 万元，为计划的 86.30%，高于去年同期水平的 24.37%。全员劳动生产率 359550 元/人，高于去年同期水平的 23.27%。第三季度完成计划的 100.74%，本月完成产值 32123.22 万元。

二、主要工程形象进度（累计完成情况）

青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 1233/1469 片、矩形板 554/368 片、空心板 294/374 片，分别为合同量的 84%、150%、77%。矩形板安装 498/368 片、梁安装 659/1469 片、空心板安装 76/374，为合同量的 135%、45%、20%。

青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km^3 ，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 16/16 根、盖梁 4/12 个，为合同量的 100%、100%、33%。隧道开挖 1854/3230m、支护 1849/3230m、衬砌 1506/3260m，分别为合同量 57%、57%、46%。

青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 540/567 km^3 、钻孔桩 341/327 根、墩柱 239/222 根、盖梁 61/61 个、梁预制 190/205 片，箱梁安装 145/205 片，现浇箱梁 7 联，为合同量 95%、104%、108%、100%、93%、71%、50%。

青海西宁南绕城公路土建工程 12 标段

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 184km、土方 184 km^3 ，为合同量的 154%、35%、13%。钻孔桩 651/635 根、墩柱 392/435 根、盖梁 126/158 个、梁板 757/1124 片、梁板安装 334/1124 片，为合同量 102%、90%、80%、67%、30%。

延志吴高速公路路面 LM-3 标

累计完成底基层 204/294 km^2 、基层 200/285 km^2 ，下面层 188/184 km^2 、中面层 581/537 km^2 、上面层 585/579 km^2 ，分别为合同量的 69%、70%、102%、108%、101%。

延志吴高速公路桥隧路基 LJ-7-1 标

累计完成钻孔桩 12/12 根、墩柱 74/74 根、盖梁 94/94 片,箱梁预制 389/389 片、箱梁安装 542/542 片、T 梁预制安装 24/24 片,分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%、100%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个,为合同量的 100%、100%、100%;全断面掘进 2154/3840m,仰拱填充 2054/3870m,二衬 1921/3870m,分别为合同量的 56%、53%、50%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 431/540 根、盖梁 184/274 片、预制梁 709/1380 片、梁安装 405/1380 片,为合同量的 100%、80%、67%、51%、29%。

连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标

累计完成土方 142 km³,为合同量的 78%;水泥搅拌桩 154km,为合同量的 62%;底基层 488/588 km²、级配碎石 34/27km²、面层 192/270 km²;分别为合同量的 83%、128%、71%;桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、空心板预制 255/255 片,分别为合同量 100%、100%、100%。

连云港市徐圩新区港前大道工程(GQDD-BT)标段

累计完成土方 627km³,为合同量的 118%;水泥搅拌桩 142km,为合同量 210%;软土处理钢塑格栅 27km²,为合同量的 111%。底基层 307/454 km²、基层 256/444km²、4cmAC-13 沥青 255/435 km²,分别为合同量的 68%、58%、59%;桩基 120/96 根、墩柱 48/48 根、空心板预制 294/270 片,分别为合同量 125%、100%、110%。排水管道 17/41km,为合同量的 41%。

河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标

累计完成借土填方 1362/1478 km³,为合同量的 92%。钻孔桩 714/714 根、墩柱 470/470 根、盖梁 114/114 片、箱梁预制 508/508 片、安装 484/508 片,分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、95%。

三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成 32123.22 万元,为计划的 119.07%,其中:

- 1 青海茶格高速公路 CGYZ-1 标完成计划的 217.28%;
- 2 十天高速公路汉略路面 HL-M04 标完成计划的 178.58%;

- 3 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 136.81%;
- 4 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 129.12%;
- 5 河北京台廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 120.64%;
- 6 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 120.63%;
- 7 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 120.37%;
- 8 铜黄高速公路路基桥隧 TH-12 标完成计划的 104.52%;
- 9 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 103.61%;
- 10 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 100.15%;
- 11 江苏连云港新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 86.20%;
- 12 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 73.49%;
- 13 湖南龙永高速公路路基 24 标完成计划的 70.13%;
- 14 江苏连云港徐圩新区港前大道工程完成计划的 42.06%。
- 15 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 34.10%;

四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 89.98%;
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 71.70%;
- 3 第三工程公司完成计划的 76.09%;
- 4 第四工程公司完成计划的 65.90%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 90.66%;
- 6 试验检测中心完成计划的 92.03%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 75.59%;
- 8 集团公司合作项目完成计划的 74.46%。

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 延志吴高速公路路基 TJ7-1 标完成计划的 107.15%;
- 2 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 97.80%;
- 3 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 95.05%;
- 4 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 89.23%;
- 5 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 85.97%;
- 6 铜黄高速公路 TH-20 标完成计划的 82.35%;
- 7 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 81.71%;
- 8 铜黄高速公路 TH-12 标完成计划的 76.49%;
- 9 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 70.19%;
- 10 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 69.86%;
- 11 连云港市徐圩新区 XX-2 标完成计划的 61.10%;
- 12 连云港市徐圩新区港前大道完成计划的 60.03%;

13 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 53.67%。

六、简要分析与建议：

1.分析：

本月计划执行比较好，但各项目计划执行情况不一样。18 个重点项目中有十天汉略 4 标等 11 个项目超完成任务，青海共玉 4 标、龙永 24 标、徐圩新区 2 标完成比较好，超过计划的七成多点，连云港 BT 项目、西咸北环线 1 标、延延 1 标完成不到计划的 50%，其存在问题：

(1)旬阳 LD 项目冬青桥台背处为大坝选址处，影响了箱梁安装；(2)西咸北环线 LJ-1 标、LJ-8 标及店塔立交 LJ-N1 标征地等问题业主仍未解决，影响施工进度。(3)连云港项目资金严重制约施工进度。(4)龙永项目部分临时征地仍未解决。

2.建议：

一公司协助抓好龙永 24 标、铜黄 12 标等项目施工进度。调整施工计划，落实保证措施，最大限度的弥补欠产，确保项目年计划完成。

二公司要协助西宁 11 标抓紧上跨铁路施工方案审批；同时与建设单位沟通联系，解决已完变更项目单价审批，及时回收工程款减少资金压力。青海花久项目加快临建工程建设，抓紧与业主沟通，加快落实施工图方案。

三公司要重点协助青海共玉 A4 标加计划管理力度，确保进度，落实计划保证措施。西宁 9 标隧道，针对隧道施工过程中的质量通病进行预防及控制，随着地质围岩变化，在保证质量和安全的前提下加快施工进度。

四公司协助铜黄 20 标在保证质量和安全前提下，合理控制施工进度。要采取有力措施，加快在建项目施工进度。同时要积极联系业主，协调解决店塔立交、西咸北环线 LJ-1 标、LJ-8 标征地问题，确保进场和工程进度。

路面公司 BT 项目由于资金原因影响，要重点督促连云港港前大道及徐新路项目施工进度。

七、其他情况说明

1 统计资料以项目部提供的为准，统计产值统计截止日期为 9 月 30 日。

2 集团公司各部门采用统计数据，请依此数据为准。

2013 年 9 月 30 日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

集团公司2013年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	本月计划	实际完成	完成率	
工程项目合计		640708.37	304763.33	240000.00	189866.27	79.11%	86250.00	86890.82	100.74%	26979.55	32123.22	119.07%	47.57%
陕西路桥第一工程有限公司		113332.99	73289.05	56634.81	50961.13	89.98%	19976.00	22165.87	110.96%	5900.00	8164.39	138.38%	64.67%
1	京台公路廊坊路基桥隧工程1标	37365.23	39083.01	18742.00	18329.79	97.80%	6432.00	7102.21	110.42%	1689.00	2037.65	120.64%	104.60%
2	延志吴高速公路LJ-7标	12974.44	12928.74	8541.53	9151.85	107.15%	1217.00	1827.32	150.15%		259.46		99.65%
3	铜黄公路路基桥涵施工TH-C12标段	21268.36	11008.34	14391.44	11008.34	76.49%	5521.00	4567.90	82.74%	1790.00	1870.96	104.52%	51.76%
4	青海茶卡至格尔木预制CGYZ1标	22640.71	8278.28	8386.91	8278.28	98.70%	4724.00	7389.69	156.43%	1562.00	3393.93	217.28%	36.56%
5	龙永高速公路24标	19084.25	1990.68	5572.93	1990.68	35.72%	2082.00	1278.75	61.42%	859.00	602.39	70.13%	10.43%
	待定计划、尾留产值			1000.00	2202.20								
第二工程公司		113661.51	30136.72	34639.73	24837.32	71.70%	14785.00	14584.63	98.64%	5105.75	5427.80	106.31%	26.51%
1	西宁南绕城公路土建工程11标	22034.92	13759.45	10121.42	8701.55	85.97%	4642.00	4448.61	95.83%	1531.00	1533.24	100.15%	62.44%
2	西宝高速咸阳收费站改扩建工程	1990.00	1993.00	1506.10	1621.81	107.68%	224.00	339.72	151.66%				100.15%
3	西安绕城新筑收费站宿办楼工程	2000.00	315.40	500.00	315.40	63.08%		315.40			315.40		
4	延延高速公路路基桥涵工程LJ-6标	25162.45	10514.72	15000.00	10514.72	70.10%	6573.00	7041.96	107.13%	2142.00	2219.35	103.61%	41.79%
5	延志吴立交安设设施AQ2标	2013.25	1754.24	1828.03	1754.24	95.96%	1275.00	1201.21	94.21%	468.95	545.07	116.23%	87.13%
6	福银公路咸阳东收费站宿办楼	2580.71	86.21	828.59	86.21	10.40%	185.00	0.00	0.00%		37.48		3.34%
7	佛坪县陈三库周交通重建工程	2712.40	456.33	1324.74	456.33	34.45%	462.00	391.59	84.76%	274.32	161.10	58.73%	
8	青海花九HD-13标	54508.39	597.77	3200.00	597.77		1200.00	597.77		600.00	597.77	99.63%	
9	勉县收费站改扩建MX-KJ合同段	659.39	659.59	330.85	355.21	107.36%	224.00	248.37	110.88%	52.00	55.87	107.43%	100.03%
	尾留产值				434.06			0.00					
第三工程公司		151027.11	55107.34	42463.71	32311.99	76.09%	16474.00	17123.31	103.94%	5505.96	6521.51	118.44%	36.49%
1	青海省共和至玉树公路GYI-SGA4标	21719.39	10911.51	9878.00	6900.30	69.86%	4902.00	3984.97	81.29%	2263.80	1663.77	73.49%	50.24%
2	西宁南绕城公路土建工程9标	37800.00	23684.24	13376.00	10930.06	81.71%	3929.00	4793.80	122.01%	1205.16	1648.77	136.81%	62.66%
3	西宁南绕城公路土建工程12标	29000.00	16932.69	11618.00	10367.30	89.23%	4643.00	5658.34	121.87%	1551.00	2002.61	129.12%	58.39%
4	神渭管道输煤项目六(1)标段	2928.53	1966.32	2966.00	1966.32	66.30%	947.00	910.89	96.19%	320.00	455.57	142.37%	67.14%
5	田峪河桥	341.20	341.20	341.34	341.20	99.96%	220.00	219.86	99.94%	45.00	57.15	127.00%	100.00%
6	西安2013年国省干线危桥改造工程	1174.02	222.17	455.79	222.17	48.74%	339.00	105.38	31.08%	121.00	14.03	11.60%	18.92%
7	陕西交通2013年养护工程QS-5标	314.08	307.31	358.58	307.31	85.70%	224.00	172.73	77.11%				97.84%
8	陕西交通2013年养护工程QS-6标		129.79	270.00	129.79	48.07%	270.00	129.79	48.07%		67.50		
9	黄延高速公路LJ-3标段	57749.89	612.11	3200.00	612.11	19.13%	1000.00	612.11	61.21%	600.00	612.11	102.02%	
10	尾留产值				535.43			535.43					

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


集团公司2013年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
第四工程公司		125103.40	23609.54	31891.00	21015.95	65.90%	10549.00	10098.75	95.73%	3789.00	4191.83	110.63%	18.87%
1	西铜高速公路 TH-20 标	33,468.18	18145.72	18074.54	14885.16	82.35%	4882.00	5192.18	106.35%	1480.00	1785.28	120.63%	54.22%
2	蓝田至周至哑柏公路 A6 标	3604.00	1894.72	1800.00	1455.59	80.87%	946.00	1396.49	147.62%	265.00	994.32	375.22%	52.57%
3	西咸新区北环线路基 LJ-1 标	4227.38	63.45	1200.00	63.45	5.29%	340.00	63.45	18.66%	180.00	63.45	35.25%	
4	神木石窑大桥	538.81	439.13	578.46	439.13	75.91%	291.00	151.67	52.12%		69.65		81.50%
5	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	19,447.00	2199.73	5340.00	2199.73	41.19%	2392.00	1382.41	57.79%	922.00	412.34	44.72%	11.31%
6	店塔立交 N1 标	9855.16		2098.00			548.00			292.00			
7	西咸新区北环线路基 LJ-8 标	53962.87	866.80	2800.00	866.80	30.96%	1150.00	866.80	75.37%	650.00	866.80	133.35%	1.61%
8	尾留产值				1106.10			1045.75					
陕西路桥路面工程有限公司		70491.76	64399.43	50846.88	46097.97	90.66%	20376.00	19128.25	93.88%	4588.84	5742.01	125.13%	91.36%
1	连云港徐圩新区港前大道工程建设	29047.27	22725.61	11700.22	7023.89	60.03%	4270.00	2298.35	53.83%	983.00	413.48	42.06%	78.24%
2	新海至徐圩新区 XX-2 标	15406.18	9936.85	9737.87	5950.24	61.10%	4770.00	1684.39	35.31%	1000.84	862.72	86.20%	64.50%
3	延志吴高速公路 LM-3 标段	12208.00	14976.74	12056.17	11458.86	95.05%	3904.00	4222.80	108.17%	1268.00	1526.29	120.37%	122.68%
4	连云港其他项目	555.36	555.36	552.05	555.36	100.60%					3.31		100.00%
5	十天高速公路陕西汉略 HL-M04 标	9075.29	10171.17	9955.93	10171.17	102.16%	4187.00	6188.65	147.81%	937.00	1673.27	178.58%	112.08%
6	2013 年公路养护工程	4199.66	6033.69	4544.64	6033.69	132.67%	3245.00	4734.06	145.88%				143.67%
7	西宝改扩建工程			500.00									
8	待定计划			1800.00									
9	尾留产值				4904.75			0.00					
试验检测中心				360.00	331.31	92.03%	90.00	95.17	105.74%	90.00	95.17	105.74%	
兴通监理公司				2850.00	2154.28	75.59%	1000.00	704.91	70.49%	1000.00	704.91	70.49%	
二、集团公司合作项目		67091.60	58221.25	11929.00	8882.47	74.46%	3000.00	2989.93	99.66%	1000.00	1275.60	34.10%	86.78%
1	延延高速公路路基 LI-1 标	9736.00	3757.04	7000.00	3757.04	53.67%	3000.00	2055.29	68.51%	1000.00	340.96	34.10%	38.59%
2	省道 303 线二级公路长米段土建工程	3733.00	4180.00	400.00	934.63	233.66%		934.63			934.63		111.97%
3	梅大高速公路土建工程 4 标段	28748.45	25839.02	3370.00	3370.69	100.02%		0.00					89.88%
4	粤湘高速博深段第 8 标段	24874.15	24445.19	1159.00	820.11	70.76%		0.00					98.28%
三、集团公司尾留项目				11594.87	3273.85			0.00					

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


2013年重点项目生产计划完成情况图表

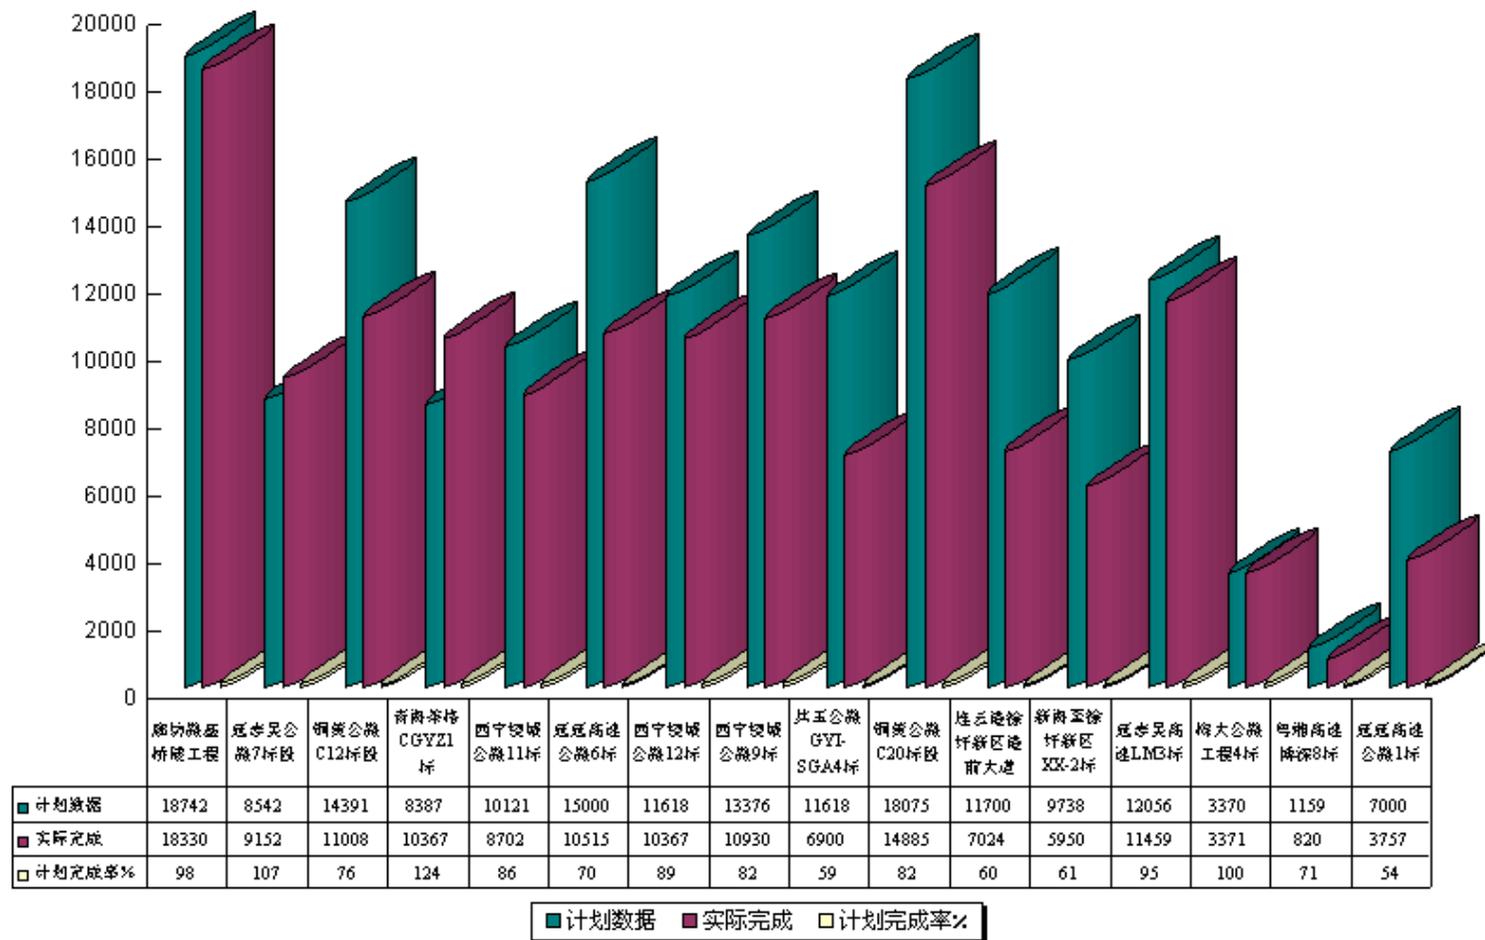

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

2013年重点项目合同履行统计图表

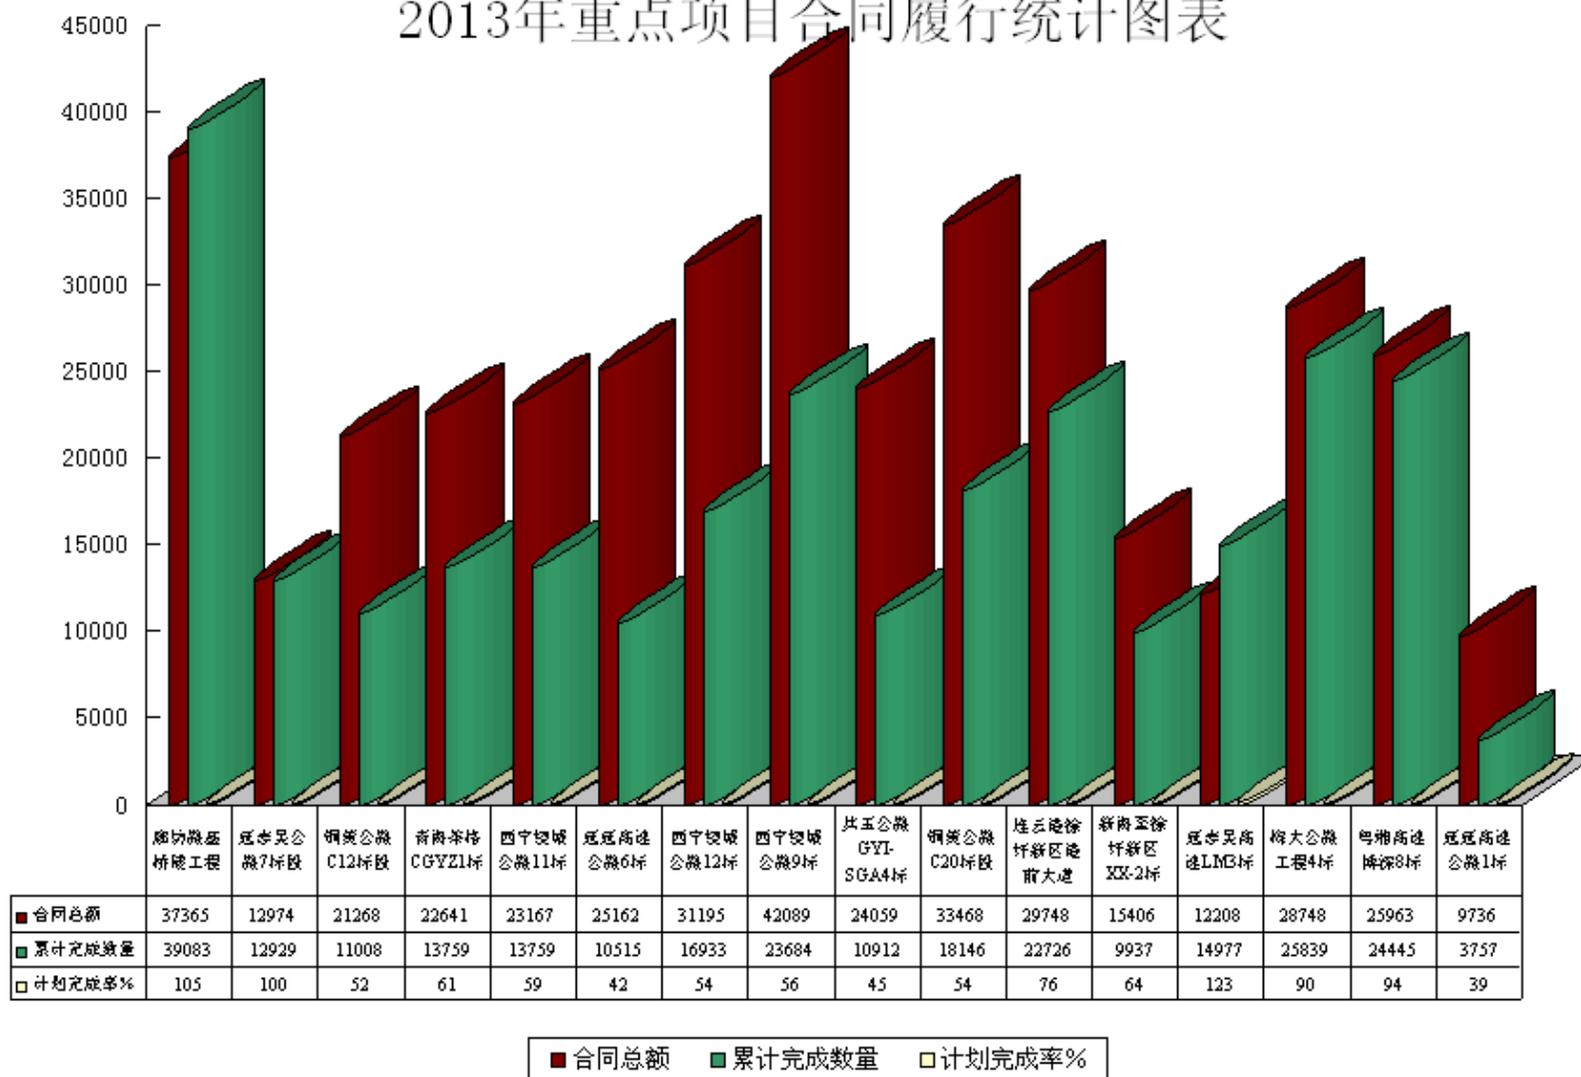

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣
