


# 陕西路桥统计简报

SHAANXI LU QIAO JI TUAN TONG JI JIAN BAO

陕西路桥集团有限公司

2013 年第 4 期总第 282 期

2013 年 5 月

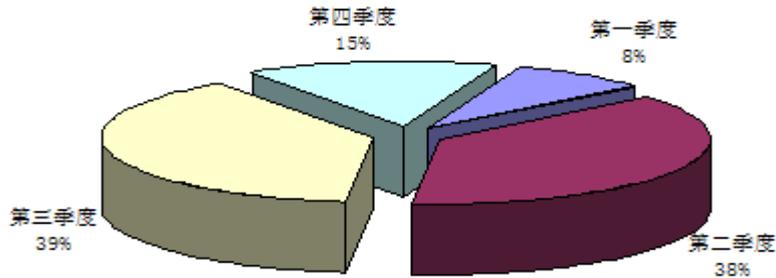

施工计划完成动态图

陕西路桥施工管理部

## 2013年5月份计划执行情况分析

### 一、主要经济指标

截止本月底累计完成施工产值 68335.08 万元，为计划的 31.06%，高于去年同期水平的 22.40%。全员劳动生产率 151856 元/人，高于去年同期水平的 15.59%。第二季度完成计划的 60.38%，本月完成产值 24548.06 万元。

### 二、主要工程形象进度（累计完成情况）

#### 广东粤湘高速公路博罗至深圳段土建工程第 8 标

累计完成土方 2742/3701km<sup>3</sup>，为合同量的 72%。钻孔桩 390/390 根、墩柱 204/204 根、盖梁 78/78 个、箱梁 335/335 片、空心板 200/200 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%。涵洞 10/10 道、通道 3/4 道，分别为合同量的 100%、75%。

#### 广东梅大高速公路土建工程 4 标

累计完成土方 5878/5377km<sup>3</sup>、桩基 355/405 根、墩柱 185/190 根，盖梁 76/98 片、箱梁 323/323 片、空心板 301/301 片，分别为合同量的 109%、88%、97%、76%、100%、100%。涵洞 33/33 道，为合同量的 100%。

#### 青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 761/1469 片、矩形板 516/368 片、空心板 54/374 片，分别为合同量的 51.8%、140%、14.43%。矩形板安装 442/368 片、梁安装 176/1469 片、空心板安装 14/374，为合同量的 120.1%、11.98%、3.74%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km<sup>3</sup>，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 12/16 根，为合同量的 100%、75%。隧道开挖 1319/3230m、支护 1314/3230m、衬砌 1036/3260m，分别为合同量 40.84%、40.68%、31.78%。

### 青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成钻孔桩 297/327 根、墩柱 158/222 根、盖梁 33/61 个、梁预制 98/205 片，箱梁安装 45/295 片，为合同量 91%、71%、54%、48%、22%。

### 青海西宁南绕城公路土建工程 12 标段

累计完成钻孔桩 398/635 根、墩柱 101/435 根、盖梁 39/158 个、梁板 311/1124 片、梁板安装 160/1124 片为合同量 60%、23%、25%、28%、14%。碎石桩 333km、灰土桩 184km，为合同量的 152%、35%。

### 延志吴高速公路路面 LM-3 标

累计完成底基层 218/294 km<sup>2</sup>、基层 214/285 km<sup>2</sup>，下面层 151/184 km<sup>2</sup>、中面层 167/537 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 74%、75%、82%、31%。

### 延志吴高速公路桥隧路基 LJ-7-1 标

累计完成钻孔桩 12/12 根、墩柱 74/74 根、盖梁 94/94 片，箱梁预制 384/389 片、箱梁安装 525/530 片、T 梁预制安装 22/24 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、99%、99%、91%。

### 铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标

累计完成全断面掘进 1058/3840m，仰拱填充 1022/3870m，二衬 917/3870m，分别为合同量的 30.4%、26.41%、23.69%。

### 铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 344/572 根、墩柱 117/540 根、预制梁 61/1380 片，为合同量的 60%、21.6%、4.42%。

### 连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标

累计完成土方 114 km<sup>3</sup>，为合同量的 71%；水泥搅拌桩 134km，为合同量的 53%；底基层 305/588 km<sup>2</sup>、级配碎石 34/27km<sup>2</sup>，分别为合同量的 52%、126%；桩基 132/170 根、墩柱 36/78 根、空心板预制 177/255 片，分别为合同量 77%、46%、69%。

### 连云港市徐圩新区港前大道工程(GQDD-BT)标段

累计完成土方 435 km<sup>3</sup>，为合同量的 106%；水泥搅拌桩 142km，为合同量 210%；软土处理钢塑格栅 27km<sup>2</sup>，为合同量的 111%。底基层 295/454 km<sup>2</sup>、基层 249/444km<sup>2</sup>、4cmAC-13 沥青 247/435 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 65%、56%、59%；桩基 120/96 根、墩柱 48/48 根、空心板预制 294/294 片，分别为合同量 125%、100%、100%。排水管道 12/41km，为合同量的 29%。

### 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标

累计完成借土填方 1074/1478 km<sup>3</sup>，为合同量的 73%。钻孔桩 714/714 根、墩柱 460/470 根、盖梁 104/114 片、箱梁预制 484/508 片、安装 408/508 片，分别为合同量的 100%、98%、91%、95%、80%。

## 三、项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成 24548.16 万元，为计划的 83.57%，其中：

- 1 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 151.54 %；
- 2 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 149.95%；
- 3 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 135.53%；
- 4 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 121.32%；
- 5 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 109.19%；
- 6 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 104.75%；
- 7 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 104.66%；
- 8 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 103.56%；
- 9 江苏连云港市徐圩新区港前大道工程完成计划的 94.16%；
- 10 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 81.38%；
- 11 延志吴高速公路路基 TJ-7-1 标完成计划的 75.80%；
- 12 十天高速公路汉略路面 HL-M04 标完成计划的 75.29%；
- 13 铜黄高速公路路基桥隧 TH-12 标完成计划的 68.44%；
- 14 江苏连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 52.48%。

## 四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 38.97%；

- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 18.34%;
- 3 第三工程公司完成计划的 24.64%;
- 4 第四工程公司完成计划的 24.91%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 29.82%;
- 6 试验检测中心完成计划的 15.28%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 7.69%;
- 8 集团公司合作项目完成计划的 50.07%。

## 五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 广东梅大高速公路土建工程 4 标完成计划的 141.33%;
- 2 延志吴高速公路路基 TJ7-1 标完成计划的 82.37%;
- 3 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 65.33%;
- 4 铜黄高速公路 TH-20 标完成计划的 48.67%;
- 5 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 41.60%;
- 6 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 41.83%;
- 7 连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 35.51%;
- 8 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 31.92%;
- 9 连云港市徐圩新区港前大道完成计划的 25.27%;
- 10 铜黄高速公路 TH-12 标完成计划的 23.93 %;
- 11 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 19.84%;
- 12 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 18.41%;
- 13 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 15.94%;
- 14 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 12.19%。

## 六、存在问题与建议

### 1. 存在问题:

省外青海项目：(1)共玉 A4 标：施工现场劳力严重不足和材料供应不上、

蒸汽养生效果不太理想。

(2)西宁绕城 11、12 标: ①红线内征地缓慢, 因业主永久性征地和地面附着物赔偿费用问题未解决, 影响路基工程的正常施工; ②红线内三线均未拆迁影响桩基、路基施工。

(3)绕城项目资金紧张。

**省外连云港项目:**

港前大道 BT 项目、徐新路 XX2 标两个项目存在资金紧张。

**省内项目:**

(1)十天高速旬阳 LD 连接线 AD-LD 标: 因原 40 标与业主清算问题, 40 标原施工队阻挡无法进场施工。

(2)西咸北环线 LJ-1 标及店塔立交 LJ-N1 标: 由于永久性征地、拆迁问题业主未解决。

(3)蓝田安村至周至哑柏公路 A6 标: 工作面有限, 施工遭到当地村民以安置房未解决及土地赔偿款低为由阻止施工。

(4)延延高速公路路基 LJ-6 标: ①因业主永久性征地内采石场及煤场、砖厂及煤场赔偿费用问题未解决, 影响了路基工程、采空区治理、涵洞等正常施工; ②红线内三线均未拆迁影响桩基、路基施工。

(5)延志吴高速公路 LJ-7 标: 由于原 LJ-7 标债权人严重阻工, 导致工地全面停工 10 天。

⑥铜黄高速公路 12 标: 施工组织协调力度不够, 施工队伍劳动力人员不足。同时外部环境影响较大。

**建议:**

各项目切实做好: ①加强施工现场管理, 充分考虑可能影响施工进度的各种因素, 做好各项准备工作, 施工现场的管理要到位。将施工各要素进行

科学、合理地安排，在一定的时间和空间内有组织、有计划、有秩序地开展施工；

②加强施工过程的管理和控制，切实做好沟通与协调、跟踪，尽快解决影响进度症结，把责任落实到位，确保二季度计划实施和完成；

③加强施工过程质量管理，针对施工中的质量通病进行预防及控制，确保工程后续施工质量。

## 七、其他情况说明

- 1 统计资料以项目部提供的为准，统计产值统计截止日期为5月28日。
- 2 集团公司各部门采用统计数据，请依此数据为准。

陕西路桥集团有限公司  
2013年5月29日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

发送：集团公司领导（纸质），各部门（公司）、分子公司、各项目部（PDF文档）

## 集团公司2013年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第二季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际 完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
<b>工程项目合计</b>		<b>455700.89</b>	<b>183575.68</b>	<b>220000.00</b>	<b>68335.08</b>	<b>31.06%</b>	<b>82991.00</b>	<b>50108.47</b>	<b>60.38%</b>	<b>29375.00</b>	<b>24548.16</b>	<b>83.57%</b>	<b>40.28%</b>
<b>陕西路桥第一工程有限公司</b>		<b>113332.99</b>	<b>41382.52</b>	<b>48894.00</b>	<b>19054.60</b>	<b>38.97%</b>	<b>19559.00</b>	<b>13426.84</b>	<b>68.65%</b>	<b>6203.00</b>	<b>5449.99</b>	<b>87.86%</b>	<b>36.51%</b>
1	京台公路廊坊路基桥隧工程 LQ1 标	37365.23	27702.39	16612.00	6949.16	41.83%	6100.00	4033.92	66.13%	1841.00	2495.06	135.53%	74.14%
2	延志吴高速公路 LJ-7 标	12974.44	10078.78	7651.00	6301.89	82.37%	5417.00	5214.52	96.26%	1976.00	1497.78	75.80%	77.68%
3	铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标段	21268.36	3601.35	15047.00	3601.35	23.93%	5385.00	2676.40	49.70%	2129.00	1457.15	68.44%	16.93%
4	青海茶卡至格尔木预制 CGYZ1 标	22640.71		9584.00			1597.00						
5	龙永高速公路 24 标	19084.25					1060.00			257.00			
6	尾留项目施工产值				2202.20			1502.00					
<b>第二工程公司</b>		<b>55913.02</b>	<b>11456.13</b>	<b>35423.00</b>	<b>6495.69</b>	<b>18.34%</b>	<b>10263.00</b>	<b>5872.14</b>	<b>57.22%</b>	<b>3424.00</b>	<b>3229.42</b>	<b>94.32%</b>	<b>20.49%</b>
1	西宁南绕城公路土建工程 11 标	22034.92	7904.64	8917.00	2846.74	31.92%	3878.00	2846.74	73.41%	1186.00	1438.86	121.32%	35.87%
2	西宝咸阳收费站改扩建工程 XY-TJ 标	1990.00	1434.24	1506.00	1063.05	70.59%	882.00	439.51	49.83%	278.00	416.86	149.95%	72.07%
3	西安绕城新筑收费站宿办楼工程	2000.00		2000.00									
4	延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标	25162.45	1828.32	15000.00	1828.32	12.19%	4439.00	1828.32	41.19%	1559.00	1109.06	71.14%	7.27%
5	延志吴立交设施 AQ2 标	2013.25	288.93	1830.00	288.93	15.79%	290.00	288.93	99.63%	120.00	222.31	185.26%	14.35%
6	福银公路咸阳东收费站宿办楼			2365.00			604.00			224.00			
7	引汉济渭三河口水利枢纽 3 标	2712.40		1600.00			170.00			57.00			
8	待定项目			2205.00									
9	尾留产值				468.64			468.64			42.33		
<b>第三工程公司</b>		<b>91789.12</b>	<b>32473.68</b>	<b>37102.00</b>	<b>9142.90</b>	<b>24.64%</b>	<b>11527.00</b>	<b>6659.64</b>	<b>57.77%</b>	<b>4297.00</b>	<b>4040.24</b>	<b>94.02%</b>	<b>35.38%</b>
1	青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标	21719.39	5923.88	12000.00	1912.67	15.94%	3679.00	1912.67	51.99%	1462.00	1189.72	81.38%	27.27%
2	西宁南绕城公路土建工程 9 标	37800.00	16978.31	10154.00	4224.13	41.60%	3190.00	2300.21	72.11%	1139.00	1179.55	103.56%	44.92%
3	西宁南绕城公路土建工程 12 标	29000.00	8949.86	12018.00	2384.47	19.84%	3634.00	2059.77	56.68%	1346.00	1409.92	104.75%	30.86%
4	神渭管道输煤项目六(1)标段	2928.53	621.62	2930.00	621.62	21.22%	792.00	386.99	48.86%	273.00	261.06	95.62%	21.23%
5	田峪河桥	341.20					232.00			77.00			

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


## 集团公司2013年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第二季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际 完成	完成 比率	计划产 值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
<b>第四工程公司</b>		<b>61285.37</b>	<b>5515.41</b>	<b>30897.00</b>	<b>7695.31</b>	<b>24.91%</b>	<b>11250.00</b>	<b>4758.51</b>	<b>42.30%</b>	<b>3942.00</b>	<b>2411.42</b>	<b>61.17%</b>	<b>9.00%</b>
1	西铜高速公路 TH-20 标	33,468.18	10689.57	15358.00	7429.00	48.37%	4220.00	4617.64	109.42%	1558.00	2360.98	151.54%	31.94%
2	蓝田至周至哑柏公路 A6 标	3604.00	810.00	1800.00			1379.00			560.00			22.48%
3	西咸新区北环线路及桥梁 LJ-1 标	4227.38		1200.00			342.00			97.00			
4	神木石窑大桥	538.81	205.96	539.00	205.96	38.21%	356.00	140.88		154.00	50.44	32.75%	38.22%
5	旬阳连接线	19,447.00		6000.00			2141.00			744.00			
6	待定任务			6000.00			2812.00			829.00			
7	尾留工程施工产值				60.35								
<b>陕西路桥路面工程有限公司</b>		<b>66288.79</b>	<b>37929.68</b>	<b>56740.00</b>	<b>16919.10</b>	<b>29.82%</b>	<b>24743.00</b>	<b>11561.40</b>	<b>46.73%</b>	<b>9120.00</b>	<b>6916.25</b>	<b>75.84%</b>	<b>57.22%</b>
1	连云港徐圩新区港前大道工程建设	29047.27	19083.04	13380.00	3381.33	25.27%	4228.00	2290.11	54.17%	1987.00	1870.97	94.16%	65.70%
2	新海至徐圩新区 XX-2 标	15406.18	7420.54	9670.00	3433.93	35.51%	4890.00	2258.64	46.19%	1918.00	1006.49	52.48%	48.17%
3	延志吴高速公路 LM-3 标段	12208.00	9195.46	8690.00	5677.58	65.33%	7192.00	5294.75	73.62%	2465.00	2579.85	104.66%	75.32%
4	连云港其他项目	552.05	552.05		552.05			-94.35					100.00%
5	十天高速公路陕西汉略 HL-M04 标	9075.29	1678.59	9114.00	1678.59	18.42%	5433.00	1678.59	30.90%	1750.00	1317.65	75.29%	18.50%
6	尾留待定产值			15886.00	2195.62	13.82%	3000.00	133.65	4.46%	1000.00	141.29	14.13%	
<b>试验检测中心</b>				<b>360.00</b>	<b>55.00</b>		<b>90.00</b>			<b>30.00</b>			
<b>兴通监理公司</b>				<b>2850.00</b>	<b>219.15</b>		<b>600.00</b>			<b>200.00</b>			
<b>集团公司合作项目</b>		<b>67091.60</b>	<b>54818.27</b>	<b>10944.00</b>	<b>5479.48</b>	<b>50.07%</b>	<b>4959.00</b>	<b>4556.09</b>	<b>91.88%</b>	<b>2159.00</b>	<b>1012.41</b>	<b>1.73</b>	<b>81.71%</b>
1	延延高速公路路基 LI-1 标	9736.00	1288.68	7000.00	1288.68	18.41%	2000.00	1288.68	64.43%	600.00	655.15	109.19%	13.24%
2	省道 303 线二级公路土建工程 ZM3 标	3733.00	3245.37	400.00			400.00			200.00			86.94%
3	梅大高速公路土建工程 4 标段	28748.45	25839.02	2385.00	3370.69	141.33%	1400.00	2447.29	174.81%	800.00			89.88%
4	粤湘高速博深段第 8 标段	24874.15	24445.19	1159.00	820.11	70.76%	1159.00	820.11	70.76%	559.00	357.26	63.91%	98.28%
<b>集团公司尾留项目</b>		<b>392477.68</b>	<b>386762.00</b>		<b>3273.85</b>			<b>3273.85</b>			<b>1488.43</b>		

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


### 2013年重点项目生产计划完成情况图表

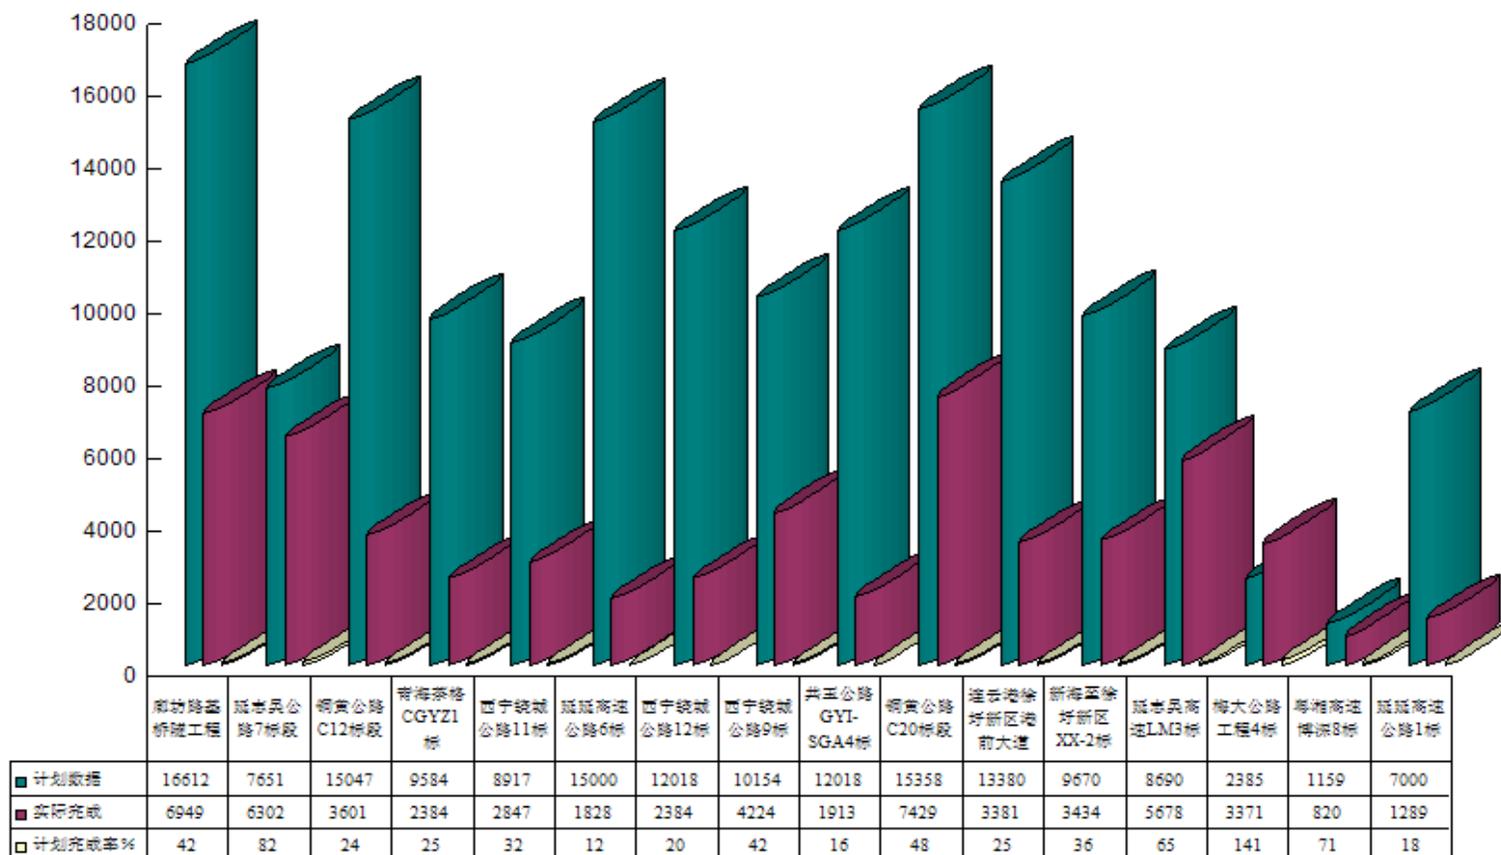

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

### 2013年重点项目合同履行统计图表

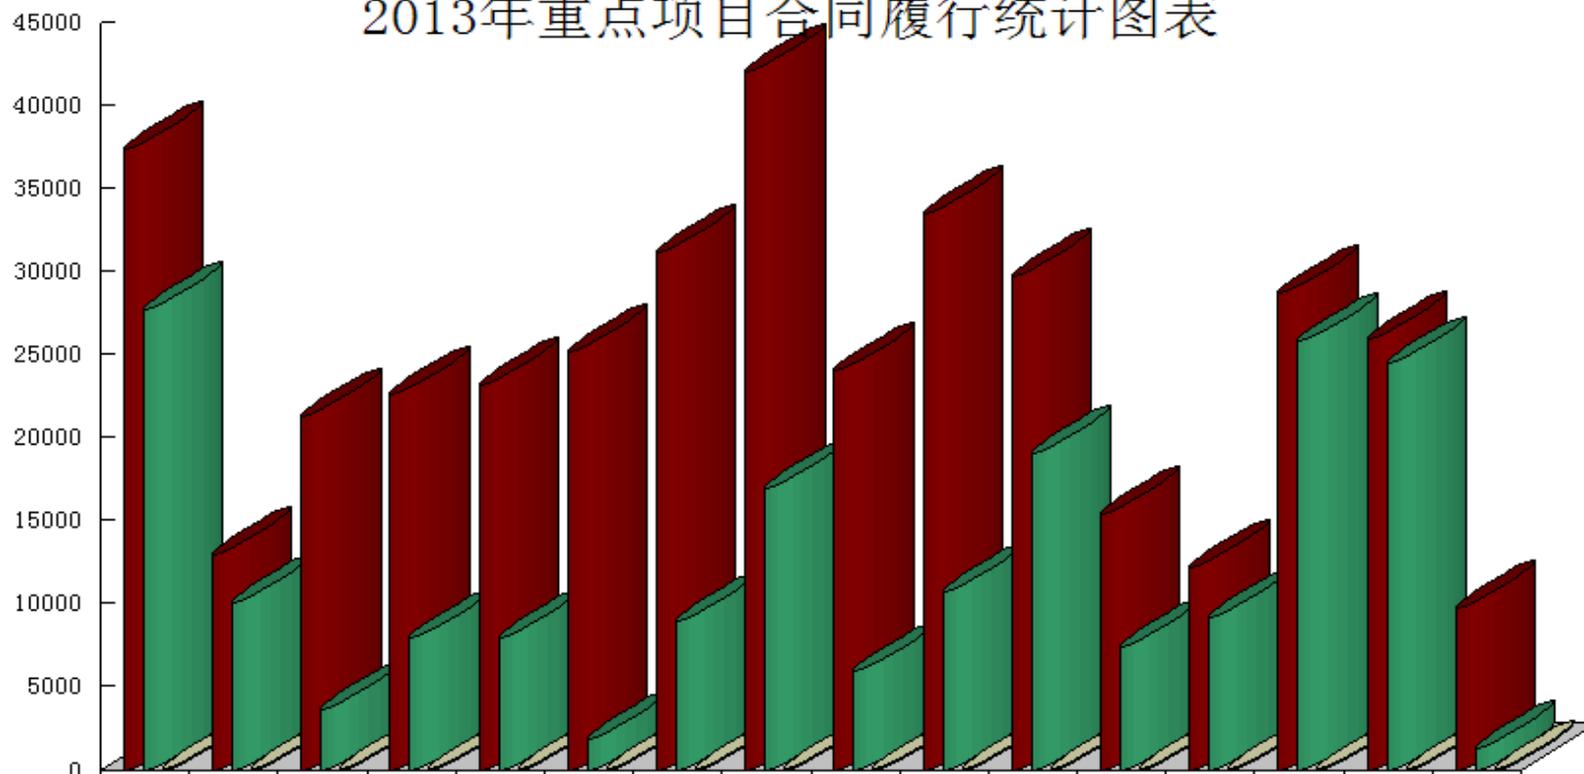

	郑坊路基 桥隧工程	咸阳市公 路7标段	铜黄公路 C12标段	青海茶格 CGYZ1标	西宁绕城 公路11标	延延高速 公路6标	西宁绕城 公路12标	西宁绕城 公路9标	共三公路 GYI- SGA4标	铜黄公路 C20标段	连云港徐 圩新区港 前大道	新海至徐 圩新区 XX-2标	咸阳市高 速LM3标	梅大公路 工程4标	粤湘高速 博源8标	延延高速 公路1标
■ 合同总额	37365	12974	21268	22641	23167	25162	31195	42089	24059	33468	29748	15406	12208	28748	25963	9736
■ 累计完成数量	27702	10079	3601	7905	7905	1828	8950	16978	5924	10690	19083	7421	9195	25839	24445	1289
□ 计划完成率%	74	78	17	35	34	7	29	40	25	32	64	48	75	90	94	13

■ 合同总额    ■ 累计完成数量    □ 计划完成率%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣
