


陕西路桥统计简报

(第2期总第302期)

主办：陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一五年三月

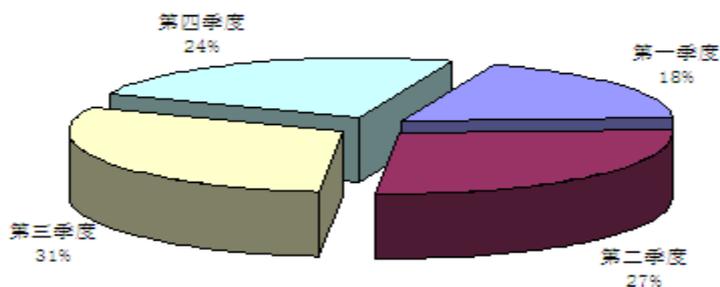

施工计划完成动态图

二〇一五年四月二日

2015年3月份计划执行情况分析

一、主要经济指标

截止本月底累计完成产值 59963.84 万元，为年计划的 18.20%，全员劳动生产率 133251 元/人，分别高于去年同期水平 15.21%、14.71%，第一季度完成季度的计划的 91.11%，本月完成产值 39486.67 万元。

累计新承接 2 个项目 4.49 亿元，为年计划的 14.97%。

试验检测中心完成服务产值 59.16 万元，为年计划的 14.79%；兴通监理公司完成服务费用 1901.40 万元，为年计划的 55.92%，新承接任务 1920.13 万元，为年计划 66.21%。

二、主要工程形象进度（累计完成情况）

青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 694/567 km^3 、钻孔桩 345/345 根、墩柱 258/258 根、盖梁 63/63 个、梁预制 215/215 片，箱梁安装 215/215 片，现浇箱梁 14 联，悬臂浇筑 104/104 块，为合同量 122%、100%、100%、100%、100%、100%、100%、100%。

青海西宁南绕城公路土建工程 12 标

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 195km、土方 1317 km^3 ，分别为合同量的 100%、87%、87%。钻孔桩 756/756 根、墩柱 620/620 根、盖梁 263/268 个、梁板 1250/1250 片、梁板安装 1240/1250 片、现浇箱梁 55/55 孔，为合同量 100%、100%、98%、100%、99%、100%。桥面系完成合同量的 81%。

青海省花石峡至久治公路 HD13 标段

累计完成借土填方 390/542 km^3 ，为合同量的 72%。隧道全断面开挖 1219/3790m、初期支护 1219/3790m、二衬 975/3790m，为合同量 32.16%、32.16%、25.72%。

黄延高速公路扩能工程 LJ-3 标

累计完成挖方 197/122 km³，为合同量的 161%，填方 271/338 km³，为合同量的 80%；钻孔桩 99/99 根、墩柱 72/72 根、盖梁 31/31 个、箱梁预制 185/185 片、箱梁安装 185/185 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%；全断面掘进 4300/4330m、支护 3529/4330m、衬砌 3443/4507m，分别为合同量的 99%、99%、99%。

黄延高速公路扩能工程 LJ-22 标

累计完成挖方 681/585 km³，为合同量的 116%，抗滑桩 94/98 根，为合同量的 96%。隧道全断面掘进 3071/4570m、全断面支护衬砌 2706/4570m，隧道路面及附属 1395/4570m，分别为合同量的 67.20%、59.22%、30.53%。挡土墙完成合同量的 73.47%。

铜黄高速公路路面 TH-03 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 399/511km²、水泥稳定碎石基层 370/502 km²、粗粒式沥青混合料 ATB-30 下面层 214/489 km²、中粒式 SBS 改性沥青混凝土 AC-20 中面层 292/920 km²、细粒式沥青混凝土 AC-13 上面层 157/920 km²，分别为合同量的 78%、74%、51%、32%、17%。

延（安）至延（川）高速公路路面 LM-1 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 367/520km²、水泥稳定碎石基层 339/581km²、粗粒式密级配沥青碎石 212/391 km²、中粒式改性沥青 6/901km²，分别为合同量的 71%、58%、54%。

西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 243/377km²、水泥稳定碎石基层 307/527 km²，分别为合同量的 64%、58%。粗粒式密级配沥青混凝土 269/418km²、中粒式沥青混凝土 458/726km²、改性沥青混凝土 81/726km²，为合同量的 64%、63%、11%。

新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 474/514km²、水泥稳定碎石基层 483/634km²，分别为合同量的 92%、76%。粗粒式密级配沥青混凝土 165/477km²，为合同量的 35%。

西咸北环线路基 LJ-8 标

累计完成借土填方 536/1025 km³、强夯 508/508 km²、灰土、碎石桩 1258/1258km，分别为合同量的 52%、100%、100%；桥梁桩基 813/813 根、墩柱 468/468 根、盖梁 242/242 个、梁板预制 896/896 片、安装 896/896 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%。箱梁现浇完成合同 86%。

十天高速公路旬阳 LD 连接线 AD-LD 标

累计完成桥梁基础桩 326/326 根、墩柱 284/284 根、盖梁 159/159 个、箱梁预制 483/483 片、箱梁安装 483/483 片、桥面铺装 2060/4701m，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%、43%。隧道全面开挖 316/1243m、支护 316/1244m、衬砌 257/1245m，为合同量的 25.4%、25.4%、20.6%。

渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标

累计完成挖方 988/996 km³，为合同量的 99%。桥梁桩基 408/408 根、墩柱 258/258 根、盖梁 162/169 个、箱梁预制 532/532 片、安装 523/532 片，分别为合同总量 100%、100%、96%、100%、98%。挡墙完成合同 86%。

渭玉高速公路路面 WY-M01 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 175/849km²、水泥稳定碎石基层 166/1197 km²，分别为合同量的 21%、14%。

河南省道 250 线灵宝至朱阳段改建工程 S250SG-2 标

累计完成桥梁桩基 42/42 根、立柱 10/10 根、薄壁墩 6/6 根、盖梁 15/15 个，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%；隧道开挖 606/606m、初

期支护 606/606m、二衬 606/606m，分别为合同总量 100%、100%、100%。

湖南龙永高速公路 24 标

累计完成路基挖填土石方 204/331 km³，为合同量的 61%。隧道开挖 4130/4488m、初期支护 4130/4488m、二次衬砌 3615/4488m，分别为合同总量 92%、92%、81%。

三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成产值 39486.67 万元，为计划的 91.40%。其中：

- 1 铜旬高速公路路面 TX-M01 标完成计划的 110.98%；
- 2 黄延高速公路路面 HY-M1 标完成计划的 109.60%；
- 3 铜黄公路何黄段路面工程施工 TH-3 标完成计划的 107.03%；
- 4 商丹一级公路路面完成计划的 106.09%；
- 5 黄延公路扩能路基桥隧工程 LJ-3 标完成计划的 104.12%；
- 6 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 100.03%；
- 7 青海花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 92.58%；
- 8 新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标完成计划的 95.46%；
- 9 黄延公路扩能路基桥隧工程 LJ-22 标完成计划的 80.74%；
- 10 安平高速公路路面 LM1 标完成计划的 77.42%；
- 11 商丹一级公路工程完成计划的 50.87%；
- 12 渭玉公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 48.23%。

四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 10.28%；
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 31.76%；
- 3 第三工程公司完成计划的 32.76%；
- 4 第四工程公司完成计划的 26.10%；
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 9.46%；

- 6 试验检测中心完成计划的 14.97%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 55.92%。

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 黄延公路扩能路基桥隧工程 LJ-3 标段完成计划的 71.75%;
- 2 渭玉公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 65.57%;
- 3 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 32.07%;
- 4 黄延公路扩能路基桥隧工程 LJ-22 标段完成计划的 26.84%。
- 5 安平高速公路路面 HC-LM2 标完成计划的 20.81%;
- 6 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 17.33%;
- 7 铜黄公路何黄段路面工程施工 TH-3 标完成计划的 15.03%;
- 8 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 14.76%;
- 9 新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标完成计划的 12.15%;
- 10 铜旬高速公路路面 TX-M01 标完成计划的 11.50%;
- 11 黄延高速公路路面 HY-M1 标完成计划的 7.96%;
- 12 延延高速公路路面 LM-1 标完成计划的 5.40%;
- 13 渭玉高速公路路面 WY-M01 标完成计划的 3.13%。

六、简要分析与建议:

1 分析:

本月完成月度总体计划的 91.40%，重点项目控制目标、节点计划、质量、安全计划基本完成。

2 存在问题:

- ①天气寒冷影响路面施工进度。
- ②省外隧道标段围岩极差，涌水涌泥，施工进度缓慢。

3 建议与措施:

各基层要加强施工现场管控，做好施工的安全防范和施工过程的病害预防与处置；要求各单位做好各项目总体计划分解，做到资源调配合理，责任落实到人，力保2015年总体计划的完成。

七、其他情况说明

- 1 统计资料截止日期为3月25日。
- 2 集团公司各部门采用数据，以统计简报数据为准。

2015年4月1日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第一季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际 完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
陕西路桥集团有限公司合计		672261.94	434526.33	328100.00	59963.84	18.28%	65814.00	59963.84	91.11%	43202.58	39486.67	91.40%	64.64%
陕西路桥第一工程有限公司		45167.21	23859.08	41000.00	4216.64	10.28%	4724.00	4216.64	89.26%	2606.43	1293.78	49.64%	52.82%
1	龙永高速公路 24 标	20697.52	16477.28	5105.00	884.76	17.33%	960.00	884.76	92.16%	416.88			79.61%
2	陕西商丹一级公路项目	22214.00	7059.95	18164.00	3010.02	16.57%	3362.00	3010.02		2031.00	1033.12	50.87%	31.78%
3	安康市汉滨区石梯汉江大桥	2255.69	321.85	1231.00	321.85	26.15%	402.00	321.85		158.55	260.66	164.40%	14.27%
4	待定新承接项目			16500.00									
陕西路桥第二工程有限公司		163827.55	111559.86	55000.00	17469.60	31.76%	16501.00	17469.60	105.87%	14215.13	13253.43	93.23%	68.10%
1	西宁南绕城公路土建工程 11 标	19800.00	20951.59		918.60			918.60		918.60	918.60	100.00%	105.82%
2	延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标	25291.45	25286.89	746.00	741.58			741.58		741.58	741.58	100.00%	99.98%
3	青海花九 HD-13 标	42000.00	18104.26	15046.00	2220.87	14.76%	2991.00	2220.87	74.25%	1297.00	1200.70	92.58%	43.11%
4	黄延公路改扩能路基桥隧 22 标	52067.98	30483.29	26391.00	7082.12	26.84%	7967.00	7082.12	88.89%	5112.41	4127.92	80.74%	58.55%
5	榆林收费站北迁工程 SJ-TJ-2 标	3153.58	2682.34	1536.00	1065.21	69.35%	1000.00	1065.21	110.96%	960.00	1065.21	110.96%	85.06%
6	S250 线灵朱段改建工程 SG-2 标	6494.40	6383.06	1698.00	1586.54	93.44%	1698.00	1586.54	93.44%	1586.54	1586.54	100.00%	98.29%
7	零口至马召一级公路改建工程 I 标	10648.14	6191.51	5241.00	2377.76	45.37%	2364.00	2377.76	100.58%	2364.00	2377.76	100.58%	58.15%
8	江苏徐州 G206 大吴桥等危桥改造	4372.00	1476.92	4342.00	1476.92	34.01%	1450.00	1476.92	101.86%	1235.00	1235.11	100.01%	33.78%
第三工程公司		138437.52	127240.40	40000.00	13105.69	32.76%	13042.00	13105.69	100.49%	7245.00	7543.75	104.12%	91.91%
1	西宁南绕城公路土建工程 9 标	39318.64	39658.67	245.00									100.86%
2	西宁南绕城公路土建工程 12 标	39421.00	36426.30	2995.00									92.40%
3	黄延公路扩能路基桥隧工程 3 标	57750.88	51155.43	18265.00	13105.69	71.75%	13042.00	13105.69	100.49%	7245.00	7543.75	104.12%	88.58%
4	西宁南绕城公路房建工程 6 标段	1947.00		1947.00									
5	2014 年养护工程路基桥隧类加固			248.00									
	待定新承接项目			16300.00									
第四工程公司		125065.19	106528.11	42100.00	10987.23	26.10%	14149.00	10987.23	77.65%	7036.02	5913.25	84.04%	85.18%
1	西咸新区北环线路基 LJ-8 标	54278.38	40008.21	19320.00	6195.06	32.07%	9549.00	6195.06	64.88%	2895.99	2896.99	100.03%	73.71%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第一季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际 完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
2	渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标	16958.00	14487.07	4316.00	2830.18	65.57%	2800.00	2830.18	101.08%	1857.03	973.15	52.40%	85.43%
3	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	19712.26	14600.44	7326.00	838.95	11.45%	1800.00	838.95	46.61%	1145.00	838.95	73.27%	74.07%
4	西铜高速公路 TH-20 标	33577.74	36914.30	1138.00	1183.88			1183.88		1138.00	1183.88	104.03%	109.94%
5	殡仪馆专用公路马鸣路尾留工程		20.28		20.28			20.28			20.28		
4	待建新承接项目			10000.00									
	尾留项目产值	538.81	497.82		-81.11			-81.11					92.39%
	陕西路桥路面工程有限公司	199764.47	65338.87	150000.00	14184.68	9.46%	17398.00	14184.68	81.53%	12100.00	11482.47	94.90%	32.71%
1	延延高速公路路基 LM-1 标	25900.00	9072.67	17852.00	964.64	5.40%	2919.00	964.64	33.05%	2000.00	964.64	48.23%	35.03%
2	渭玉高速路面 WY-M01 标	27050.60	2827.03	25006.00	782.81	3.13%	700.00	782.81	111.83%	700.00	782.81	111.83%	10.45%
3	安平高速公路路面 LM1 标	11363.00	2364.58	11363.00	2364.58	20.81%	2885.00	2364.58	81.96%	1400.00	1083.85	77.42%	20.81%
4	西宝改扩建工程 B-M07 标	15302.80	9803.61	5685.00			500.00			500.00			64.06%
5	黄延高速公路 HY-M1 标	35809.00	2849.52	35809.00	2849.52	7.96%	3015.00	2849.52	94.51%	2600.00	2849.52	109.60%	
6	新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标	28812.00	8702.96	21121.00	2566.96	12.15%	1800.00	2566.96	142.61%	1200.00	1145.47	95.46%	30.21%
7	铜旬高速公路 TX-M01 标	12912.99	998.85	8683.00	998.85	11.50%	459.00	998.85	217.61%	900.00	998.85	110.98%	
8	铜黄公路何黄段路面工程施工 3 标	20816.00	11131.54	11397.00	1712.52	15.03%	2420.00	1712.52	70.77%	1600.00	1712.52	107.03%	53.48%
9	商丹一级公路路面工程	18607.00	11131.54	13084.00	1273.09	9.73%	2700.00	1273.09	47.15%	1200.00	1273.09	106.09%	
10	省道 102 线二级公路(II 期) V 标		250.00										
11	2014 年榆靖公路养护工程 DL-2 标	658.92	781.24		-1.12			-1.12			-1.12		118.56%
12	2014 年靖王养护 DL-1 标	788.84	654.27		12.04			12.04			12.04		82.94%
13	2014 年吴靖公路养护工程 DL-4 标	1743.32	1559.11		52.40			52.40			52.40		89.43%
14	吴靖养护 QS-1 标		2490.71		453.04			453.04			453.04		
15	吴靖养护 DL-14-A1 标		600.83		34.95			34.95			34.95		
16	2015 年养护项目		120.41		120.41			120.41			120.41		
	试验检测中心			400.00	59.16	14.79%					59.16		
	兴通监理公司			3400.00	1901.42	55.92%					1901.42		

部门负责人: 杨武策

统计报告人: 朱建荣

2015年重点项目生产计划完成情况图表

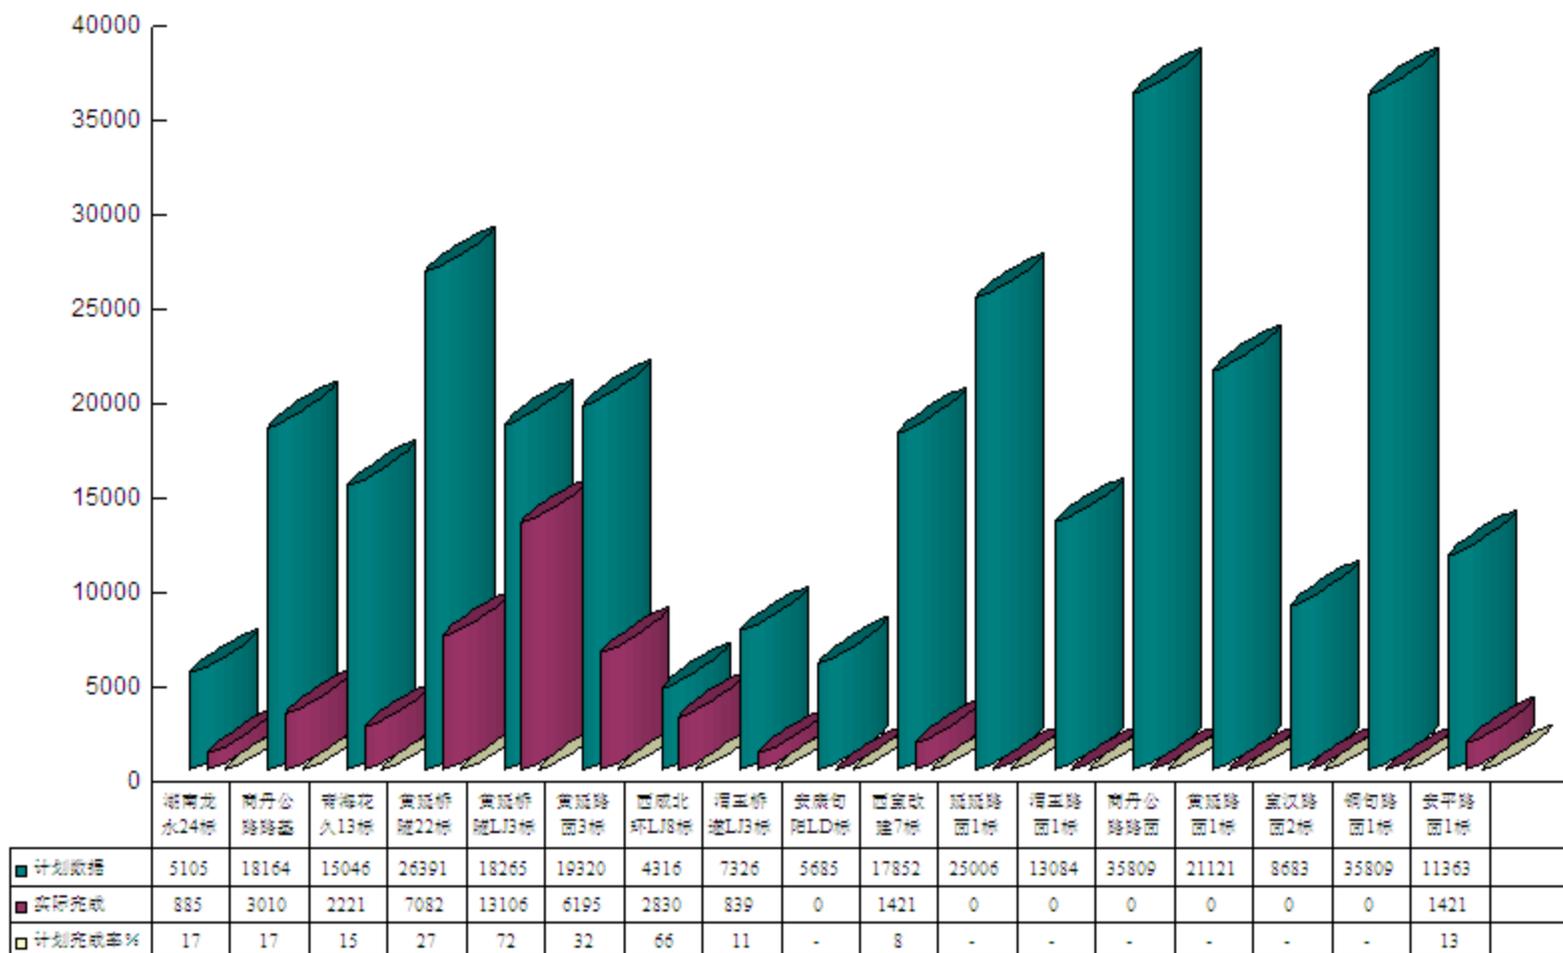


■计划数据 ■实际完成 □计划完成率%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

2015年重点项目合同履行统计图表

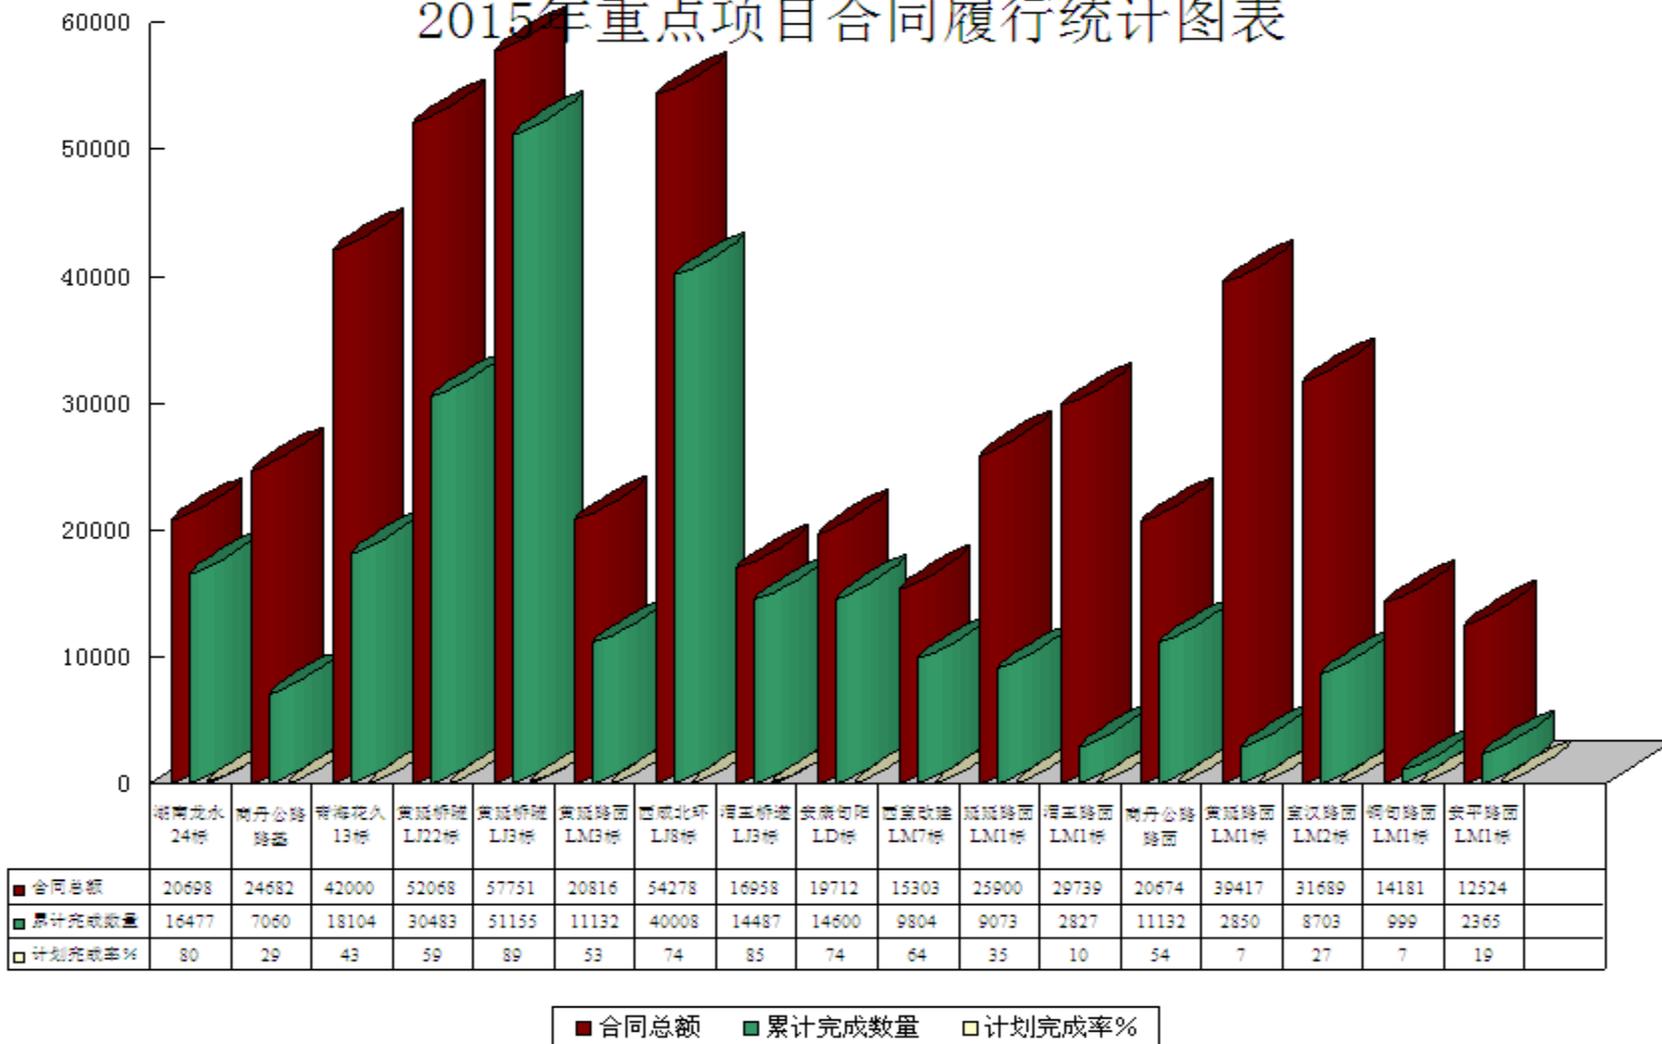

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

