


# 陕西路桥统计简报

(第5期总期283期)

主办: 陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一三年六月

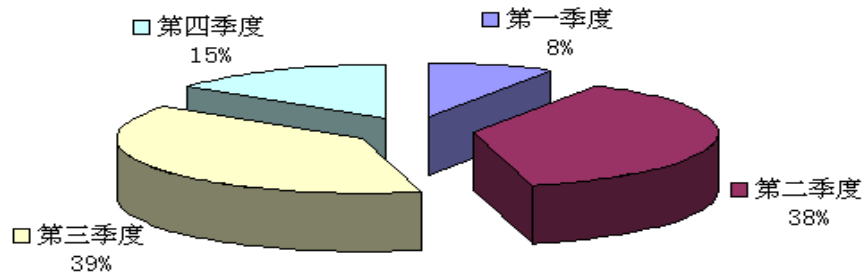

二〇一三年七月

## 2013年6月份计划执行情况分析

### 一、主要经济指标

截止本月底累计完成施工产值 102972.14 万元，为计划的 46.81%，高于去年同期水平的 15.10%。全员劳动生产率 212314 元/人，高于去年同期水平的 15.59%。第二季度完成计划的 102.11%，本月完成产值 34637.06 万元。

### 二、主要工程形象进度（累计完成情况）

#### 青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 928/1469 片、矩形板 524/368 片、空心板 94/374 片，分别为合同量的 63.2%、142.4%、25.13%。矩形板安装 442/368 片、梁安装 264/1469 片、空心板安装 36/374，为合同量的 120.1%、17.97%、9.63%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km<sup>3</sup>，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 12/16 根，为合同量的 100%、88%。隧道开挖 1459/3230m、支护 1454/3230m、衬砌 1036/3260m，分别为合同量 45.19%、45.03%、35.09%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 318/567 km<sup>2</sup>、钻孔桩 306/327 根、墩柱 162/222 根、盖梁 39/61 个、梁预制 118/205 片，箱梁安装 60/205 片，为合同量 56%、94%、73%、64%、58%、29%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 12 标段

累计完成钻孔桩 483/635 根、墩柱 213/435 根、盖梁 52/158 个、梁板 437/1124 片、梁板安装 160/1124 片为合同量 76%、49%、39%、39%、14%。碎石桩 333km、灰土桩 184km，为合同量的 152%、35%。

### 延志吴高速公路路面 LM-3 标

累计完成底基层 204/294 km<sup>2</sup>、基层 200/285 km<sup>2</sup>，下面层 168/184 km<sup>2</sup>、中面层 434/537 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 69%、70%、91%、80%。

### 延志吴高速公路桥隧路基 LJ-7-1 标

累计完成钻孔桩 12/12 根、墩柱 74/74 根、盖梁 94/94 片，箱梁预制 389/389 片、箱梁安装 535/545 片、T 梁预制安装 24/24 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、99%、100%。

### 铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/1 根、盖梁 8/8 个，为合同量的 100%、100%、100%；全断面掘进 1381/3840m，仰拱填充 1320/3870m，二衬 1158/3870m，分别为合同量的 36%、34%、30%。

### 铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 530/572 根、墩柱 271/540 根、盖梁 69/274 片、预制梁 192/1380 片、梁安装 50/1380 片，为合同量的 93%、50%、25%、14%、4%。

### 连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标

累计完成土方 114 km<sup>3</sup>，为合同量的 71%；水泥搅拌桩 154km，为合同量的 62%；底基层 380/588 km<sup>2</sup>、级配碎石 34/27km<sup>2</sup>，分别为合同量的 54%、126%；桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、空心板预制 255/255 片，分别为合同量 100%、100%、100%。

### 连云港市徐圩新区港前大道工程(GQDD-BT)标段

累计完成土方 583 km<sup>3</sup>，为合同量的 143%；水泥搅拌桩 142km，为合同量 210%；软土处理钢塑格栅 27km<sup>2</sup>，为合同量的 111%。底基层 295/454 km<sup>2</sup>、基层 249/444km<sup>2</sup>、4cmAC-13 沥青 247/435 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 65%、56%、59%；桩基 120/96 根、墩柱 48/48 根、空心板预制 294/294 片，分别为合同量 125%、100%、100%。排水管道 12/41km，为合同量的 29%。

### 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标

累计完成借土土方 1176/1478 km<sup>3</sup>，为合同量的 80%。钻孔桩 714/714 根、墩柱 466/470 根、盖梁 109/114 片、箱梁预制 484/508 片、安装 408/508 片，

分别为合同量的 100%、99%、96%、95%、80%。

### 三、项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成 34637.06 万元，为计划的 108.71%，其中：

- 1 河北京台廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 183.23%；
- 2 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 173.36%；
- 3 铜黄高速公路路基桥隧 TH-12 标完成计划的 167.00%；
- 4 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 138.89%；
- 5 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 125.78%；
- 6 十天高速公路汉略路面 HL-M04 标完成计划的 115.60%；
- 7 江苏连云港徐圩新区港前大道工程完成计划的 112.02%；
- 8 延志吴高速公路路基 TJ-7-1 标完成计划的 101.96%；
- 9 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 89.74%；
- 10 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 83.216%；
- 11 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 75.54%；
- 12 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 69.58%；
- 13 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 68.84%；
- 14 江苏连云港新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 68.30%。

### 四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 58.89%；
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 28.94%；
- 3 第三工程公司完成计划的 40.94%；
- 4 第四工程公司完成计划的 35.33%；
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 47.53%；
- 6 试验检测中心完成计划的 65.59%；
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 50.86%；
- 8 集团公司合作项目完成计划的 53.84%。

## 五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 广东梅大高速公路土建工程 4 标完成计划的 141.33%；
- 2 延志吴高速公路路基 TJ7-1 标完成计划的 95.73%；
- 3 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 83.27%；
- 4 铜黄高速公路 TH-20 标完成计划的 63.11%；
- 5 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 60.43%；
- 6 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 67.59%；
- 7 连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 44.11%；
- 8 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 47.69%；
- 9 连云港市徐圩新区港前大道完成计划的 35.32%；
- 10 铜黄高速公路 TH-12 标完成计划的 42.80 %；
- 11 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 39.18%；
- 12 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 24.31%；
- 13 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 24.29%；
- 14 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 23.15%。

## 六、存在问题与建议

### 1. 存在问题:

省外青海项目：(1)绕城项目红线内征地缓慢，因业主永久性征地问题未完全解决，影响路基工程的正常施工；

(2)茶卡项目：临建工程滞后，部分门架陈旧影响预制进度，由于图纸变更影响模板进场速度；

(3)湖南龙永项目：临时征地未解决。

### 省内项目：

(1)十天高速旬阳 LD 连接线 AD-LD 标：因原 40 标与业主清算问题未解决，至今冬青桥桩基、冬青隧道未能彻底交接，造成冬青桥桩基不能正常施工、冬青隧道无法进场，同时桩基偏位等。花果村桥地处汉江边，现已进入雨季，桩基施工难度加大。

(2)西咸北环线 LJ-1 标及店塔立交 LJ-N1 标: 由于永久性征地、拆迁问题业主仍未解决。

(3)蓝田安村至周至哑柏公路 A6 标: 工作面狭小有限。

## 2.建议:

①加强施工现场管理,充分考虑可能影响施工进度的各种因素,细化生产计划,不断优化工序,将各要素进行科学、合理地安排,超前考虑,有计划开展施工;

②加强施工过程的管理和控制,切实做好沟通与协调、跟踪,尽快解决影响进度症结,把责任落实到位,分工明确、责任到人,继续加强跟踪和督促力度,力争每个工作面能严格按照时间节点目标完成;

③加强施工过程质量管理,针对施工中的质量通病进行预防及控制,确保工程后续施工质量。各项目在保证安全前提下,加快工程施工进度。

## 七、其他情况说明

1 统计资料以项目部提供的为准,统计产值统计截止日期为6月30日。

2 集团公司各部门采用统计数据,请依此数据为准。

陕西路桥集团有限公司

2013年7月4日

附:各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

## 集团公司 2013 年度施工项目计划执行情况

| 序号                  | 项目名称                    | 有效金额(万元)         | 累计完成施工产值(万元)     | 年度产值(万元)         |                  |               | 第二季度产值(万元)      |                 |                | 月度施工产值(万元)      |                 |                | 累计完成合同比率      |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                     |                         |                  |                  | 计划产值             | 实际完成             | 完成率           | 计划产值            | 实际完成            | 完成率            | 本月计划            | 实际完成            | 完成率            |               |
| <b>工程项目合计</b>       |                         | <b>465455.63</b> | <b>210798.11</b> | <b>220000.00</b> | <b>102972.14</b> | <b>46.81%</b> | <b>82991.00</b> | <b>84745.53</b> | <b>102.11%</b> | <b>31862.00</b> | <b>34637.06</b> | <b>108.71%</b> | <b>45.29%</b> |
| <b>陕西路桥第一工程有限公司</b> |                         | <b>113332.99</b> | <b>51123.18</b>  | <b>48894.00</b>  | <b>28795.26</b>  | <b>58.89%</b> | <b>19559.00</b> | <b>23167.49</b> | <b>118.45%</b> | <b>7229.00</b>  | <b>9740.66</b>  | <b>134.74%</b> | <b>45.11%</b> |
| 1                   | 京台公路廊坊路基桥隧工程 LQ1 标      | 37365.23         | 31980.80         | 16612.00         | 11227.58         | 67.59%        | 6100.00         | 8312.33         | 136.27%        | 2335.00         | 4278.41         | 183.23%        | 85.59%        |
| 2                   | 延志吴高速公路 LJ-7 标          | 12974.44         | 11101.42         | 7651.00          | 7324.53          | 95.73%        | 5417.00         | 6237.17         | 115.14%        | 1003.00         | 1022.65         | 101.96%        | 85.56%        |
| 3                   | 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标段    | 21268.36         | 6440.44          | 15047.00         | 6440.44          | 42.80%        | 5385.00         | 5515.48         | 102.42%        | 1700.00         | 2839.08         | 167.00%        | 30.28%        |
| 4                   | 青海茶卡至格尔木预制 CGYZ1 标      | 22640.71         | 888.58           | 9584.00          | 888.58           | 9.27%         | 1597.00         | 888.58          |                | 1597.00         | 888.58          | 55.64%         | 3.92%         |
| 5                   | 龙永高速公路 24 标             | 19084.25         | 711.93           |                  | 711.93           |               | 1060.00         | 711.93          |                | 594.00          | 711.93          |                |               |
|                     | 尾留项目施工产值                |                  |                  |                  | 2202.20          |               |                 | 1502.00         |                |                 |                 |                |               |
| <b>第二工程公司</b>       |                         | <b>58493.73</b>  | <b>15140.87</b>  | <b>35423.00</b>  | <b>10252.69</b>  | <b>28.94%</b> | <b>10263.00</b> | <b>9629.14</b>  | <b>93.82%</b>  | <b>4359.00</b>  | <b>3757.00</b>  | <b>86.19%</b>  | <b>25.88%</b> |
| 1                   | 西宁南绕城公路土建工程 11 标        | 22034.92         | 9310.84          | 8917.00          | 4252.94          | 47.69%        | 3878.00         | 4252.94         | 109.67%        | 1567.00         | 1406.20         | 89.74%         | 42.25%        |
| 2                   | 西宝咸阳收费站改扩建工程 XY-TJ 标    | 1990.00          | 1653.29          | 1506.00          | 1282.10          | 85.13%        | 882.00          | 658.55          | 74.67%         | 182.00          | 219.05          | 120.36%        | 83.08%        |
| 3                   | 西安绕城新筑收费站宿办楼工程          | 2000.00          |                  | 2000.00          |                  |               |                 |                 |                |                 |                 |                |               |
| 4                   | 延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标       | 25162.45         | 3472.76          | 15000.00         | 3472.76          | 23.15%        | 4439.00         | 3472.76         | 78.23%         | 2177.00         | 1644.44         | 75.54%         | 13.80%        |
| 5                   | 延志吴立交设施 AQ2 标           | 2013.25          | 553.03           | 1830.00          | 553.03           | 30.22%        | 290.00          | 553.03          | 190.70%        | 170.00          | 264.10          | 155.35%        | 27.47%        |
| 6                   | 福银公路咸阳东收费站宿办楼           | 2580.71          | 86.21            | 2365.00          | 86.21            | 3.65%         | 604.00          | 86.21           | 14.27%         | 181.00          | 86.21           | 47.63%         | 3.34%         |
| 7                   | 佛坪县陈三库周交通重建工程 3 标       | 2712.40          | 64.74            | 1600.00          | 64.74            | 4.05%         | 170.00          | 64.74           | 38.08%         | 82.00           | 64.74           | 78.95%         |               |
| 8                   | 待定项目、尾留项目产值             |                  |                  | 2205.00          | 540.90           |               |                 | 540.90          |                |                 | 72.26           |                |               |
| <b>第三工程公司</b>       |                         | <b>93277.22</b>  | <b>38519.46</b>  | <b>37102.00</b>  | <b>15188.69</b>  | <b>40.94%</b> | <b>11527.00</b> | <b>12705.43</b> | <b>110.22%</b> | <b>4734.00</b>  | <b>6045.79</b>  | <b>127.71%</b> | <b>41.30%</b> |
| 1                   | 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标   | 21719.39         | 6926.54          | 12000.00         | 2915.33          | 24.29%        | 3679.00         | 2915.33         | 79.24%         | 1441.00         | 1002.66         | 69.58%         | 31.89%        |
| 2                   | 西宁南绕城公路土建工程 9 标         | 37800.00         | 18890.44         | 10154.00         | 6136.26          | 60.43%        | 3190.00         | 4212.33         | 132.05%        | 1103.00         | 1912.12         | 173.36%        | 49.97%        |
| 3                   | 西宁南绕城公路土建工程 12 标        | 29000.00         | 11274.35         | 12018.00         | 4708.96          | 39.18%        | 3634.00         | 4384.26         | 120.65%        | 1848.00         | 2324.49         | 125.78%        | 38.88%        |
| 4                   | 神渭管道输煤项目六(1)标段          | 2928.53          | 1055.43          | 2930.00          | 1055.43          | 36.02%        | 792.00          | 820.80          | 103.64%        | 286.00          | 433.81          | 151.68%        | 36.04%        |
| 5                   | 田峪河桥                    | 341.20           | 121.34           |                  | 121.34           |               | 232.00          | 121.34          | 52.30%         | 56.00           | 121.34          | 216.68%        | 35.56%        |
| 6                   | 西安 2013 年国省干线危桥改造工程 C 标 | 1174.02          | 116.79           |                  | 116.79           |               |                 | 116.79          |                |                 | 116.79          |                | 9.95%         |
| 7                   | 陕西交通 2013 年养护工程 QS-5 标  | 314.08           | 134.58           |                  | 134.58           |               |                 | 134.58          |                |                 | 134.58          |                | 42.85%        |

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

## 集团公司2013年度施工项目计划执行情况


| 序号                  | 项目名称                    | 有效金额(万元)         | 累计完成施工产值(万元)     | 年度产值(万元)        |                 |               | 第二季度产值(万元)      |                 |                | 月度施工产值(万元)     |                 |                | 累计完成合同比率      |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                     |                         |                  |                  | 计划产值            | 实际完成            | 完成率           | 计划产值            | 实际完成            | 完成率            | 本月计划           | 实际完成            | 完成率            |               |
| <b>第四工程公司</b>       |                         | <b>61285.37</b>  | <b>5515.41</b>   | <b>30897.00</b> | <b>10917.20</b> | <b>35.33%</b> | <b>11250.00</b> | <b>7980.40</b>  | <b>70.94%</b>  | <b>4937.00</b> | <b>3221.89</b>  | <b>65.26%</b>  | <b>9.00%</b>  |
| 1                   | 西铜高速公路 TH-20 标          | 22468.18         | 12953.55         | 15358.00        | 9692.98         | 63.11%        | 4220.00         | 6881.61         | 163.07%        | 1630.00        | 2263.98         | 138.89%        | 38.70%        |
| 2                   | 蓝田至周至哑柏公路 A6 标          | 3604.00          | 346.55           | 1800.00         | 59.10           | 3.28%         | 1379.00         | 59.10           |                | 358.00         | 59.10           |                | 9.62%         |
| 3                   | 西咸新区北环线路及桥梁 LJ-1 标      | 4227.38          |                  | 1200.00         |                 |               | 342.00          |                 |                | 97.00          |                 |                |               |
| 4                   | 神木石窑大桥                  | 538.81           | 287.46           | 539.00          | 287.46          | 53.33%        | 356.00          | 222.37          |                | 154.00         | 81.50           | 52.92%         | 53.35%        |
| 5                   | 十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标      | 10447.00         | 817.31           | 6000.00         | 817.31          | 13.62%        | 2141.00         | 817.31          |                | 782.00         | 817.31          |                |               |
| 6                   | 待定任务、尾留项目产值             |                  |                  | 6000.00         | 60.35           |               | 2812.00         |                 |                | 1916.00        |                 |                |               |
| <b>陕西路桥路面工程有限公司</b> |                         | <b>71974.72</b>  | <b>45267.86</b>  | <b>56740.00</b> | <b>26966.40</b> | <b>47.53%</b> | <b>24743.00</b> | <b>21608.71</b> | <b>87.33%</b>  | <b>7284.00</b> | <b>10047.30</b> | <b>137.94%</b> | <b>62.89%</b> |
| 1                   | 连云港徐圩新区港前大道工程建设         | 29047.27         | 20427.25         | 13380.00        | 4725.54         | 35.32%        | 4228.00         | 3634.33         | 85.96%         | 1200.00        | 1344.21         | 112.02%        | 70.32%        |
| 2                   | 新海至徐圩新区 XX-2 标          | 15406.18         | 8252.46          | 9670.00         | 4265.85         | 44.11%        | 4890.00         | 3090.56         | 63.20%         | 1218.00        | 831.92          | 68.30%         | 53.57%        |
| 3                   | 延志吴高速公路 LM-3 标段         | 12208.00         | 10753.94         | 8690.00         | 7236.06         | 83.27%        | 7192.00         | 6853.24         | 95.29%         | 1873.00        | 1558.48         | 83.21%         | 88.09%        |
| 4                   | 连云港其他项目                 | 552.05           | 552.05           |                 | 552.05          |               |                 | -94.35          |                |                |                 |                | 100.00%       |
| 5                   | 十天高速公路陕西汉略 HL-M04 标     | 9075.29          | 3982.52          | 9114.00         | 3982.52         | 43.70%        | 5433.00         | 3982.52         | 73.30%         | 1993.00        | 2303.93         | 115.60%        | 43.88%        |
| 6                   | 西长 2013 年公路养护工程 DL-4 标  | 1168.00          | 25.04            |                 | 25.04           |               |                 | 25.04           |                |                | 25.04           |                | 2.14%         |
| 7                   | 西镇 2013 年公路养护工程 DL-6 标  | 93.93            | 98.93            |                 | 98.93           |               |                 | 98.93           |                |                | 98.93           |                | 105.33%       |
| 8                   | 蒙靖 2013 年公路养护工程 DL-2 标  | 4424.00          | 1175.67          |                 | 1175.67         |               |                 | 1175.67         |                |                | 1175.67         |                | 26.57%        |
|                     | 尾留项目、待定产值               |                  |                  | 15886.00        | 4904.75         | 30.87%        | 3000.00         | 2842.78         | 94.76%         | 1000.00        | 2709.12         | 270.91%        |               |
| <b>试验检测中心</b>       |                         |                  |                  | <b>360.00</b>   | <b>236.14</b>   | <b>65.59%</b> | <b>90.00</b>    | <b>181.14</b>   |                | <b>160.00</b>  | <b>181.14</b>   | <b>113.21%</b> |               |
| <b>兴通监理公司</b>       |                         |                  |                  | <b>2850.00</b>  | <b>1449.37</b>  | <b>50.86%</b> | <b>600.00</b>   | <b>1230.22</b>  |                | <b>1000.00</b> | <b>1230.22</b>  | <b>123.02%</b> |               |
| <b>二、集团公司合作项目</b>   |                         | <b>67091.60</b>  | <b>55231.33</b>  | <b>10944.00</b> | <b>5892.55</b>  | <b>53.84%</b> | <b>4959.00</b>  | <b>4969.15</b>  | <b>100.20%</b> | <b>2159.00</b> | <b>413.06</b>   | <b>0.69</b>    | <b>82.32%</b> |
| 1                   | 延延高速公路路基 LI-1 标         | 9736.00          | 1701.75          | 7000.00         | 1701.75         | 24.31%        | 2000.00         | 1701.75         | 85.09%         | 600.00         | 413.06          | 68.84%         | 17.48%        |
| 2                   | 省道 303 二级公路土建工程第 ZM3 标段 | 3733.00          | 3245.37          | 400.00          |                 |               | 400.00          |                 |                | 200.00         |                 |                | 86.94%        |
| 3                   | 梅大高速公路土建工程 4 标段         | 28748.45         | 25839.02         | 2385.00         | 3370.69         | 141.33%       | 1400.00         | 2447.29         | 174.81%        | 800.00         |                 |                | 89.88%        |
| 4                   | 粤湘高速博深段第 8 标段           | 24874.15         | 24445.19         | 1159.00         | 820.11          | 70.76%        | 1159.00         | 820.11          | 70.76%         | 559.00         |                 |                | 98.28%        |
| <b>三、集团公司尾留项目</b>   |                         | <b>392477.68</b> | <b>387285.68</b> |                 | <b>3273.85</b>  |               |                 | <b>3273.85</b>  |                |                |                 |                |               |

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣




### 2013年重点项目生产计划完成情况图表

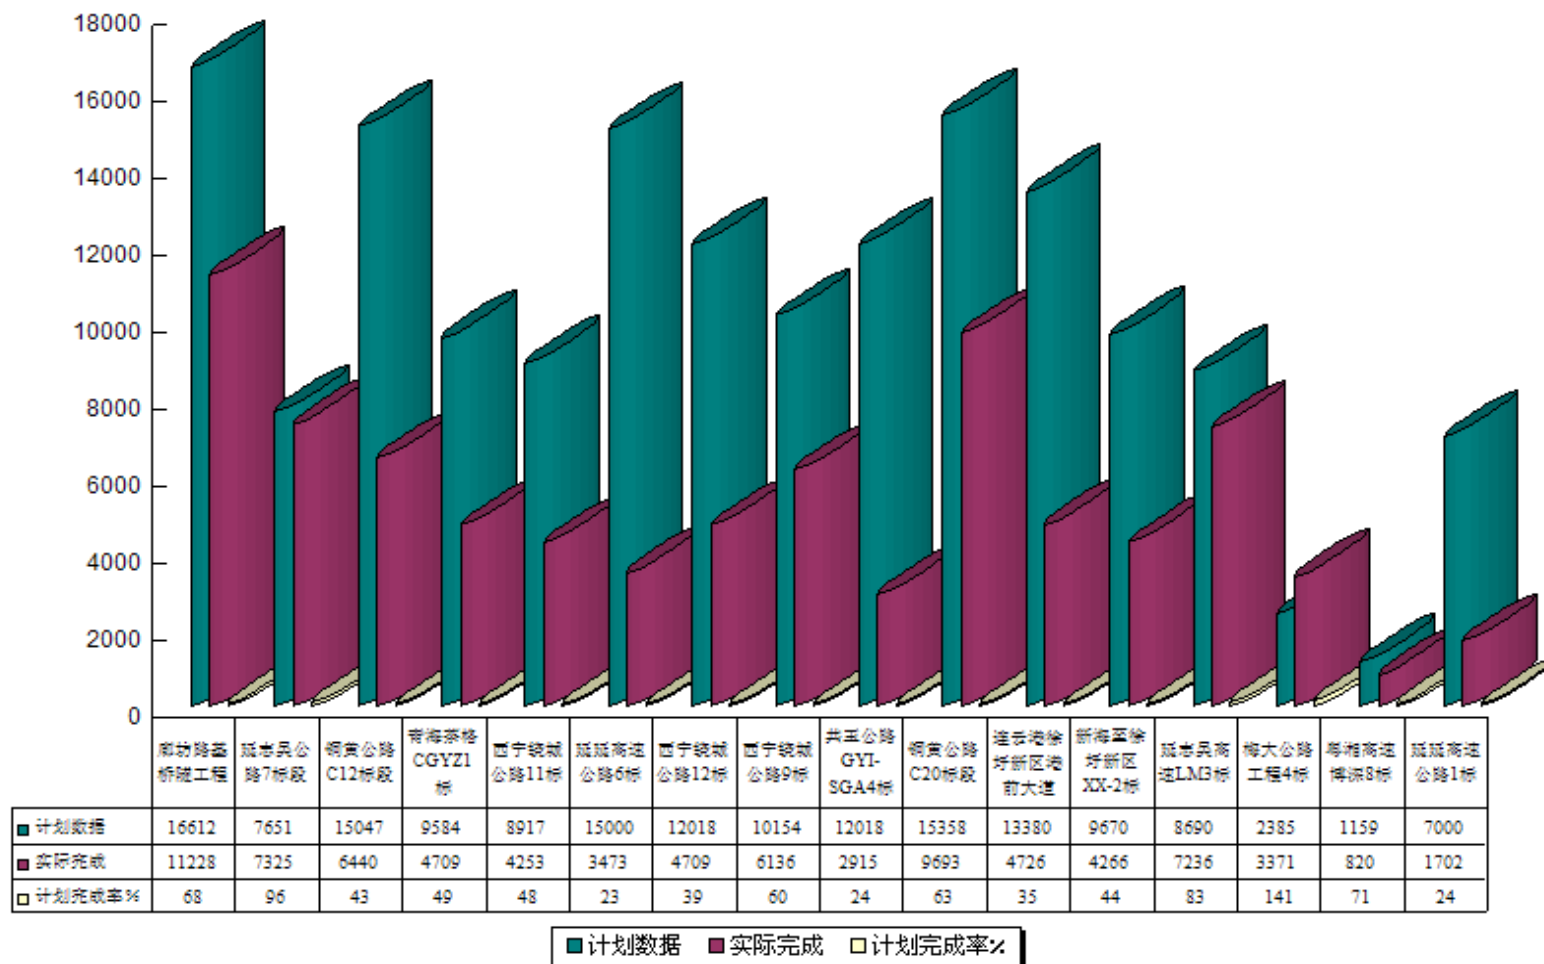

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

### 2013年重点项目合同履行统计图表

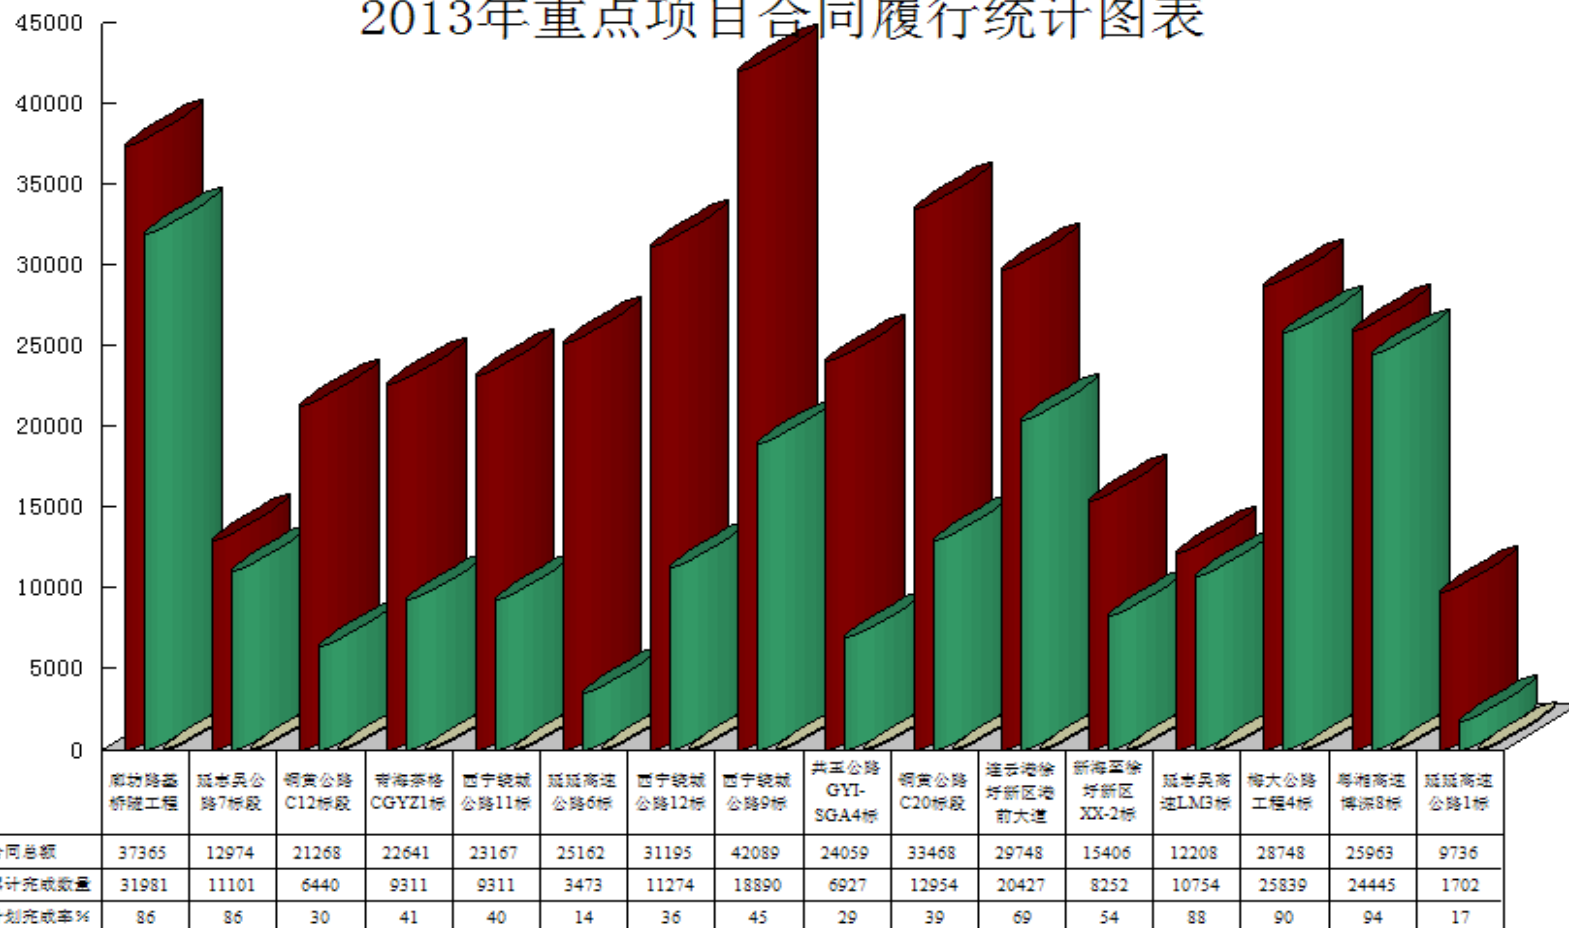

■ 合同总额    ■ 累计完成数量    □ 计划完成率%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣
