


# 陕西路桥统计简报

(第2期总第291期)

主办：陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一四三月

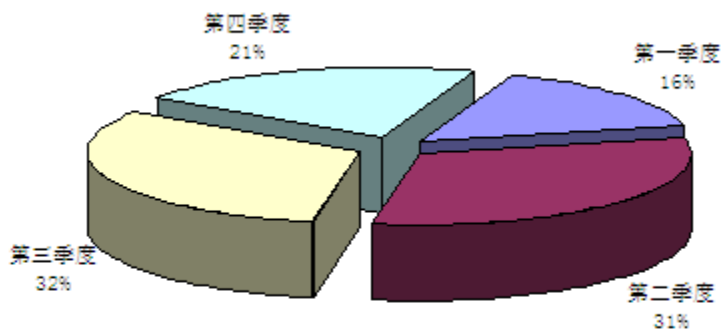

施工计划完成动态图

二〇一四年四月二日

## 2014年3月份计划执行情况分析

### 一、主要经济指标

截止本月底累计完成产值 52044.64 万元，其中：施工产值 50934.75 万元，为年计划的 16.82%，全员劳动生产率 113202 元/人，分别高于去年同期水平 179.48%、142.22%。为季度计划的 109.30%，本月完成产值 30070.07 万元。累计新承接 3 个项目 9.77 亿元，为年计划的 27.91%。

试验检测中心完成服务产值 217.82 万元，为年计划的 60.51%；兴通监理公司完成服务费用 892.07 万元，为年计划的 27.88%，新承接任务 1648.56 万元，为年计划 63.41%。

### 二、主要工程形象进度（累计完成情况）

#### 青海省茶格至格尔木公路工程 CGYZ-1 标段

累计完成预制：20m 箱梁 661/1710 片、30m 箱梁 46/131 片、16m 空心板 680/1780 片、8m 矩形板 933/1604 片、涵洞盖板 15856/16971 片；分别为合同的 39%、35%、38%、58%、93%。

#### 青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 1278/1469 片、矩形板 565/368 片、空心板 294/374 片，分别为合同量的 87%、153%、77%。矩形板安装 514/368 片、梁安装 743/1469 片、空心板安装 150/374，为合同量的 139%、50.6%、40%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km<sup>3</sup>，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 16/16 根、盖梁 12/12 个，为合同量的 100%、100%、100%。隧道开挖 2730/3230m、支护 2725/3230m、衬砌 2530/3260m，分别为合同量 85%、84%、77%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 586/567 km<sup>3</sup>、钻孔桩 351/327 根、墩柱 258/222 根、盖梁 61/61 个、梁预制 205/205 片，箱梁安装 205/205 片，现浇箱梁 8.57 联，悬臂浇筑 3/104 块，为合同量 103%、107%、118%、100%、100%、76%、60%、2%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 12 标

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 184km、土方 545 km<sup>3</sup>，为合同量的 100%、

82%、39%。钻孔桩 709/758 根、墩柱 493/620 根、盖梁 166/268 个、梁板 931/1250 片、梁板安装 540/1250 片，为合同量 94%、85%、62%、74%、43%。

### 青海省花石峡至久治公路 HD13 标段

累计完成洞身开挖 150/3790m、初期支护 150/3790m，为合同量 4%、4%。

### 连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标

累计完成土方 142 km<sup>3</sup>，为合同量的 78%；水泥搅拌桩 154km，为合同量的 62%；底基层 488/588 km<sup>2</sup>、级配碎石 34/27km<sup>2</sup>、面层 192/270 km<sup>2</sup>；分别为合同量的 83%、128%、71%；桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、空心板预制 255/255 片，分别为合同量 100%、100%、100%。

### 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标

累计完成借土填方 1486/1580 km<sup>3</sup>，为合同量的 94%。钻孔桩 714/714 根、墩柱 470/470 根、盖梁 114/114 片、箱梁预制 508/508 片、安装 508/508 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%。

### 黄延高速公路扩能工程 LJ-3 标

累计完成挖方 125/122 km<sup>3</sup>，为合同量的 102%；钻孔桩 90/99 根、墩柱 21/72 根，分别为合同量的 91%、29%；全断面掘进 680/4197m、支护 680/4197m、衬砌 72/4328m，分别为合同量 16%、16%、2%。

### 铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个，梁板预制 74/74 片，为合同量的 100%、100%、100%、100%；全断面掘进 3042/3863m，仰拱填充 3084/3924m，二衬 2834/39240m，分别为合同量的 79%、79%、68%。

### 铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 516/540 根、盖梁 259/274 片、预制梁 927/1380 片、梁安装 830/1380 片，为合同量的 100%、96%、95%、67%、60%。

### 延延高速公路路基 LJ-1 标

累计完成土方 170/580 km<sup>3</sup>；分别为合同量的 29%。桩基础 190/196 根、墩柱 110/115 根、空心板预制 200/235 片、空心板安装 80/235 片、箱梁预制 247/247 片、箱梁安装 180/247 片，分别为合同量的 97%、96%、85%、34%、100%、73%。

### 西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 23/376km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 15/439 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 6%、3%。

### 咸旬高速公路路面 LM-1 标

累计完成石灰粉煤灰稳定碎石底基层 328/951km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石下基层 354/954 km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石上基层 289/954 km<sup>2</sup>、粗粒式密级配沥青碎石 163/672 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 34%、37%、37%、24%。

### 西咸北环线路基 LJ-8 标

累计完成强夯 238/528 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 45%；灰土、碎石桩处理 368/1215km，为合同量的 30%；桥梁基础桩 286/813 根，为合同量的 35%；梁板预制 126/859 片，为合同的 15%。

### 十天高速公路旬阳 LD 连接线 AD-LD 标

累计完成桥梁基础桩 291/326 根、墩柱 192/284 根、盖梁 104/159 片、箱梁预制 237/483 片、箱梁安装 189/483 片，分别为合同量的 89%、67%、65%、49%、39%。

## 三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成产值 31179.96 万元，为计划的 114.33%，其中：

- 1 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标完成计划的 126.87%；
- 2 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 111.68%；
- 3 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 111.21%；
- 4 延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标完成计划的 109.28%；
- 5 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 102.63%；
- 6 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 102.32%；
- 7 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 101.32%；
- 8 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 100.28%；
- 9 咸旬高速公路路面 LM-1 标完成计划的 90.76%
- 10 渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 89.30%；
- 11 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标完成计划的 74.68%；
- 12 十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标完成计划的 40.88%。

## 四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 7.25%；

- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 10.27%;
- 3 第三工程公司完成计划的 16.69%;
- 4 第四工程公司完成计划的 21.09%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 12.03%;
- 6 试验检测中心完成计划的 60.51%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 27.88%。

## 五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 33.75%;
- 2 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 27.68%;
- 3 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 17.91%;
- 4 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标段完成计划的 17.07%;
- 5 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 16.58%;
- 6 渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 14.31%;
- 7 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 11.97%;
- 8 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 10.90%;
- 9 咸旬高速公路路面 LM-1 标完成计划的 10.84%
- 10 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标段完成计划的 5.37%;
- 11 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 4.47%;

## 六、简要分析与建议：

### 1.分析：

本月计划虽然基本完成。一季度省外除京台 LQ1 标、湖南龙永 24 标、青海花久 HD13 标等项目外，其余基本完成季度计划；省内除延延路基 6 标、西咸北环线 LJ-8 标、铜黄 TH-20 标等项目外，其余的项目未能完成季度计划。

### 2.建议：

各单位根据总体计划，计划分解到月，各项保证措施到位，加强施工现场和内部管理控制，在保证施工安全的前提下，合理安排施工进度。特别今年要交验的项目，根据项目合同要求，倒排计划，确保项目按时完工和总体计划实施。

## 七、其他情况说明

- 1 统计资料以项目部提供的为准，统计产值统计截止日期为 3 月 28 日。
- 2 集团公司各部门采用统计数据，请依此数据为准。

2014 年 4 月 2 日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

## 集团公司 2014 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第一季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际 完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
<b>陕西路桥集团有限公司合计</b>		1363195.43	1067500.07	302905.00	52044.64	17.18%	46605.00	52044.64	111.67%	27273.00	31179.96	114.33%	78.31%
<b>陕西路桥第一工程有限公司</b>		<b>104339.41</b>	<b>73925.60</b>	<b>54216.00</b>	<b>3929.98</b>	<b>7.25%</b>	<b>3590.00</b>	<b>3929.98</b>	<b>109.47%</b>	<b>2698.00</b>	<b>2284.80</b>	<b>84.68%</b>	<b>70.85%</b>
1	京台公路廊坊路基桥隧工程 LQ1 标	45482.00	43600.54	2294.00	412.46	17.98%	743.00	412.46	55.51%	743.00	412.46	55.51%	95.86%
2	铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标段	21412.00	13953.11	6023.00	227.04	3.77%	885.00	227.04	25.65%	855.00	227.04	26.55%	65.16%
3	青海茶卡至格尔木预制 CGYZ1 标	20067.00	10635.99	9723.00	291.73	3.00%		291.73			291.73		53.00%
4	龙永高速公路 24 标	17378.41	5735.96	7376.00	1223.26	16.58%	1562.00	1223.26	78.31%	1100.00	1223.26	111.21%	33.01%
	待定计划			26000.00									
	以子公司名义承揽项目			2800.00			400.00						
	尾留项目产值	134032.28	140978.52		1775.49			1775.49			130.31		
<b>陕西路桥第二工程有限公司</b>		<b>166092.32</b>	<b>38520.25</b>	<b>58250.00</b>	<b>5977.46</b>	<b>10.26%</b>	<b>6075.00</b>	<b>5977.46</b>	<b>98.39%</b>	<b>5545.00</b>	<b>5977.46</b>	<b>107.80%</b>	<b>23.19%</b>
1	西宁南绕城公路土建工程 11 标	19800.00	15871.52	4462.00	533.97	11.97%		533.97			533.97		80.16%
2	延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标	25291.45	16859.80	9672.00	1529.92	15.82%	1020.00	1529.92	149.99%	1400.00	1529.92	109.28%	66.66%
3	佛坪县陈三库周交通重建工程 3 标	2636.77	1304.52	1005.00	658.61	65.53%	192.00	658.61	343.03%	318.00	658.61	207.11%	49.47%
4	青海花九 HD-13 标	42000.00	2392.36	11300.00	1231.58	10.90%	2236.00	1231.58	55.08%	1200.00	1231.58	102.63%	5.70%
5	榆林收费站北迁工程 SJ-TJ-2 标	3153.58	32.57	1804.00	32.57	1.81%	58.00	32.57	56.16%	58.00	32.57	56.16%	1.03%
6	S250 线灵朱段改建工程 SG-2 标	6494.40	805.33	4202.00	736.66	17.53%	858.00	736.66	85.86%	858.00	736.66	85.86%	12.40%
7	零口至马召一级公路改建工程 I 标	10648.14	192.15	5031.00	192.15	3.82%	289.00	192.15	66.49%	289.00	192.15	66.49%	1.80%
8	黄延公路改扩能路基桥隧 22 标	52067.98	1062.00	19774.00	1062.00	5.37%	1422.00	1062.00	74.68%	1422.00	1062.00	74.68%	2.04%
	以子公司名义承揽项目	4000.00		1000.00									
	尾留项目产值	74605.14	79755.81										
<b>第三工程公司</b>		<b>195611.85</b>	<b>74625.07</b>	<b>54882.00</b>	<b>9158.65</b>	<b>16.69%</b>	<b>11231.00</b>	<b>9158.65</b>	<b>81.55%</b>	<b>4137.00</b>	<b>5204.52</b>	<b>125.80%</b>	<b>38.15%</b>
1	青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标	16516.92	11505.75	5237.00	226.21	4.32%	214.00	226.21	105.71%		226.21		69.66%
2	西宁南绕城公路土建工程 9 标	39318.64	32334.03	10280.00	3469.93	33.75%	3458.00	3469.93	100.34%	1372.00	1375.84	100.28%	82.24%
3	西宁南绕城公路土建工程 12 标	35007.86	22961.73	11255.00	502.58	4.47%	318.00	502.58	158.04%	450.00	502.58	111.68%	65.59%
4	黄延公路扩能路基桥隧工程 LJ3 标	57750.88	7823.56	28110.00	4797.13	17.07%	7241.00	4797.13	66.25%	2315.00	2937.09	126.87%	13.55%
	尾留项目产值	42259.72	40739.88		162.80			162.80			162.80		

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


## 集团公司2014年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第一季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际 完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
<b>第四工程公司</b>		<b>138025.74</b>	<b>121661.71</b>	<b>55010.00</b>	<b>11600.55</b>	<b>21.09%</b>	<b>12182.00</b>	<b>11600.55</b>	<b>95.23%</b>	<b>8549.00</b>	<b>8989.97</b>	<b>105.16%</b>	<b>88.14%</b>
1	西咸新区北环线路基 LJ-1 标	3644.20	1116.79	3216.00	701.24	21.80%	1631.00	701.24	42.99%	472.00	472.73	100.15%	30.65%
2	西咸新区北环线路基 LJ-8 标	54278.38	7286.04	26100.00	4675.22	17.91%	4657.00	4675.22	100.39%	3896.00	3986.20	102.32%	13.42%
3	渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标	16958.00	1447.00	10114.00	1447.00	14.31%	2700.00	1447.00	53.59%	996.00	889.40	89.30%	8.53%
4	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	19712.26	6397.43	8000.00	913.62	11.42%	1735.00	913.62	52.66%	2235.00	913.62	40.88%	32.45%
5	西铜高速公路 TH-20 标	33577.74	26196.97	7580.00	2098.04	27.68%	1459.00	2098.04	143.80%	950.00	962.59	101.33%	78.02%
6	店塔立交 N1 标	9855.16											
	西延分公司养护中修工程		189.38		189.38			189.38			189.38		
	尾留项目产值	57941.63	75261.75		1576.05			1576.05			1576.05		
<b>陕西路桥路面工程有限公司</b>		<b>62815.53</b>	<b>7413.55</b>	<b>65000.00</b>	<b>7821.85</b>	<b>12.03%</b>	<b>5080.00</b>	<b>7821.85</b>	<b>153.97%</b>	<b>6344.00</b>	<b>7577.74</b>	<b>119.45%</b>	<b>11.80%</b>
1	咸旬高速公路路面 LM-1 标	21612.73	5565.90	17900.00	1939.47	10.84%	3880.00	1939.47	49.99%	2137.00	1939.47	90.76%	25.75%
2	西宝改扩建工程	15302.80	1055.55	8110.00	62.80	0.77%	80.00	62.80	78.50%	80.00	62.80	78.50%	6.90%
3	延延高速公路路基 LM-1 标	25900.00	312.83	8165.00	312.83		300.00	312.83	104.28%	300.00	312.83	104.28%	1.21%
4	汉中略阳嘉陵江大桥改建配套渡河工程		479.27		479.27			479.27		480.00	479.27	99.85%	
	待定计划			30825.00			820.00						
	以子公司名义承揽项目												
	尾留产值	306936.11	339624.63		5027.48			5027.48		3347.00	4783.37		
<b>二、集团公司合作项目</b>		<b>80535.70</b>	<b>74993.30</b>	<b>11987.00</b>	<b>12446.26</b>	<b>103.83%</b>	<b>7987.00</b>	<b>12446.26</b>	<b>155.83%</b>		<b>35.58</b>		<b>93.12%</b>
1	延延高速公路路基 LI-1 标	9736.00	4942.96	7000.00	4942.96	70.61%	3000.00	4942.96	164.77%		35.58		50.77%
2	省道 303 线二级公路长米段土建工程	3733.00	4180.00	935.00	934.63	99.96%	935.00	934.63	99.96%				111.97%
3	梅大高速公路土建工程 4 标段	28748.45	27389.49	3232.00	4921.16	152.26%	3232.00	4921.16	152.26%				95.27%
4	粤湘高速博深段第 8 标段	24874.15	24445.19	820.00	820.11	100.01%	820.00	820.11	100.01%				98.28%
5	大广公路龙杨段路基路面工程 A2 标	13444.10	14035.66		827.40			827.40					104.40%
<b>试验检测中心</b>				<b>360.00</b>	<b>217.82</b>	<b>60.51%</b>	<b>60.00</b>	<b>217.82</b>		<b>60.00</b>	<b>217.82</b>		
<b>兴通监理公司</b>				<b>3200.00</b>	<b>892.07</b>	<b>27.88%</b>	<b>400.00</b>	<b>892.07</b>		<b>400.00</b>	<b>892.07</b>		

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

## 2014年重点项目生产计划完成情况图表

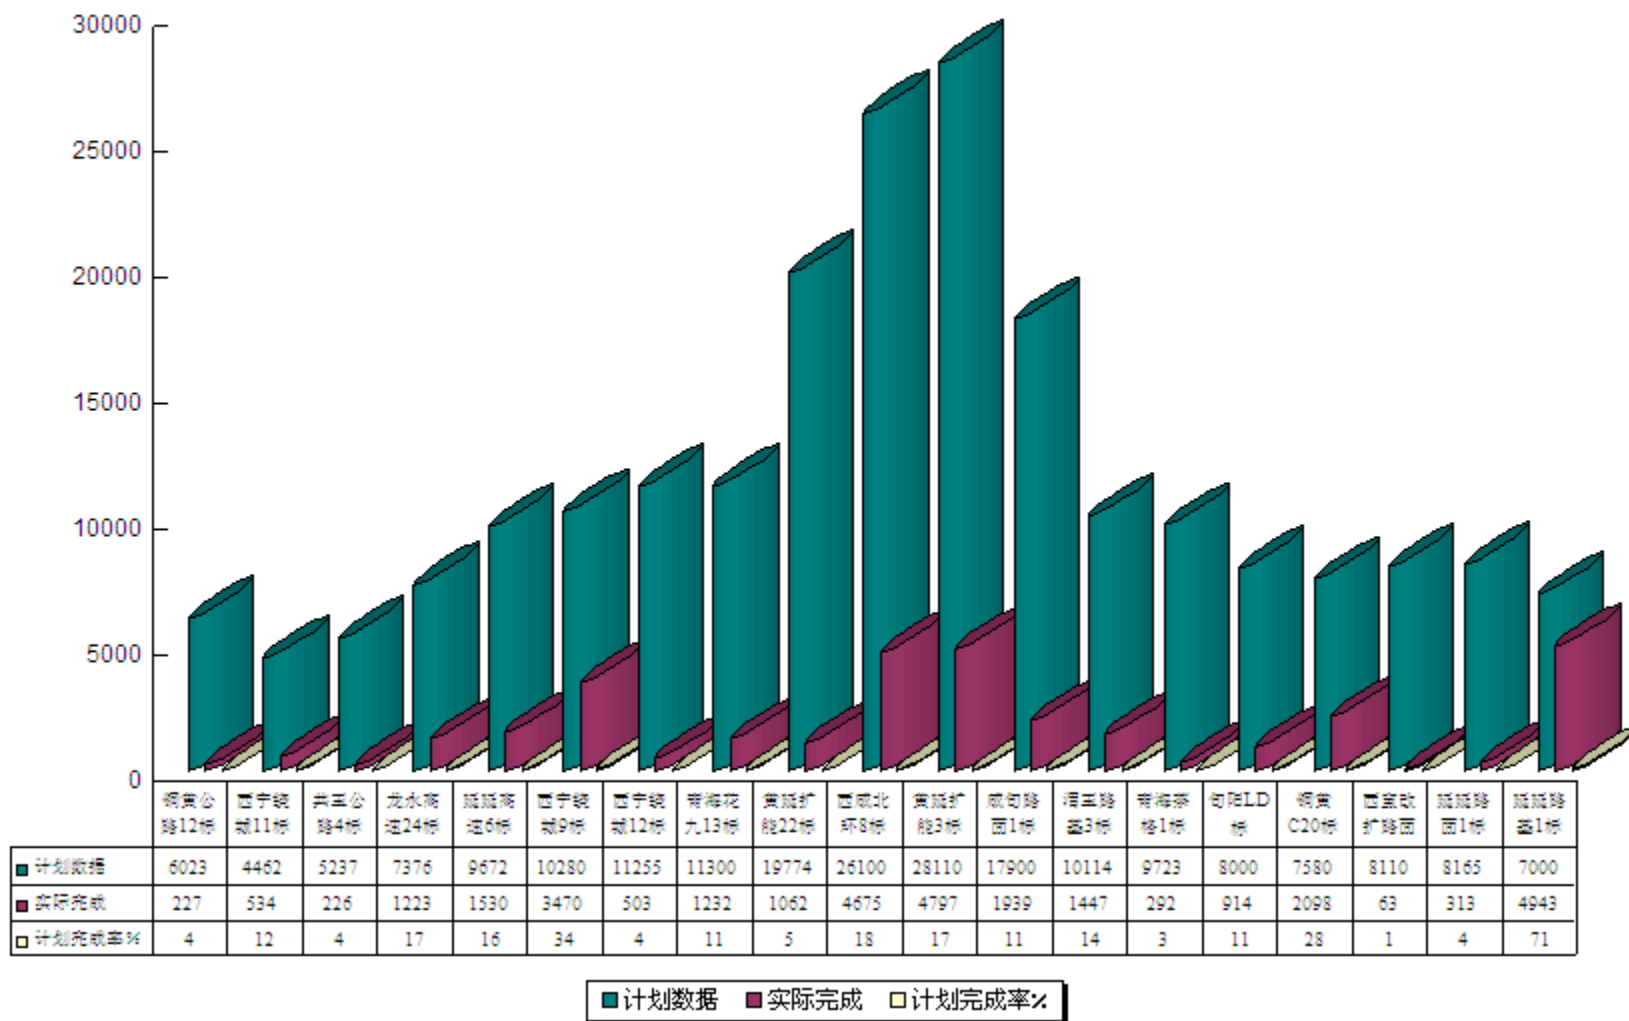


部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣



### 2014年重点项目合同履行统计图表

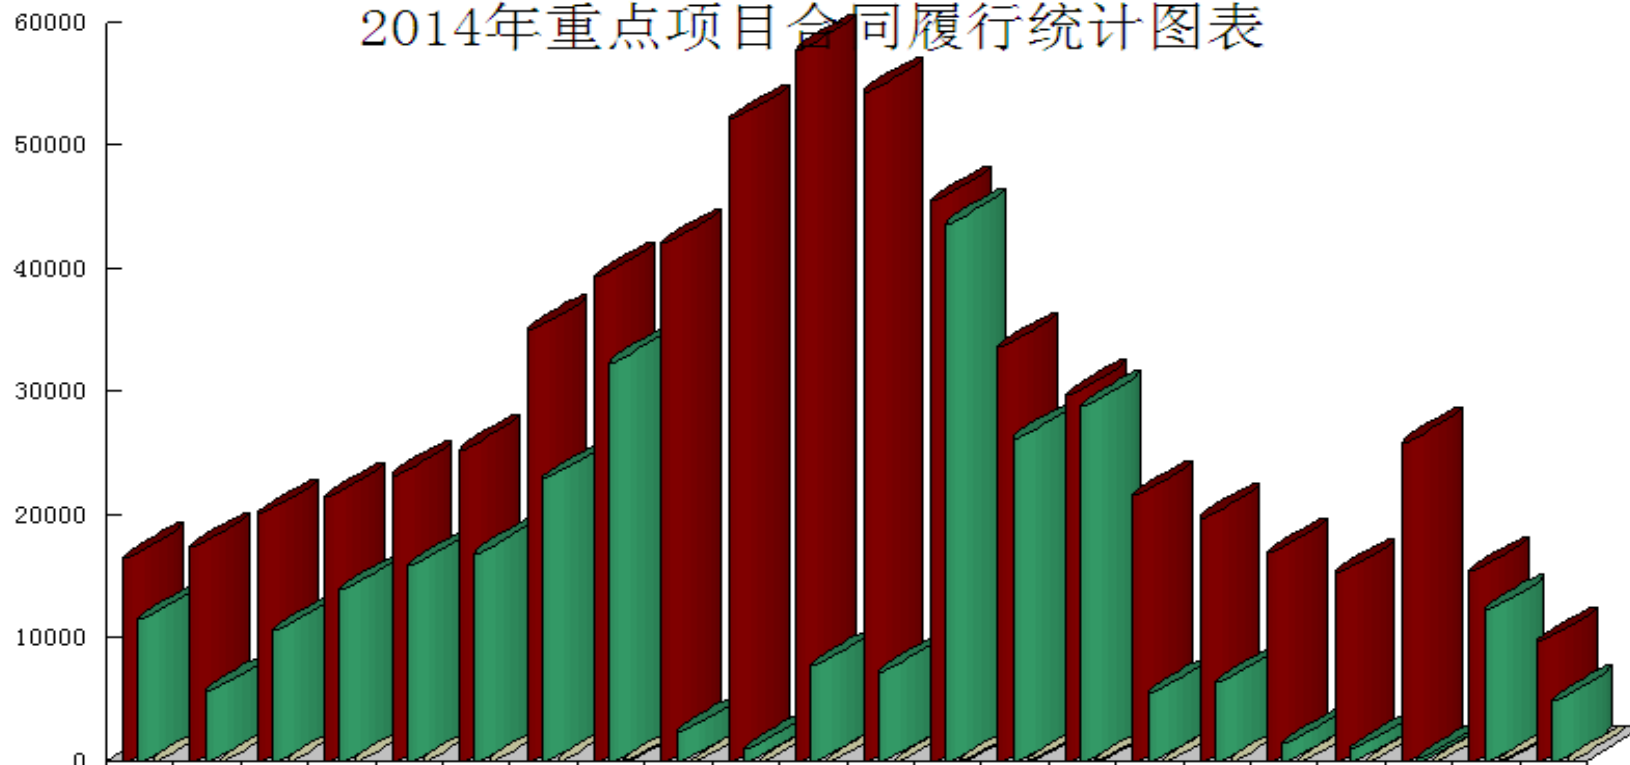

	共三公路 GYL- SGA4	龙水高 速公路 24标	青海茶 卡 CGYZ 1标	铜黄公 路C12 标段	西宁绕 城公路 11标	咸咸高 速公路 6标	西宁绕 城公路 12标	西宁绕 城公路 9标	青海花 九HD- 13标	黄咸公 路扩能 22标	黄咸公 路扩能 3标	西咸北 环线路 第8标	郑坊路 高架桥 工程	铜黄公 路C20 标段	徐坪新 区海韵 大道	咸旬高 速公路 第1标	安康司 阳立交 LD标	渭三桥 WY3 标	西康改 扩建工 程	咸咸高 速路面 1标	新海徐 坪新区 2标	咸咸高 速公路 1标
■ 合同总额	16517	17378	20067	21412	23167	25291	35008	39319	42000	52068	57751	54278	45482	33578	29748	21613	19712	16958	15303	25900	15406	9736
■ 累计完成数量	11506	5736	10636	13953	15872	16860	22962	32334	2392	1062	7824	7286	43601	26197	28831	5566	6397	1447	1056	313	12340	4943
□ 计划完成率%	70	33	53	65	69	67	66	82	6	2	14	13	96	78	97	26	32	9	7	1	80	51

■ 合同总额    ■ 累计完成数量    □ 计划完成率%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣
