


陕西路桥统计简报

(第5期总第294期)

主办：陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一四年六月

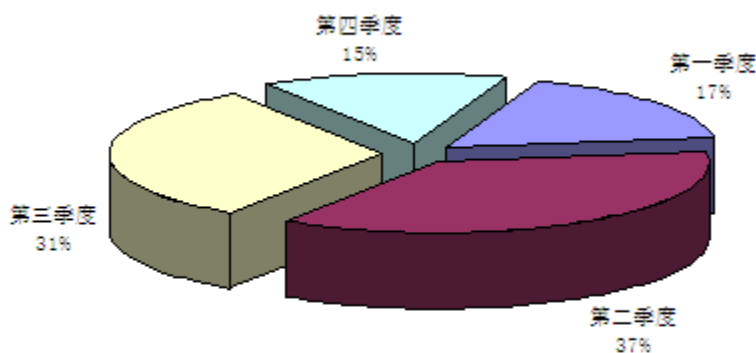

施工计划完成动态图

二〇一四年七月二日

2014年6月份计划执行情况分析

一、主要经济指标

截止本月底累计完成产值 163333.09 万元，为年计划的 53.92%，全员劳动生产率 302468 元/人，分别高于去年同期水平 58.62%、42.46%。本月完成产值 46146.46 万元。累计承接 4 个项目总额 10 亿元，为年计划的 28.57%（承接项目以移交资料为准）。

试验检测中心完成服务产值 305.44 万元，为年计划的 84.84%；兴通监理公司完成服务产值 1898.33 万元，为年计划的 59.32%，新承接任务 2416.96 万元，为年计划 86.32%。

二、主要工程形象进度（累计完成情况）

青海省茶格至格尔木公路工程 CGYZ-1 标段

累计完成预制：20m 箱梁 1468/1710 片、30m 箱梁 113/131 片、16m 空心板 1455/1772 片、8m 矩形板 1604/1604 片、涵洞盖板 16971/16971 片；分别为合同的 86%、86%、82%、100%、100%。

青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 1529/1469 片、矩形板 618/368 片、空心板 340/374 片，分别为合同量的 104%、168%、91%。矩形板安装 588/368 片、梁安装 1171/1469 片、空心板安装 215/374，为合同量的 159%、80%、57%。

青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km³，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 16/16 根、盖梁 12/12 个，为合同量的 100%、100%、100%。隧道开挖 3120/3230m、支护 3115/3230m、衬砌 2998/3260m，分别为合同量 97%、96%、92%。

青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 642/567 km³、钻孔桩 345/345 根、墩柱 258/258 根、盖梁

63/61个、梁预制215/205片，箱梁安装215/205片，现浇箱梁12联，悬臂浇筑34/104块，为合同量113%、100%、100%、103%、105%、105%、86%、33%。

青海西宁南绕城公路土建工程12标

累计完成碎石桩337km、灰土桩195km、土方778 km³，分别为合同量的100%、87%、64%。钻孔桩747/758根、墩柱582/620根、盖梁240/268个、梁板1191/1250片、梁板安装887/1250片、现浇箱梁36/55孔，为合同量99%、94%、90%、95%、71%、65%。

青海省花石峡至久治公路HD13标段

累计完成洞身开挖339/3790m、初期支护339/3790m、二衬72/3790m，为合同量9%、9%、2%。

连云港市新海至徐圩新区XX-2标

累计完成土方150 km³，为合同量的105%；水泥搅拌桩195km，为合同量的78%；底基层520/588 km²、面层245/295 km²；分别为合同量的91%、83%；桩基170/170根、墩柱78/78根、盖梁42/42个、空心板255/255片、箱梁64/64片，分别为合同量100%、100%、100%、100%、100%。

河北京台公路廊坊段路基桥梁工程LQ1标

累计完成借土填方1646/1580 km³，为合同量的104%。钻孔桩714/714根、墩柱470/470根、盖梁114/114个、箱梁预制508/508片、安装508/508片，分别为合同量的100%、100%、100%、100%、100%。

黄延高速公路扩能工程LJ-3标

累计完成挖方197/122 km³，为合同量的161%；钻孔桩99/99根、墩柱70/72根、盖梁15/31个、箱梁预制55/185片、箱梁安装20/185片，分别为合同量的100%、97%、77%、30%、11%；全断面掘进1685/4197m、支护1685/4197m、衬砌1038/4328m，分别为合同量的40%、40%、24%。

铜黄高速公路桥隧路基TH-20标

累计完成桩基50/50根、墩柱16/16根、盖梁8/8个，梁板预制74/74片，

为合同量的 100%、100%、100%、100%；全断面掘进 3501/3863m，仰拱填充 3569/3924m，二衬 3316/3924m，分别为合同量的 91%、91%、84%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 536/536 根、盖梁 272/272 个、预制梁 1281/1380 片、梁安装 1165/1380 片，为合同量的 100%、100%、100%、93%、84%。

延延高速公路路基 LJ-1 标

累计完成土方 537/580 km³、桩基 196/196 根、墩柱 115/115 根、盖梁 91/91 个、空心板预制 284/284 片、空心板安装 284/284 片、箱梁预制 247/247 片、箱梁安装 247/247 片，分别为合同量的 93%、100%、100%、100%、100%、100%、100%、100%。

西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 98/377km²、水泥稳定碎石基层 61/527 km²，分别为合同量的 26%、11%。粗粒式密级配沥青混凝土 16/418km²、中粒式沥青混凝土 16/726km²，为合同量的 3%、2%。

咸旬高速公路路面 LM-1 标

累计完成石灰粉煤灰稳定碎石底基层 627/951km²、水泥稳定碎石基层 722/954 km²、粗粒式密级配沥青碎石 521/672 km²、中粒式改性沥青混凝土 360/969 km²，分别为合同量的 66%、76%、77%、37%。

西咸北环线路基 LJ-8 标

累计完成强夯 463/508 km²、灰土、碎石桩 848/1215km，分别为合同量的 91%、70%；桥梁桩基 635/813 根、墩柱 278/466 根、盖梁 65/240 个、梁板预制 442/859 片、安装 100/859 片，分别为合同量的 88%、56%、27%、51%、11%。

十天高速公路旬阳 LD 连接线 AD-LD 标

累计完成桥梁基础桩 311/326 根、墩柱 224/284 根、盖梁 123/159 个、箱

梁预制 358/483 片、箱梁安装 303/483 片，分别为合同量的 95%、79%、77%、74%、63%。隧道全面开挖 48/1243m、支护 48/1244m、衬砌 42/1245m，为合同量的 3.8%、3.8%、3.4%。

渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标

累计完成挖方 627/996 km³，为合同量的 63%。桥梁桩基 270/416 根、墩柱 70/260 根、盖梁 27/169 个、箱梁预制 209/532 片、安装 51/532 片，分别为合同总量 65%、27%、16%、39%、10%。

河南省道 250 线灵宝至朱阳段改建工程 S250SG-2 标

累计完成桥梁桩基 42/42 根、立柱 1/10 根、薄壁墩 3/6 根、盖梁 3/15 个，分别为合同量的 100%、10%、50%、20%；隧道开挖 313/606m、初期支护 189/606m，分别为合同总量 52%、31%。

湖南龙永高速公路 24 标

累计完成路基挖填土石方 55/331 km³，为合同量的 16%。隧道开挖 25495/4488m、初期支护 2549/4488m、二次衬砌 2033/4488m，分别为合同总量 57%、57%、45%。

三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成产值 46146.46 万元，为计划的 110.02%，其中：

- 1 青海茶格高速公路 CGYZ-1 标完成计划的 118.83%；
- 2 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 114.72%；
- 3 咸旬高速公路路面 LM-1 标完成计划的 112.13%；
- 4 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标完成计划的 110.95%；
- 5 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 110.60%；
- 6 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 109.73%；
- 7 渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 109.13%；
- 8 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 108.60%；
- 9 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 106.69%；
- 10 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标完成计划的 104.10%；

- 11 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 103.68%;
- 12 延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标完成计划的 90.27%;
- 13 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 88.69%;
- 14 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 81.36%;
- 15 十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标完成计划的 68.83%;
- 16 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 47.73%。

四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 42.79%;
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 54.91%;
- 3 第三工程公司完成计划的 62.11%;
- 4 第四工程公司完成计划的 65.03%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 31.53%;
- 6 试验检测中心完成计划的 84.84%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 59.32%。

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 88.37%;
- 2 青海茶格高速公路 CGYZ-1 标完成计划的 83.450%;
- 3 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 69.86%;
- 4 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 69.20%;
- 5 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 66.67%;
- 6 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 63.94%;
- 7 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标段完成计划的 60.53%;
- 8 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 58.61%;
- 9 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 57.81%;
- 10 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 54.08%;
- 11 咸旬高速公路路面 LM-1 标完成计划的 52.50%;
- 12 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 45.34%;
- 13 渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 48.67%;
- 14 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标段完成计划的 30.12%。

六、简要分析与建议：

1.分析：

本月计划总体超额完成。6月份省外项目9个，除共玉4标、西宁绕城9标、西宁绕城11标等3个项目未能完成外，其余基本超额完成；省内项目15个，除延延路基6标、延延路面1标、西宝改扩建路面7标、西咸北环线LJ-1标、安康连接线AD标等5个项目计划未完成外，其余的10个项目超额完成月度计划。

2、存在问题：

- ①、路面施工进度缓慢。路基移交工作面小，施工受影响比较大。
- ②、今年新开项目施工缓慢。
- ③、施工现场管理不到位。表现为计划执行力差。

2.建议：

各基层要加强计划管理，提高计划执行力。做好计划分解，并制定详细的计划实施措施，各项资源到位；各项目加强施工现场管控，在保证施工安全的前提下，合理安排进度，极大的提高生产效率和工作效率，确保各项目的阶段目标实施；加强各方沟通联系，提前解决不利施工进度的环境因素。特别今年要交验的项目，加快施工进度，确保按时交验。

七、其他情况说明

- 1 统计资料以项目部提供的为准，统计产值统计截止日期为6月30日。
- 2 集团公司各部门采用统计数据，请依此数据为准。

2014年7月2日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表


集团公司 2014 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第二季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	本月计划	实际完成	完成率	
陕西路桥集团有限公司合计		1399696.25	1185823.15	302905.00	163333.09	53.92%	105667.00	111150.35	105.19%	41944.63	46146.46	110.02%	84.72%
陕西路桥第一工程有限公司		104339.41	90840.18	54216.00	23200.51	42.79%	17019.00	19270.53	113.23%	6362.00	7979.37	125.42%	87.06%
1	京台廊坊路基桥隧工程 LQ1 标	45482.00	45023.36	2294.00	1835.28	80.00%	1480.00	1422.82	96.14%	316.00	316.18	100.06%	98.99%
2	铜黄路基桥涵施工 TH-C12 标段	21412.00	17741.77	6023.00	4015.70	66.67%	4197.00	3788.66	90.27%	1316.00	1364.49	103.68%	82.86%
3	青海茶卡至格尔木预制 CGYZ1 标	20067.00	18457.78	9723.00	8113.53	83.45%	5497.00	7821.80	142.29%	2400.00	2683.81	111.83%	91.98%
4	龙永高速公路 24 标	17378.41	9617.27	7376.00	5104.56	69.20%	2445.00	3881.30	158.74%	1180.00	1258.94	106.69%	55.34%
	待定计划			26000.00			3000.00			1000.00			
	以子公司名义承揽项目			2800.00			400.00			150.00			
	尾留项目产值	134032.28	143334.47		4131.44			2355.95			2355.95		
陕西路桥第二工程有限公司		166092.32	62547.62	58250.00	31984.52	54.91%	25477.00	26007.06	102.08%	10228.76	12691.86	124.08%	37.66%
1	西宁南绕城公路土建工程 11 标	19800.00	17916.88	4462.00	2579.33	57.81%	2039.00	2045.36	100.31%	630.83	559.50	88.69%	90.49%
2	延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标	25291.45	22470.13	9672.00	7140.25	73.82%	7015.00	5610.33	79.98%	2238.69	2020.94	90.27%	88.84%
3	佛坪陈三库周交通复建工程 3 标	2636.77	2270.78	1005.00	1624.87	161.68%	1304.00	966.26	74.10%	391.83	401.84	102.56%	86.12%
4	青海花九 HD-13 标	42000.00	7271.64	11300.00	6110.86	54.08%	3677.00	4879.28	132.70%	2167.00	2353.36	108.60%	17.31%
5	榆林收费站北迁工程 SJ-TJ-2 标	3153.58	680.04	1804.00	680.04	37.70%	633.00	647.47	102.29%	280.00	298.30	106.53%	21.56%
6	S250 线灵朱段改建工程 SG-2 标	6494.40	2992.80	4202.00	2924.13	69.59%	2786.00	2187.47	78.52%	886.79	1074.83	121.20%	46.08%
7	零马一级公路改建工程 I 标	10648.14	2988.83	5031.00	2988.83	59.41%	2512.00	2796.68	111.33%	908.96	1167.05	128.39%	28.07%
8	黄延公路改扩能路基桥隧 22 标	52067.98	5956.52	19774.00	5956.52	30.12%	5511.00	4894.52	88.81%	2724.66	2836.35	104.10%	11.44%
	以子公司名义承揽项目	4000.00		1000.00									
	尾留项目产值	74605.14	81735.51		1979.70			1979.70			1979.70		
第三工程公司		197407.71	98797.13	54882.00	34086.25	62.11%	19060.00	24927.60	130.78%	8778.87	9073.30	103.35%	50.05%
1	青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标	16516.92	13653.76	5237.00	2374.22	45.34%	4047.00	2148.01	53.08%	1528.76	729.65	47.73%	82.67%
2	西宁南绕城公路土建工程 9 标	39318.64	36045.97	10280.00	7181.87	69.86%	3710.00	3711.94	100.05%	1250.11	1017.14	81.36%	91.68%
3	西宁南绕城公路土建工程 12 标	35007.86	29055.86	11255.00	6596.70	58.61%	4379.00	6094.12	139.17%	1700.00	1950.23	114.72%	83.00%
4	黄延公路扩能路基桥隧工程 LJ3 标	57750.88	20041.54	28110.00	17015.09	60.53%	6819.00	12217.96	179.18%	4300.00	4770.65	110.95%	34.70%
	尾留项目产值	43157.65	40924.66		918.36		105.00	755.56	719.58%		605.63		

集团公司2014年度施工项目计划执行情况


序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第二季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完成 合同比率
				计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	本月计划	实际完成	完成率	
第四工程公司		138025.74	146346.36	55010.00	35772.08	65.03%	18391.00	24171.53	131.43%	9032.00	8963.56	99.24%	106.03%
1	西咸新区北环线路基LJ-1标	3644.20	2324.19	3216.00	1908.64	59.35%	1584.00	1207.40	76.23%	853.00	369.80	43.35%	63.78%
2	西咸新区北环线路基LJ-8标	54278.38	19299.43	26100.00	16688.61	63.94%	7578.00	12013.39	158.53%	4350.00	4773.20	109.73%	35.56%
3	渭玉高速公路路基桥隧工程WY-03标	16958.00	4922.45	10114.00	4922.45	48.67%	4130.00	3475.45	84.15%	1660.00	1811.62	109.13%	29.03%
4	十天高速公路旬阳连接AD-LD标	19712.26	8694.01	8000.00	3210.20	40.13%	3002.00	2296.58	76.50%	1089.00	749.56	68.83%	44.10%
5	西铜高速公路TH-20标	33577.74	30797.62	7580.00	6698.69	88.37%	2097.00	4600.65	219.39%	1080.00	1194.45	110.60%	91.72%
6	西延分公司养护中修工程	189.38	189.38		189.38			0.00					
陕西路桥路面工程有限公司		102708.06	32019.17	65000.00	20493.74	31.53%	24525.00	12533.79	51.11%	7543.00	6344.49	84.11%	31.17%
1	咸旬高速公路LM-1标	21612.73	13024.51	17900.00	9398.08	52.50%	11471.00	7458.61	65.02%	2145.00	2405.16	112.13%	60.26%
2	西宝改扩建工程	15302.80	1963.76	8110.00	1190.35	14.68%	3206.00	1127.55	35.17%	1612.00	316.57	19.64%	12.83%
3	延延高速公路路基LM-1标	25900.00	926.46	8165.00	926.46	11.35%	1308.00	613.63	46.91%	900.00	533.69	59.30%	3.58%
4	新海至徐圩新区XX-2标	15406.18	13551.62		2662.73			1211.94			877.42		87.96%
	待定计划			30825.00			8540.00			2886.00			
	以子公司名义承揽项目	24486.35	2552.83										
	汉中嘉陵江大桥改建配套渡河工程	479.27	479.27		479.27								
	黄铜公路何家坊至黄陵路面工程3标	20816.00	303.46		303.46			303.46			303.46		
	新宝汉高速公路路面HC-LM2标		155.71		155.71			155.71			155.71		
	2014年靖王养护DL-1标	788.84	174.03		174.03			174.03			174.03		
	2014年吴靖公路养护工程DL-4标	1743.32	643.08		643.08			643.08			643.08		
	2014年榆靖公路养护工程DL-2标	658.92	616.40		616.40			616.40			616.40		
	2014年西潼项目		180.87		180.87			180.87			180.87		
	尾留产值	292562.57	327471.56		3763.29			48.50			138.10		
二、集团公司合作项目		88823.74	85966.68	11987.00	15592.23	130.08%		3145.97					96.78%
1	延延高速公路路基LI-1标	9736.00	7402.06	7000.00	7402.06	105.74%		2459.10					76.03%
2	省道303线二级公路长米段土建工程	3733.00	4180.00	935.00	934.63	99.96%							111.97%
3	梅大高速公路土建工程4标段	28748.45	27389.49	3232.00	4921.16	152.26%							95.27%
4	粤湘高速博深段第8标段	24874.15	24445.19	820.00	820.11	100.01%							98.28%
5	大广公路龙杨段路基路面工程A2标	13444.10	14035.66		827.40								104.40%
6	郑洛高速公路改扩建路面第6标段	8288.04	8514.28		686.87			686.87					102.73%
试验检测中心				360.00	305.44	84.84%	90.00	87.62	97.36%	90.00	87.62	97.36%	
兴通监理公司				3200.00	1898.33	59.32%	1000.00	1006.26	100.63%	1000.00	1006.26	100.63%	

2014年重点项目生产计划完成情况图表

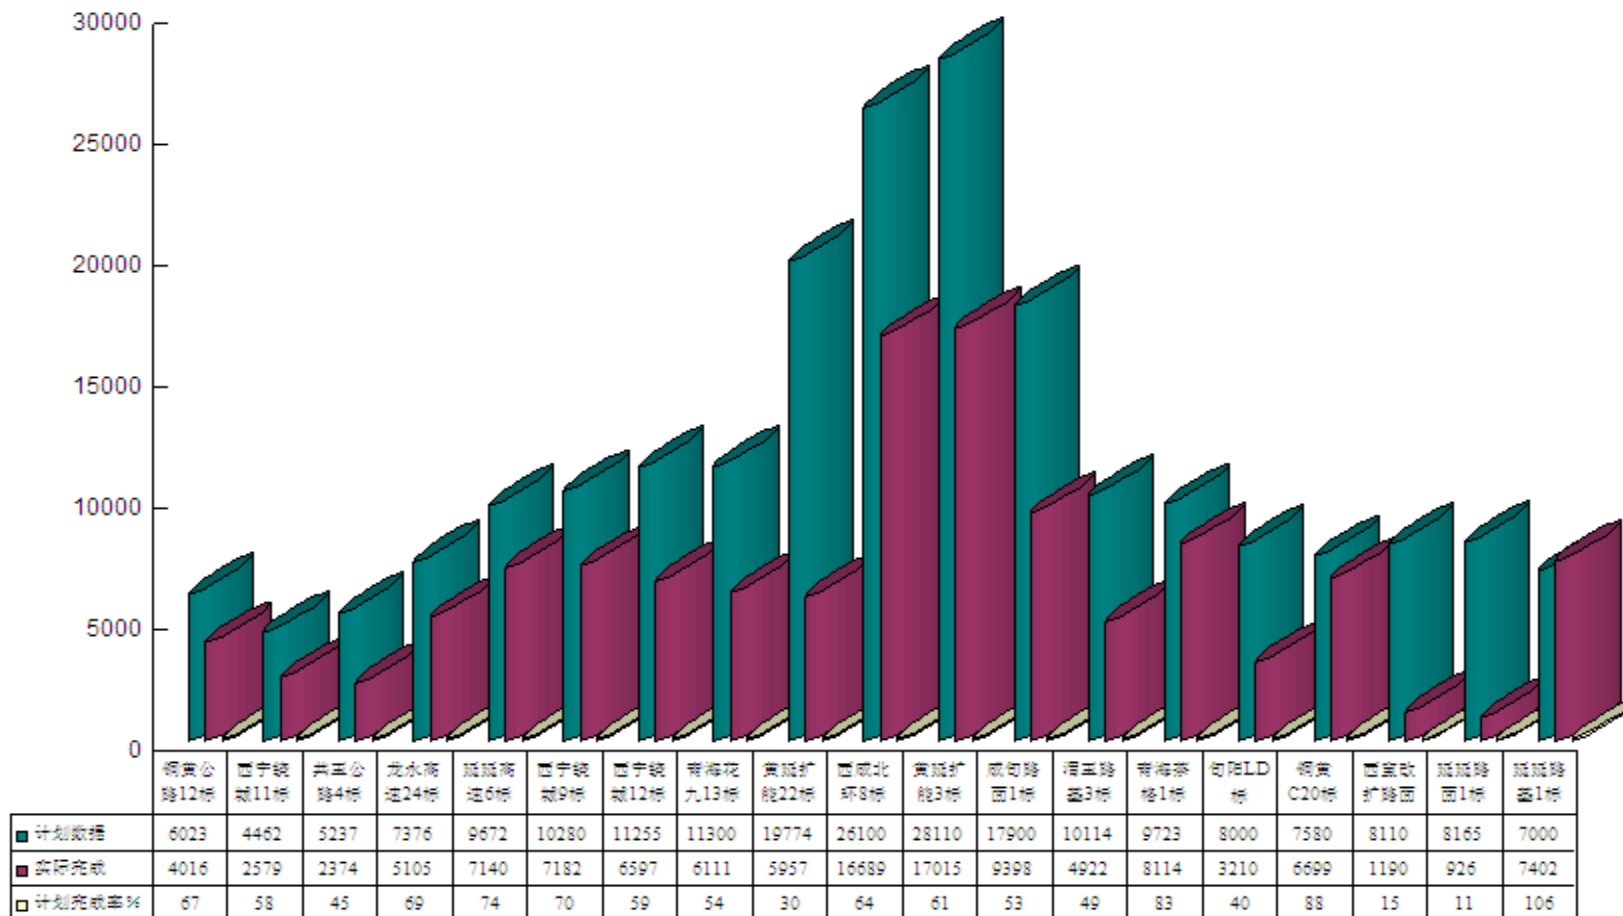

■ 计划数据 ■ 实际完成 □ 计划完成率%

2014年重点项目合同履行统计图表

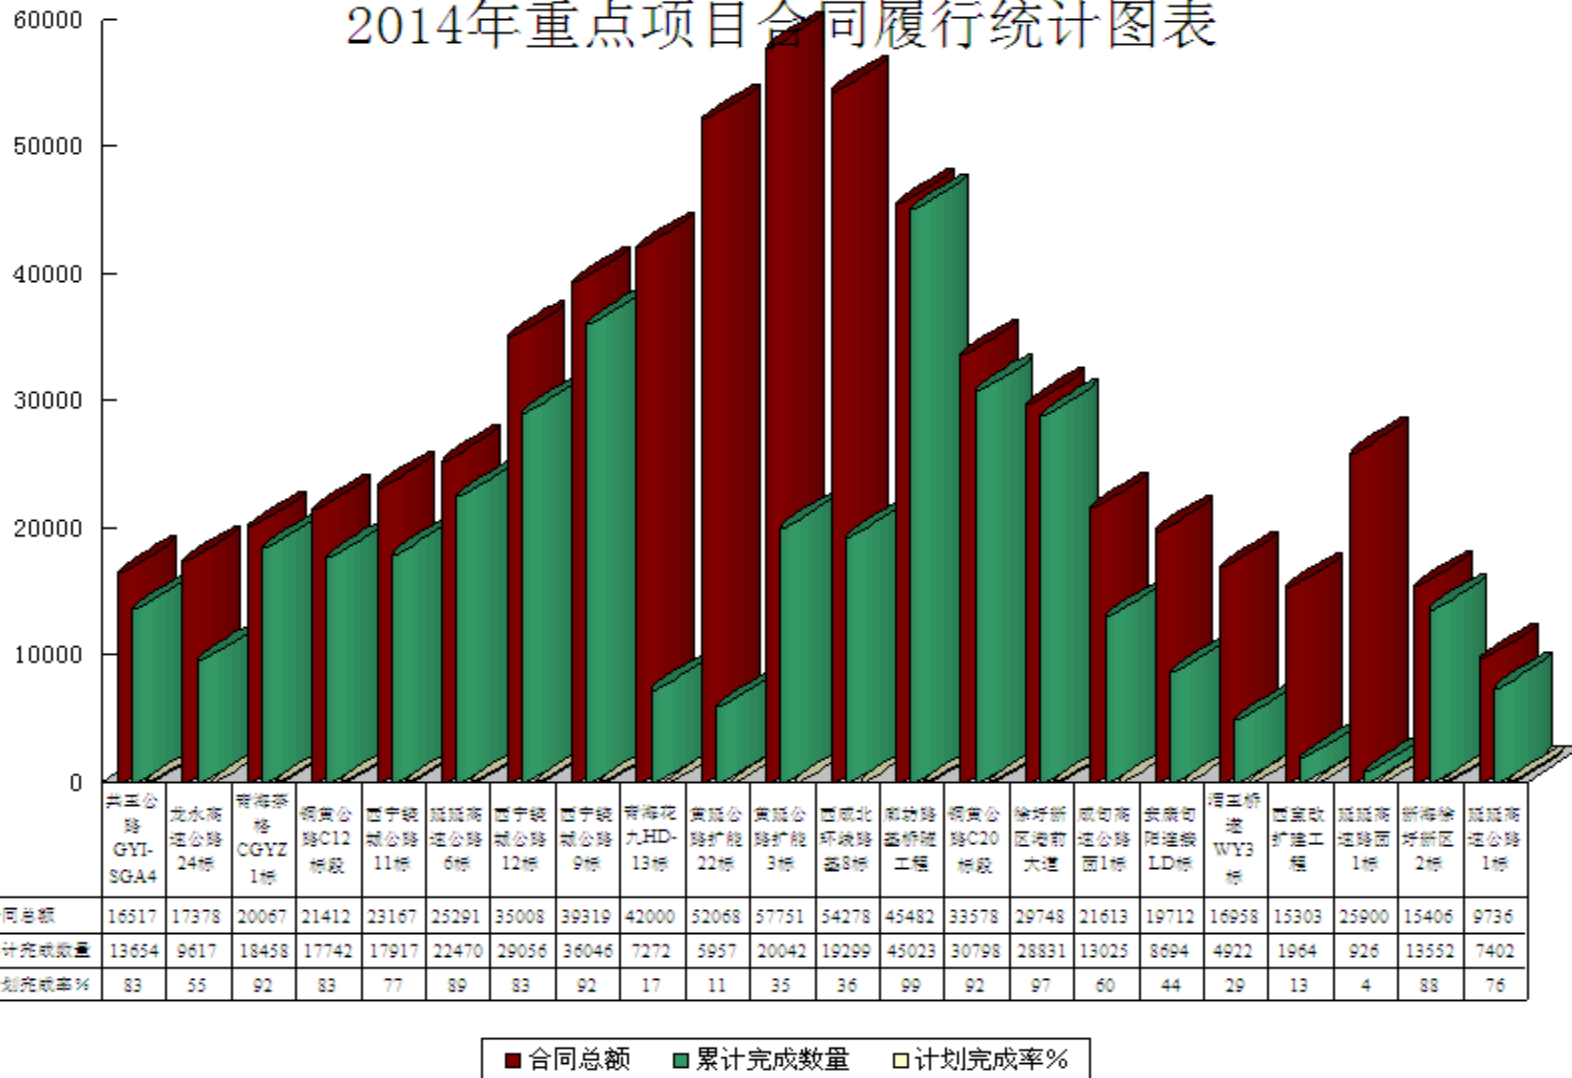

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣
