


# 陕西路桥统计简报

(第7期总第296期)

主办：陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一四年八月

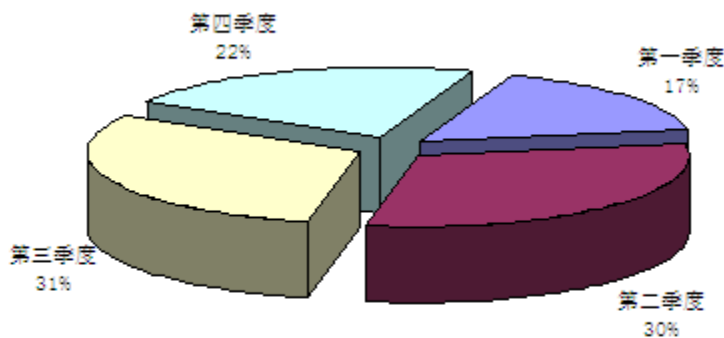

施工计划完成动态图

二〇一四年九月一日

## 2014年8月份计划执行情况分析

### 一、主要经济指标

截止本月底累计完成产值 233609.44 万元，为年计划的 77.12%，全员劳动生产率 432610 元/人，分别高于去年同期水平 48.09%、28.89%。本月完成产值 34877.45 万元。累计新承接总额 15.62 亿元，为年计划的 44.63%（承接项目以中标通知书为准）。

试验检测中心完成服务产值 305.44 万元，为年计划的 84.84%；兴通监理公司完成服务产值 1898.33 万元，为年计划的 59.32%，新承接任务 2416.96 万元，为年计划 86.32%。

### 二、主要工程形象进度（累计完成情况）

#### 青海省茶格至格尔木公路工程 CGYZ-1 标段

累计完成预制：20m 箱梁 1710/1710 片、30m 箱梁 131/131 片、16m 空心板 1772/1772 片、20m 空心板 32/32 片、8m 矩形板 1604/1604 片、涵洞盖板 16971/16971 片；分别为合同的 100%、100%、100%、100%、100%、100%。

#### 青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 1621/1469 片、矩形板 618/368 片、空心板 391/374 片，分别为合同量的 110%、168%、104%。矩形板安装 618/368 片、梁安装 1621/1469 片、空心板安装 391/374，为合同量的 110%、168%、104%。桥面铺装完成合同量的 19%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km<sup>3</sup>，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 16/16 根、盖梁 12/12 个、30m 箱梁预制 50/50 片，为合同量的 100%、100%、100%、100%。隧道开挖 3204/3230m、支护 3200/3230m、衬砌 3158/3260m，分别为合同量 99%、99%、97%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 694/567 km<sup>3</sup>、钻孔桩 345/345 根、墩柱 258/258 根、盖梁 63/61 个、梁预制 215/205 片，箱梁安装 215/205 片，现浇箱梁 13 联，悬臂浇筑 84/104 块，为合同量 122%、100%、100%、103%、105%、105%、93%、81%。

### 青海西宁南绕城公路土建工程 12 标

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 195km、土方 1262 km<sup>3</sup>，分别为合同量的 100%、87%、80%。钻孔桩 756/756 根、墩柱 620/620 根、盖梁 252/268 个、梁板 1250/1250 片、梁板安装 1085/1250 片、现浇箱梁 43/55 孔，为合同量 100%、100%、98%、100%、87%、78%。桥面系完成合同量的 41%。

### 青海省花石峡至久治公路 HD13 标段

累计完成借土填方 206/542 km<sup>3</sup>，为合同量的 38%。隧道全断面开挖 650/3790m、初期支护 650/3790m、二衬 390/3790m，为合同量 18%、18%、10%。

### 连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标

累计完成土方 150 km<sup>3</sup>，为合同量的 105%；水泥搅拌桩 195km，为合同量的 78%；底基层 520/588 km<sup>2</sup>、面层 245/295 km<sup>2</sup>；分别为合同量的 91%、83%；桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、盖梁 42/42 个、空心板 255/255 片、箱梁 64/64 片，分别为合同量 100%、100%、100%、100%、100%。

### 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标

累计完成借土填方 1646/1580 km<sup>3</sup>，为合同量的 104%。钻孔桩 714/714 根、墩柱 470/470 根、盖梁 114/114 个、箱梁预制 508/508 片、安装 508/508 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%。

### 黄延高速公路扩能工程 LJ-3 标

累计完成挖方 197/122 km<sup>3</sup>，为合同量的 161%，填方 165/338 km<sup>3</sup>，为合同量的 49%；钻孔桩 99/99 根、墩柱 72/72 根、盖梁 31/31 个、箱梁预制 142/185 片、箱梁安装 113/185 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、77%、61%；全断面掘进 2200/4197m、支护 2200/4197m、衬砌 1756/4328m，分别为合同量的 52%、52%、40%。

### 铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个，梁板预制 74/74 片，为合同量的 100%、100%、100%、100%；全断面掘进 3863/3863m，仰拱填充 3924/3924m，二衬 3616/3924m，分别为合同量的 100%、100%、92%。

### 铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 536/536 根、盖梁 272/272 个、预制梁

1380/1380片、梁安装1380/1380片，为合同量的100%、100%、100%、100%、100%。桥面系完成合同的95%、护栏完成合同量的98%

### 铜黄高速公路路面 TH-03 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 153/548km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 81/541 km<sup>2</sup>、粗粒式沥青混合料 ATB-30 下面层 6/489 km<sup>2</sup>、中粒式 SBS 改性沥青混凝土 AC-20 中面层 12/922 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 28%、3%、1.2%、1.4%。

### 延（安）至延（川）高速公路路面 LM-1 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 126/520km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 126/606km<sup>2</sup>、粗粒式密级配沥青碎石 27/410 km<sup>2</sup>、中粒式改性沥青 730/969 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 24%、21%、6%。

### 延（安）至延（川）高速公路路基 LJ-1 标

累计完成土方 537/580 km<sup>3</sup>、桩基 196/196 根、墩柱 115/115 根、盖梁 91/91 个、空心板预制 284/284 片、空心板安装 284/284 片、箱梁预制 247/247 片、箱梁安装 247/247 片，分别为合同量的 93%、100%、100%、100%、100%、100%、100%、100%。

### 西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 176/377km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 182/527 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 47%、34%。粗粒式密级配沥青混凝土 148/418km<sup>2</sup>、中粒式沥青混凝土 105/726km<sup>2</sup>、改性沥青混凝土 40/726km<sup>2</sup>，为合同量的 35%、14%、5%。

### 咸旬高速公路路面 LM-1 标

累计完成石灰粉煤灰稳定碎石底基层 690/951km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 805/954 km<sup>2</sup>、粗粒式密级配沥青碎石 606/672 km<sup>2</sup>、中粒式改性沥青 730/969 km<sup>2</sup>、细粒式沥青 280/969 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 70%、80%、90%、68%、29%。

### 西咸北环线路基 LJ-8 标

累计完成借土土方 316/1025 km<sup>3</sup>、强夯 463/508 km<sup>2</sup>、灰土、碎石桩 869/1215km，分别为合同量的 31%、91%、71%；桥梁桩基 719/813 根、墩柱 379/466 根、盖梁 89/240 个、梁板预制 617/859 片、安装 145/859 片，分别为合同量的 88%、81%、37%、71%、17%。

### 十天高速公路旬阳 LD 连接线 AD-LD 标

累计完成桥梁基础桩 318/326 根、墩柱 233/284 根、盖梁 131/159 个、箱梁预制 415/483 片、箱梁安装 348/483 片、桥面铺装 320/4701m，分别为合同量的 97%、94%、82%、85%、72%、7%。隧道全面开挖 48/1243m、支护 48/1244m、衬砌 42/1245m，为合同量的 3.8%、3.8%、3.4%。

### 渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标

累计完成挖方 941/996 km<sup>3</sup>，为合同量的 94%。桥梁桩基 381/416 根、墩柱 165/260 根、盖梁 80/169 个、箱梁预制 322/532 片、安装 138/532 片，分别为合同总量 92%、63%、47%、61%、26%。

### 河南省道 250 线灵宝至朱阳段改建工程 S250SG-2 标

累计完成桥梁桩基 42/42 根、立柱 5/10 根、薄壁墩 6/6 根、盖梁 8/15 个，分别为合同量的 100%、50%、100%、66%；隧道开挖 606/606m、初期支护 455/606m、二衬 400/600m，分别为合同总量 100%、75%、66%。

### 湖南龙永高速公路 24 标

累计完成路基挖填土石方 154/331 km<sup>3</sup>，为合同量的 46%。隧道开挖 3058/4488m、初期支护 3058/4488m、二次衬砌 2583/4488m，分别为合同总量 68%、68%、58%。

## 三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成产值 34877.45 万元，为计划的 101.57%，其中：

- 1 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 110.97%；
- 2 湖南龙永公路 24 标完成计划的 109.83%；
- 3 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 105.29%；
- 4 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 104.64%；
- 5 铜黄公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 104.64%；
- 6 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标完成计划的 104.10%；
- 7 青海共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 103.89%；
- 8 青海茶格公路 CGYZ-1 标完成计划的 102.94%；
- 9 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标完成计划的 102.93%；
- 10 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 100.45%；
- 11 青海花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 100.23%；
- 12 渭玉公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 97.61%；

- 13 西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标完成计划的 99.26
- 14 延延路基桥涵工程 LJ-6 标完成计划的 92.29%;
- 15 咸旬公路路面 LM-1 标完成计划的 71.44%;
- 16 十天公路旬阳连接 AD-LD 标完成计划的 63.33%;
- 17 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 66.79%。

#### 四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 54.98%;
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 86.10%;
- 3 第三工程公司完成计划的 86.44%;
- 4 第四工程公司完成计划的 97.24%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 53.73%;
- 6 试验检测中心完成计划的 84.84%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 59.32%。

#### 五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 铜黄公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 128.38%;
- 2 青海茶格公路 CGYZ-1 标完成计划的 108.54%;
- 3 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 102.58%;
- 4 湖南龙永公路 24 标完成计划的 91.69%;
- 5 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 91.10%;
- 6 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 84.91%;
- 7 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 89.41%;
- 8 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 84.36%;
- 9 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 81.07%;
- 10 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标段完成计划的 80.59%;
- 11 咸旬公路路面 LM-1 标完成计划的 84.21%;
- 12 青海共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 84.21%;
- 13 渭玉公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 72.16%;
- 14 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标段完成计划的 56.44%。

#### 六、简要分析与建议:

##### 1.分析:

8 月总体计划基本完成, 重点项目在建设单位控制目标、节点计划检查中取得比较好成绩。重点项目 22 个, 省外重点项目有 7 个, 除青海西宁南绕城 9 标未完成计划外, 其余 6 个项目基本完成任务。

省内重点项目 15 个，除西咸北环线 1 标、十天连接线旬阳连接线、延延路面 1 标、咸旬公路路面 LM-1 标计划执行不理想，其余项重点项目计划完成比较好。

虽然项目总体进度计划比较理想，但是，进度计划完成程度不一样，计划完成低于 60% 的项目就有 4 个，分别为：黄延公路改扩能 22 标、十天高速公路旬阳连接线 LD 标、西宝改扩建路面 B-M07 标、延延高速公路路面 LM-1 标等项目

## 2.存在问题：

本月计划执行虽然取得了成绩，但是存在不足。①路面施工进度缓慢。②新开工项目施工进度缓慢。③个别项目原方案变更设计未定等原因。④计划管理不到位。

## 3.建议与措施：

各基层加大项目计划管控力度，提高计划执行力。节点目标要细化到人，责任到位；加强施工现场管控，在保证施工安全的前提下，优化施工方案，极大地提高生产效率，确保各项目的控制目标实施；加强各方沟通与联系，换位思考，提前解决不利施工的环境因素。抓紧做好计量签证工作，确保资金供应。特别今年要交验的项目，倒排工期，同时做好质检资料完善工作，确保按时交验。

## 七、其他情况说明

- 1 统计资料以项目部提供的为准，统计产值统计截止日期为 8 月 30 日。
- 2 集团公司各部门采用统计数据，请依此数据为准。

2014 年 8 月 31 日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

## 集团公司 2014 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
<b>陕西路桥集团有限公司合计</b>		<b>1082957.08</b>	<b>839712.34</b>	<b>302905.00</b>	<b>233609.44</b>	<b>77.12%</b>	<b>96604.00</b>	<b>70276.35</b>	<b>72.75%</b>	<b>34359.00</b>	<b>34877.45</b>	<b>101.51%</b>	<b>77.54%</b>
在建工程项目小计		776618.38	503318.15	302905.00	217127.82	71.68%	96604.00	66741.62	69.09%	34359.00	32711.02	95.20%	64.81%
尾留工程项目小计		306338.70	336394.20		16481.62			3534.73			2166.43		109.81%
<b>陕西路桥第一工程有限公司</b>		<b>206148.08</b>	<b>205521.11</b>	<b>54216.00</b>	<b>29807.08</b>	<b>54.98%</b>	<b>8514.00</b>	<b>6606.56</b>	<b>77.60%</b>	<b>2369.00</b>	<b>2532.37</b>	<b>106.90%</b>	<b>99.70%</b>
1	京台公路廊坊路基桥隧工程 1 标	45482.00	45369.10	2294.00	2181.02	95.08%	547.00	345.74	63.21%	90.00	94.44	104.94%	99.75%
2	铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标	21412.00	19904.20	6023.00	6178.13	102.58%	2031.00	2162.43	106.47%	910.00	958.10	105.29%	92.96%
3	青海茶卡至格尔木预制 CGY1 标	20067.00	20897.33	9723.00	10553.07	108.54%	2929.00	2439.54	83.29%	345.00	355.13	102.94%	104.14%
4	龙永高速公路 24 标	17378.41	11276.12	7376.00	6763.41	91.69%	2607.00	1658.85	63.63%	1024.00	1124.69	109.83%	64.89%
	待定计划			26000.00									
	以子公司名义承揽项目			2800.00			400.00						
	尾留项目产值	101808.67	108074.35		4131.44								
5	榆商高速公路神谷段 LJ-11 标	28520.80	30876.74		2355.95								108.26%
6	十堰至天水高速公路汉中段 H-C21 标	34604.46	37751.67		1645.18								109.09%
7	十天公路陕西段高速公路 A-C10 标	38683.41	39445.93		130.31								101.97%
<b>陕西路桥第二工程有限公司</b>		<b>170941.65</b>	<b>86013.39</b>	<b>58250.00</b>	<b>50152.44</b>	<b>86.10%</b>	<b>22791.00</b>	<b>18167.92</b>	<b>79.72%</b>	<b>7865.00</b>	<b>8574.62</b>	<b>109.02%</b>	<b>50.32%</b>
8	西宁南绕城公路土建工程 11 标	19800.00	19402.57	4462.00	4065.01	91.10%	1850.00	1485.67	80.31%	687.00	690.10	100.45%	97.99%
9	延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标	25291.45	24451.49	9672.00	9121.61	94.31%	3657.00	1981.37	54.18%	525.00	484.45	92.28%	96.68%
10	佛坪陈三库周交通复建工程 3 标	2636.77	2638.25	1005.00	1992.34	198.24%	638.00	367.47	57.60%	318.00	166.37	52.32%	100.06%
11	青海花九 HD-13 标	42000.00	10267.20	11300.00	9106.42	80.59%	4526.00	2995.56	66.19%	1509.00	1512.47	100.23%	24.45%
12	榆林收费站北迁工程 SJ-TJ-2 标	3153.58	1617.13	1804.00	1617.13	89.64%	1080.00	937.09	86.77%	667.00	690.98	103.59%	51.28%
13	S250 线灵朱段改建工程 SG-2 标	6494.40	4796.51	4202.00	4727.84	112.51%	2167.00	1803.71	83.24%	980.00	1034.25	105.54%	73.86%
14	零马一级公路改建工程 I 标	10648.14	3813.75	5031.00	3813.75	75.81%	1972.00	824.93	41.83%	644.00	672.54	104.43%	35.82%
15	黄延公路改扩能路基桥隧 22 标	52067.98	11161.43	19774.00	11161.43	56.44%	6901.00	5204.92	75.42%	2535.00	2609.21	102.93%	21.44%
16	省级高速榆商线神木至府谷高速公路声屏障工程施工 SFSPZ 标	540.01	518.84		518.84			518.84					96.08%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣



## 集团公司2014年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
17	陕西省交通建设集团公司2014年公路养护工程JT-6合同段	1295.71	1101.46		1101.46			1101.46			343.74		85.01%
18	陕西省交通建设集团公司2014年公路养护工程交安设施完善工程类JT-3	442.90	77.80		77.80			77.80			28.18		17.57%
	以子公司名义承揽项目			1000.00									#DIV/0!
	尾留项目产值	6570.71	6166.95		2848.81			869.11			342.34		
19	西安绕城新筑收费站宿办楼工程	2000.00	2107.33		1364.63			501.40			342.34	#DIV/0!	105.37%
20	福银公路咸阳东收费站宿办楼	2580.71	2066.62		1484.18			367.71					80.08%
<b>第三工程公司</b>		<b>152695.83</b>	<b>117476.67</b>	<b>54882.00</b>	<b>47437.36</b>	<b>86.44%</b>	<b>16808.00</b>	<b>13351.11</b>	<b>79.43%</b>	<b>7177.00</b>	<b>7320.81</b>	<b>102.00%</b>	<b>76.94%</b>
21	青海省共和至玉树公路GYI-SGA4标	16516.92	15689.68	5237.00	4410.14	84.21%	2244.00	2035.91	90.73%	1036.00	1076.30	103.89%	94.99%
22	西宁南绕城公路土建工程9标	39318.64	37197.86	10280.00	8333.75	81.07%	3143.00	1151.87	36.65%	692.00	462.17	66.79%	94.61%
23	西宁南绕城公路土建工程12标	35007.86	32522.05	11255.00	10062.89	89.41%	4894.00	3466.19	70.83%	1599.00	1774.46	110.97%	92.90%
24	黄延公路扩能路基桥隧工程3标	57750.88	26738.67	28110.00	23712.22	84.36%	6527.00	6697.13	102.61%	3850.00	4007.88	104.10%	46.30%
	尾留项目产值	4101.53	5328.42		918.36								
25	神渭管道输煤项目六(1)标段	2928.53	3337.94		347.58								113.98%
26	咸阳东收费站改扩建工程	1173.00	1990.48		570.78								169.69%
<b>第四工程公司</b>		<b>162578.10</b>	<b>115299.75</b>	<b>55010.00</b>	<b>53492.97</b>	<b>97.24%</b>	<b>19600.00</b>	<b>17720.89</b>	<b>90.41%</b>	<b>7920.00</b>	<b>9692.22</b>	<b>122.38%</b>	<b>70.92%</b>
27	西咸新区北环线路基LJ-1标	3644.20	2857.58	3216.00	2442.03	75.93%	824.00	533.39	64.73%	371.00	202.86	54.68%	78.41%
28	西咸新区北环线路基LJ-8标	54278.38	26152.85	26100.00	23542.03	90.20%	8548.00	6853.42	80.18%	3230.00	3350.77	103.74%	48.18%
29	渭玉高速公路路基桥隧工程WY-03标	16958.00	8587.86	10114.00	8587.86	84.91%	4671.00	3665.40	78.47%	1960.00	1913.09	97.61%	50.64%
30	十天高速公路旬阳连接AD-LD标	19712.26	10218.22	8000.00	4734.41	59.18%	2772.00	1524.21	54.99%	859.00	544.03	63.33%	51.84%
31	西铜高速公路TH-20标	33577.74	33830.21	7580.00	9731.27	128.38%	2785.00	3032.58	108.89%	1500.00	1569.58	104.64%	100.75%
32	店塔立交N1标	9855.16											

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

## 集团公司2014年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
33	西延分公司养护中修工程	189.38	189.38		189.38								100.00%
34	马鸣路排水工程		365.57		365.57			365.57			365.57		
	<b>尾留项目产值</b>	<b>24362.98</b>	<b>33098.08</b>		<b>3900.42</b>			<b>1746.32</b>			<b>1746.32</b>		<b>135.85%</b>
35	蓝田至周至哑柏公路 A6 标	3604.00	3700.53		513.11								102.68%
36	西铜公路陵前立交庄里连接线立交桥	20181.48	28820.88		3322.37			1746.32			1746.32		142.81%
37	西临高速公路灞桥收费站 ETC 建设配套工程	577.50	576.67		64.94								99.86%
	<b>陕西路桥路面工程有限公司</b>	<b>301769.68</b>	<b>229434.76</b>	<b>65000.00</b>	<b>34923.59</b>	<b>53.73%</b>	<b>27801.00</b>	<b>14429.86</b>	<b>51.90%</b>	<b>9028.00</b>	<b>6757.43</b>	<b>74.85%</b>	<b>76.03%</b>
38	西宝改扩建工程 B-M07 标	15302.80	5238.16	8110.00	4464.74	55.05%	4145.00	3274.39	79.00%	1581.00	1569.38	99.26%	34.23%
39	延延高速公路路基 LM-1 标	25900.00	2859.53	8165.00	2859.53	35.02%	4200.00	1933.07	46.03%	1793.00	1298.13	72.40%	11.04%
40	新海至徐圩新区 XX-2 标	15406.18	13551.62		2662.73								87.96%
41	机场线小修 2012-2015 年度小修养护	804.00	294.90		116.28			116.28	0.00				36.68%
42	咸旬高速公路路面 LM-1 标	21612.73	16542.82	17900.00	12916.40	72.16%	7528.00	3518.32	46.74%	2514.00	1442.13	57.36%	76.54%
	<b>尾留特定计划</b>	<b>222743.97</b>	<b>190947.73</b>	<b>30825.00</b>	<b>11903.92</b>	<b>38.62%</b>	<b>11928.00</b>	<b>5587.80</b>	<b>46.85%</b>	<b>3140.00</b>	<b>2447.79</b>	<b>77.96%</b>	<b>85.73%</b>
43	2014 年榆靖公路养护工程 DL-2 标	658.92	647.61		647.61		66.00	31.21	47.28%				98.28%
44	安平高速公路路面 LM1 标						994.00						
	<b>以子公司名义承揽项目</b>	<b>52590.24</b>	<b>6573.72</b>		<b>6573.72</b>		<b>10868.00</b>	<b>4637.30</b>	<b>42.67%</b>	<b>3140.00</b>	<b>2370.02</b>	<b>75.48%</b>	<b>12.50%</b>
46	汉中嘉陵江大桥改建配套渡河工程	479.27	600.18		600.18			120.91					125.23%
47	2014 年靖王养护 DL-1 标	788.84	530.81		530.81		500.00	356.78	71.36%	118.00	118.95	100.80%	67.29%
48	2014 年吴靖公路养护工程 DL-4 标	1743.32	1363.71		1363.71		534.00	720.62	134.95%	160.00	164.07	102.54%	78.22%
49	铜黄公路何黄段路面工程施工 TH-3 标	20816.00	2317.48		2317.48		5494.00	2014.02	36.66%	1400.00	1112.13	79.44%	11.13%
50	新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标	28762.81	544.85		544.85		2840.00	389.14	13.70%	677.00	389.14	57.48%	1.89%
51	省道 102 线二级公路(II 期) V 标		1035.82		1035.82		700.00	1035.82	147.97%	585.00	585.74	100.13%	
52	2014 年西潼项目		180.87		180.87					200.00			
	其他项目						800.00						

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


## 集团公司2014年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
	尾留产值	169494.81	183726.40		4682.59			919.29			77.77		
53	神府高速公路路面第14标段	22386.36	26709.07		841.53			841.53				119.31%	
54	榆绥高速公路路面LM-2标段	27900.91	27837.84		423.09							99.77%	
55	十天高速公路安康东路面AD-M03标	23172.87	28083.47		-346.22							121.19%	
56	十天高速公路安康西路面M02标	29335.97	30705.39		-74.14							104.67%	
57	连云港徐圩新区港前大道工程建设	29047.27	28831.34		2216.37							99.26%	
58	连云港其他项目				-555.36								
59	徐圩大道快车道扩宽及慢车道新建项目	3039.09	3328.53		289.44							109.52%	
60	西长2013年公路养护工程DL-4标	1168.00	73.53		48.49							6.30%	
61	西镇2013年公路养护工程DL-6标	93.93	98.93									105.33%	
62	蓝商2013年公路养护工程DL-8标	753.97	884.96		130.99							117.37%	
63	2012年西禹公路路面养护工程XYLM	2289.50	2347.39		77.77			77.77			77.77	102.53%	
64	宝汉高速公路LM1标	26999.89	27163.67		1379.40							100.61%	
65	以子公司名义承揽项目尾留	3216.40	6022.96		251.22								
66	西潼改扩建工程		1055.55		246.94								
67	西长拥抱养护工程	90.65	97.76		7.11							107.84%	
68	渭蒲高速修补工程		486.01		-2.83								
<b>二、集团公司合作项目</b>		<b>88823.74</b>	<b>85966.68</b>	<b>11987.00</b>	<b>15592.23</b>	<b>130.08%</b>						<b>96.78%</b>	
69	延延高速公路路基LI-1标	9736.00	7402.06	7000.00	7402.06	105.74%						76.03%	
70	甘肃省道303线二级公路土建工程	3733.00	4180.00	935.00	934.63	99.96%						111.97%	
71	梅大高速公路土建工程4标段	28748.45	27389.49	3232.00	4921.16	152.26%						95.27%	
72	粤湘高速博深段第8标段	24874.15	24445.19	820.00	820.11	100.01%						98.28%	
73	大广公路龙杨段路基路面工程A2标	13444.10	14035.66		827.40							104.40%	
74	郑洛高速公路改扩建路面第6标段	8288.04	8514.28		686.87							102.73%	
<b>试验检测中心</b>				<b>360.00</b>	<b>305.44</b>	<b>84.84%</b>	<b>90.00</b>						
<b>兴通监理公司</b>				<b>3200.00</b>	<b>1898.33</b>	<b>59.32%</b>	<b>1000.00</b>						

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

### 2014年重点项目生产计划完成情况图表

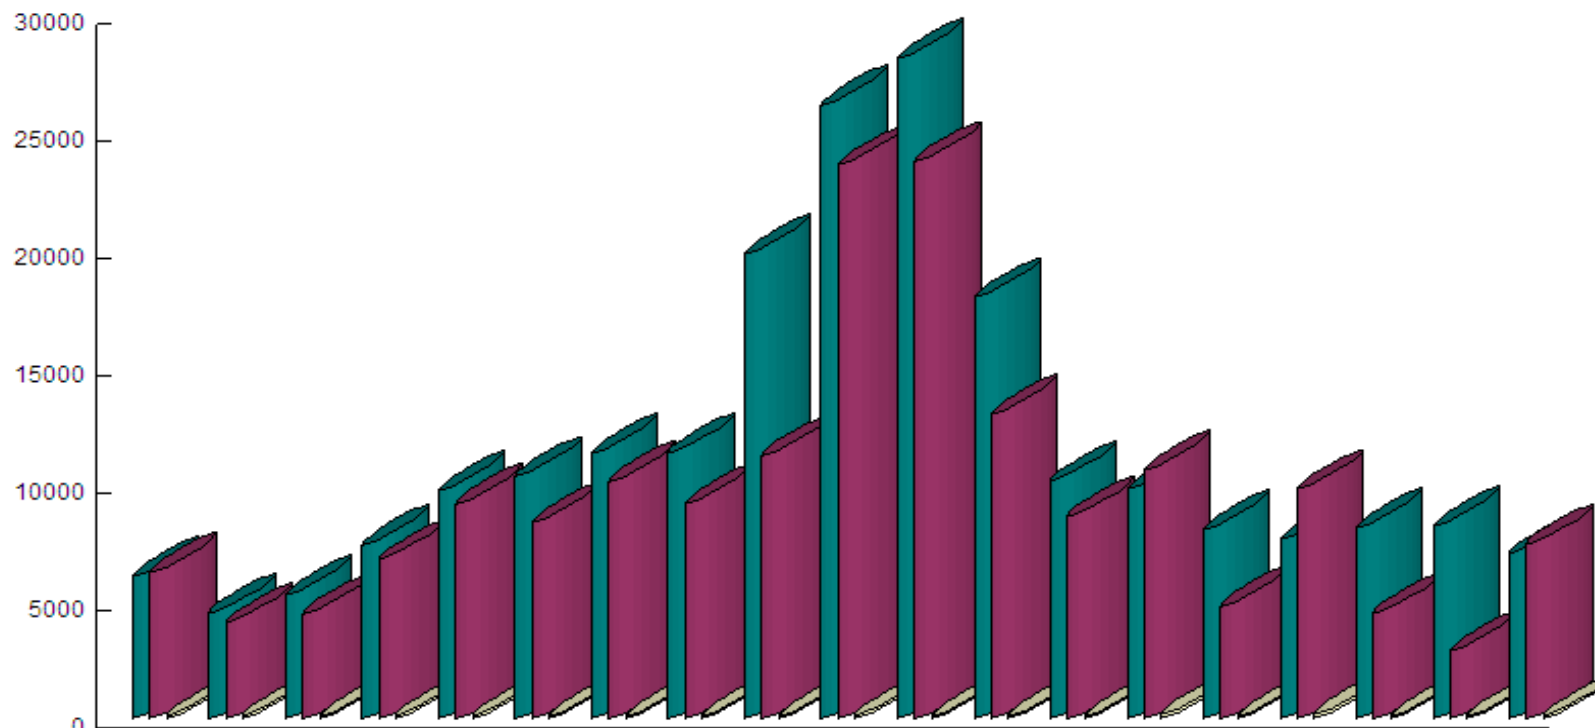


	铜黄公路12标	西宁绕城11标	共三公路4标	龙水高速24标	咸阳高速6标	西宁绕城9标	西宁绕城12标	青海花九13标	黄城扩能22标	西咸北环8标	黄城扩能3标	咸旬路面1标	泾三路涵3标	青海茶路1标	旬阳LD标	铜黄C20标	西宝改扩建1标	咸阳路面1标	咸阳路面1标
计划数据	6023	4462	5237	7376	9672	10280	11255	11300	19774	26100	28110	17900	10114	9723	8000	7580	8110	8165	7000
实际完成	6178	4065	4410	6763	9122	8334	10063	9106	11161	23542	23712	12916	8588	10553	4734	9731	4465	2860	7402
计划完成率%	103	91	84	92	94	81	89	81	56	90	84	72	85	109	59	128	55	35	106

■ 计划数据 ■ 实际完成 □ 计划完成率%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

### 2014年重点项目合同履行统计图表

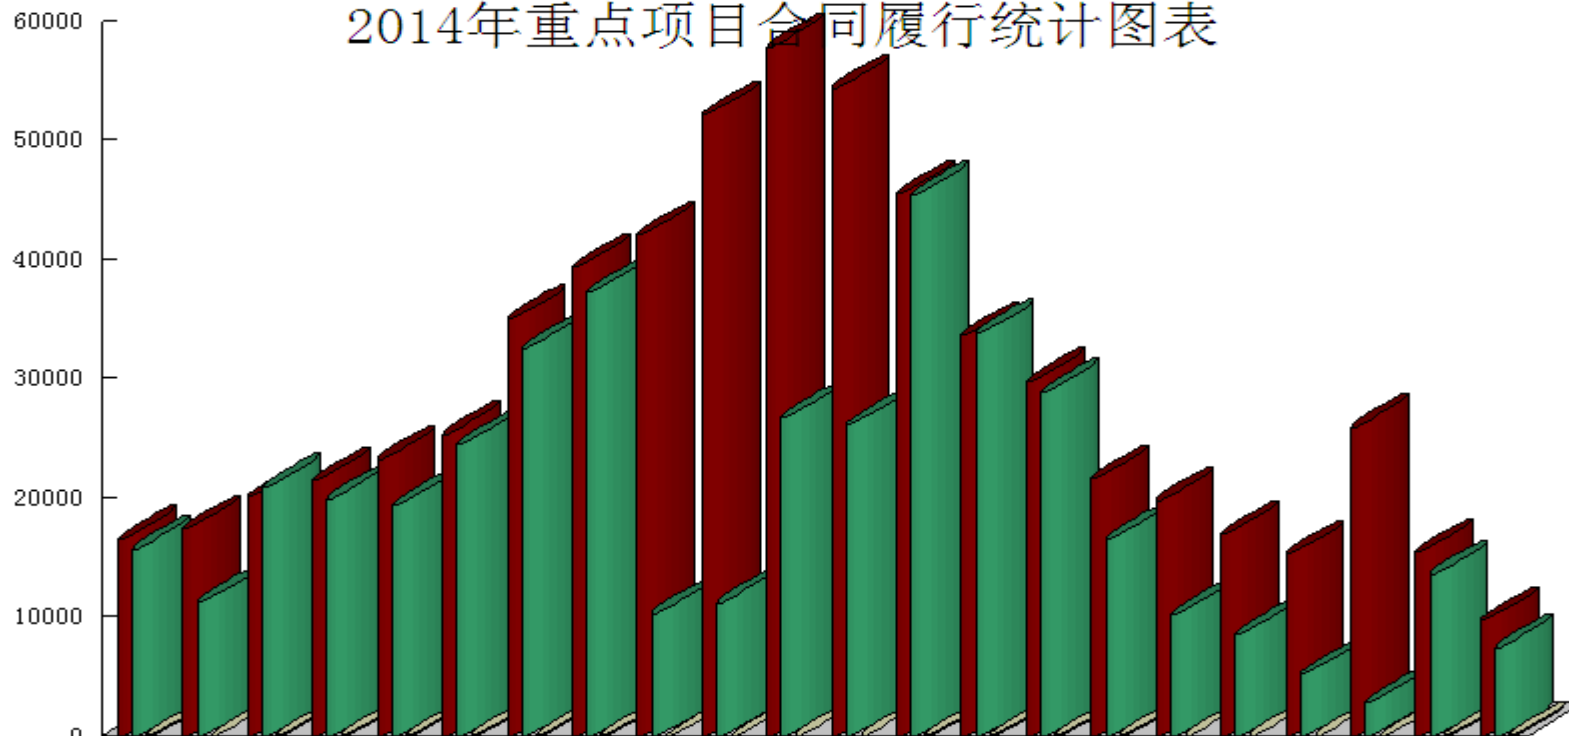

	共三公路 GYL- SGA4	龙水高 速公路 24标	青海茶 格 CGYZ 1标	铜黄公 路C12 标段	西守公 路11标	延延高 速公路 6标	西守公 路12标	西守公 路9标	青海花 九HD- 13标	黄延公 路扩能 22标	黄延公 路扩能 3标	西延北 环线第 8标	南坊路 葛桥隧 工程	铜黄公 路C20 标段	徐坪新 区港前 大道	咸旬高 速公路 1标	兴荣司 阳道线 LD标	渭三桥 道 WY3 标	富家改 扩建工 程	延延高 速路面 1标	新海堡 新区 2标	延延高 速公路 1标
■ 合同总额	16517	17378	20067	21412	23167	25291	35008	39319	42000	52068	57751	54278	45482	33578	29748	21613	19712	16958	15303	25900	15406	9736
■ 累计完成数量	15690	11276	20897	19904	19403	24451	32522	37198	10267	11161	26739	26153	45369	33830	28831	16543	10218	8588	5238	2860	13552	7402
□ 计划完成率%	95	65	104	93	84	97	93	95	24	21	46	48	100	101	97	77	52	51	34	11	88	76

■ 合同总额    ■ 累计完成数量    □ 计划完成率%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣
