


陕西路桥统计简报

(第9期总第309期)

主办：陕西路桥集团有限公司工程管理部

二〇一五年十月

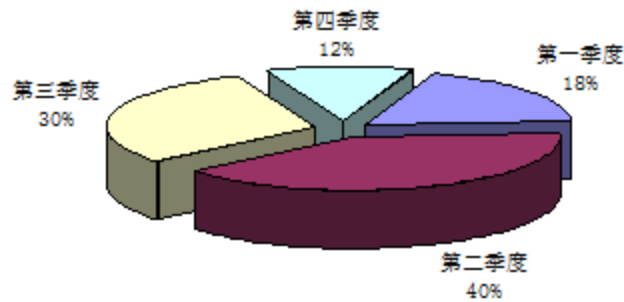

施工计划完成动态图

二〇一五年十一月二日

2015年10月份计划执行情况分析

一、主要经济指标

截止本月底累计完成产值 300861.05 万元，为年计划的 91.70%，全员劳动生产率 567662 元/人，分别高于去年同期水平 3.85%、1.98%，第四季度完成季度的计划的 27.58%，本月完成产值 10534.59 万元。

累计新承接项目 22.56 亿元，为年计划的 75.20%。

试验检测中心完成服务产值 287.73 万元，为年计划的 71.93%；兴通监理公司完成服务费用 4980.96 万元，为年计划的 146.50%，新承接任务 2515.69 万元，为年计划 86.75%。（季度报表）

二、主要工程形象进度（累计完成情况）

青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 694/567 km³、钻孔桩 345/345 根、墩柱 258/258 根、盖梁 63/63 个、梁预制 215/215 片，箱梁安装 215/215 片，现浇箱梁 14 联，悬臂浇筑 104/104 块，为合同量 122%、100%、100%、100%、100%、100%、100%、100%。

青海西宁南绕城公路土建工程 12 标

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 195km、土方 1317 km³，分别为合同量的 100%、87%、87%。钻孔桩 756/756 根、墩柱 620/620 根、盖梁 263/268 个、梁板 1250/1250 片、梁板安装 1240/1250 片、现浇箱梁 55/55 孔，为合同量 100%、100%、98%、100%、99%、100%。桥面系完成合同量的 100%。

青海省花石峡至久治公路 HD13 标段

累计完成借土填方 390/542 km³，为合同量的 72%。隧道全断面开挖 1765/3790m、初期支护 1765/3790m、二衬 1463/3790m，为合同量 45.56%、46.56%、38.60%。

黄延高速公路扩能工程 LJ-3 标

累计完成挖方 197/122 km³，为合同量的 161%，填方 271/338 km³，为合同量的 80%；水泥搅拌桩 420km。钻孔桩 99/99 根、墩柱 72/72 根、盖梁 31/31 个、箱梁预制 185/185 片、箱梁安装 185/185 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%；全断面掘进 4330/4330m、支护 4330/4330m、衬砌 4507/4507m，分别为合同量的 100%、100%、100%。

黄延高速公路扩能工程 LJ-22 标

累计完成挖方 779/585 km³，为合同量的 133%，抗滑桩 94/98 根，为合同量的 96%。隧道全断面掘进 4626/4570m、全断面支护衬砌 4664/4570m，隧道路面及附属 3836/4570m，分别为合同量的 101.23%、102.06%、83.94%。挡土墙完成合同量的 96.55%。

铜黄高速公路路面 TH-03 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 561/511km²、水泥稳定碎石基层 566/502 km²、粗粒式沥青混合料 ATB-30 下面层 444/489 km²、中粒式 SBS 改性沥青 AC-20 中面层 937/920 km²、细粒式沥青 AC-13 上面层 935/920 km²，分别为合同量的 110%、112%、91%、102%、101%。

延（安）至延（川）高速公路路面 LM-1 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 561/520km²、水泥稳定碎石基层 564/581km²、粗粒式沥青碎石 377/391 km²、中粒式改性沥青 849/901km²、细粒式沥青上面层 849/901 km²，分别为合同量的 108%、96%、96%、96%、94%。

黄（陵）至延（安）高速公路路面 LM-1 标

累计完成 4%水泥稳定碎石底基层 1044/1000km²、4.5%水泥稳定碎石基层 1084/1275km²、粗粒式沥青碎石 742/775 km²，中粒式沥青碎石 1296/1451 km²，细粒式沥青碎石 1083/1521 km²，分别为合同量的 104%、85%、96%、62%、30%。

西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 346/377km²、水泥稳定碎石基层 424/527

km²，分别为合同量的93%、80%。粗粒式密级配沥青混凝土395/418km²、中粒式沥青混凝土709/726km²、改性沥青混凝土704/726km²，为合同量的81%、98%、97%。

新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标

累计完成水泥稳定碎石底基层655/514km²、水泥稳定碎石基层688/634km²，分别为合同量的127%、108%。粗粒式密级配沥青468/477km²、中粒式改性沥青789/813km²、改性沥青混凝土754/814km²，为合同量的98%、97%、92%。

西咸北环线路基 LJ-8 标

累计完成借土填方852/852 km³、强夯508/508 km²、灰土、碎石桩1258/1258km，分别为合同量的100%、100%、100%；桥梁桩基813/813根、墩柱468/468根、盖梁242/242个、梁板预制896/896片、安装896/896片，分别为合同量的100%、100%、100%、100%、100%。箱梁现浇完成合同100%。

十天高速公路旬阳 LD 连接线 AD-LD 标

累计完成桥梁基础桩326/326根、墩柱284/284根、盖梁159/159个、箱梁预制483/483片、箱梁安装483/483片、桥面铺装2632/4701m，分别为合同量的100%、100%、100%、100%、100%、56%。隧道全面开挖834/1243m、支护834/1244m、衬砌663/1245m，为合同量的67.10%、67.10%、53.25%。

渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标

累计完成挖方1096/1096 km³，为合同量的100%。桥梁桩基408/408根、墩柱258/258根、盖梁169/169个、箱梁预制532/532片、安装532/532片，分别为合同总量100%、100%、100%、100%、100%。挡墙完成合同100%。

渭玉高速公路路面 WY-M01 标

累计完成水泥稳定碎石底基层703/753km²、水泥稳定碎石基层738/825 km²、下面层578/715 km²、中面层977/1059 km²、上面层349/1104 km²，分别为合同量的93%、89%、81%、92%、86%。

商丹一级公路路基桥隧改扩建工程

累计完成挖方 927/1042 km³、填方 293/369 km³，分别为合同量的 89%、78%。桥梁桩基 228/232 根、墩柱 165/165 根、盖梁 113/121 个、板梁预制 187/187 片、安装 166/187 片、箱梁预制 305/305 片、安装 250/305 片、涵洞 74/84 道，分别为合同总量 97%、100%、87%、100%、84%、100%、82%、88%。铣刨沥青路面 72/350km²、铣刨水泥稳定基层 58/187 km²、铣刨石灰稳定底基层 62/208 km²，分别为合同量的 20%、31%、30%。4%水泥稳定碎石 244/470km²、4.5%水泥稳定碎石 249/478km²，为合同量的 52%、52%。

河南省道 250 线灵宝至朱阳段改建工程 S250SG-2 标

累计完成桥梁桩基 42/42 根、立柱 10/10 根、薄壁墩 6/6 根、盖梁 15/15 个，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%；隧道开挖 606/606m、初期支护 606/606m、二衬 606/606m，分别为合同总量 100%、100%、100%。

湖南龙永高速公路 24 标

累计完成路基挖填土石方 245/331 km³，为合同量的 74%。隧道开挖 4488/4488m、初期支护 4488/4488m、二次衬砌 4372/4488m，分别为合同总量 100%、100%、97.42%。

三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成产值 10534.59 万元，为计划的 86.78%。其中：

- 1 黄延公路扩能路基桥隧工程 22 标完成计划的 111.58%；
- 2 新宝汉高速公路路面 2 标完成计划的 104.33%；
- 3 店塔至红碱淖一级公路 2 标完成计划的 104.33%；
- 4 铜旬高速公路路面 1 标完成计划的 101.98%；
- 5 西宁南绕公路房建工程 XN-FJ6 标完成计划的 101.91%；
- 6 江苏徐州 G310 秦洪桥改造 QL2 标完成计划的 101.34%；
- 7 西宝高速公路改扩建路面 7 标完成计划的 101.21%；
- 8 彬县幽风经河桥完成计划的 83.04%；
- 9 安平高速公路路面 1 标完成计划的 25.14%。

四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 71.58%;
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 98.58%;
- 3 第三工程公司完成计划的 85.47%;
- 4 第四工程公司完成计划的 86.23%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 97.87%;
- 6 试验检测中心完成计划的 71.93%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 146.50%。

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 178.33%;
- 2 渭玉公路路基桥隧工程 3 标完成计划的 132.98%;
- 3 铜旬高速公路路面 1 标完成计划的 146.14%;
- 4 黄延公路扩能路基桥隧 3 标段完成计划的 100.60%;
- 5 西咸新区北环线路基 8 标完成计划的 100.76%;
- 6 铜黄公路何黄段路面 3 标完成计划的 98.92%;
- 7 延延高速公路路面 1 标完成计划的 97.72%;
- 8 黄延公路扩能路基桥隧 22 标段完成计划的 95.80%;
- 9 新宝汉高速公路路面 2 标完成计划的 93.74%;
- 10 安平高速公路路面 1 标完成计划的 87.25%;
- 11 渭玉高速公路路面 1 标完成计划的 79.42%;
- 12 黄延高速公路路面 1 标完成计划的 80.73%;
- 13 青海花石峡至久治公路 13 标完成计划的 69.44%。

六、简要分析与建议：

1 **分析：**本月完成月度总体计划的 86.78%，重点项目管制目标、节点计划、质量、安全计划基本完成。

2 **存在问题：**①省内新承揽项目由于征地原因未能按期完成施工进度。

②省外花久 HD13 标段隧道：由于高原气候，施工人员适应性差和不稳定，致使隧道掌子面及衬砌施工进度严重滞后。

3 建议与措施：在建项目加强施工现场的管控，特别隧道提前做好施工的安全防范和施工过程的病害预防与处置预案；加强环境协调工作，由于冬季气候寒冷，做好冬季施工安全防范工作，确保施工人员人身安全。已完项目按照统计产值统计原则，做好统计产值梳理，确保产值准确性。抓紧工程价款计量，保证投入资金的回笼。

七、其他情况说明

- 1 统计资料截止日期为 10 月 30 日。
- 2 集团公司各部门采用数据，以统计简报数据为准。

2015 年 10 月 31 日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第四季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
陕西路桥集团有限公司合计		904953.15	802860.58	328100.00	300861.05	91.70%	38199.00	10534.59	27.58%	12140.00	10534.59	86.78%	88.72%
母公司项目小计		788876.21	696911.22	251090.00	215469.19	85.81%	33575.00	7804.44	23.24%	9918.00	7804.44	78.69%	88.34%
子公司项目小计		116076.94	105949.36	77010.00	85391.86	110.88%	4624.00	2730.14	59.04%	2222.00	2730.14	122.87%	91.28%
陕西路桥第一工程有限公司		156318.92	133031.79	41000.00	29348.12	71.58%	12163.00	3204.97	26.35%	3452.00	3204.97	92.84%	85.10%
1	龙永高速公路 24 标	20697.52	24696.21	5105.00	9103.69	178.33%	163.00	1927.21			1927.21		119.32%
2	陕西商丹一级公路项目	22214.00	15021.66	18164.00	10971.73	60.40%	3541.00			1984.00			67.62%
3	安康市汉滨区石梯汉江大桥	2223.52	1412.20	1231.00	1412.20	114.72%	168.00	199.07	118.49%	169.00	199.07	117.79%	63.51%
4	彬县豳风泾河大桥	9698.57	5582.34	6106.00	5582.34	91.42%	2163.00	1078.69	49.87%	1299.00	1078.69	83.04%	57.56%
5	镇安黄高速公路改建工程 C 标	979.32	608.31	979.00	608.31	62.14%							62.12%
6	宝汉高速公路汉中至陕川界 HC-10 标	14685.41	305.57	3100.00	305.57	9.86%	2781.00						2.08%
7	京台公路廊坊路基桥隧工程 LQ1 标	45482.00	46142.99	245.00	254.87	104.03%							101.45%
8	十堰至天水高速公路汉中段 H-C21 标	34604.46	38796.55	644.00	643.45	99.92%							112.11%
9	108 国道礼泉至武功公路改建工程	5734.13	465.96	4518.00	465.96	10.31%	3347.00						8.13%
陕西路桥第二工程有限公司		189221.14	150417.75	55000.00	54220.15	98.58%	4459.00	1474.09	33.06%	1504.00	1474.09	98.01%	79.49%
1	西宁南绕城公路土建工程 11 标	19800.00	22630.22		2597.23								114.29%
2	延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标	25291.45	25286.89	746.00	741.58								99.98%
3	青海省花九 HD-13 标	42000.00	26331.22	15046.00	10447.82	69.44%	2889.00			967.00			62.69%
4	黄延公路改扩能路基桥隧 22 标	52067.98	48683.51	26391.00	25282.34	95.80%	790.00	557.89	70.62%	500.00	557.89	111.58%	93.50%
5	榆林收费站北迁工程 SJ-TJ-2 标	3153.58	2980.17	1536.00	1363.04	88.74%							94.50%
6	S250 线灵朱段改建工程 SG-2 标	6494.40	6556.79	1698.00	1760.28	103.67%							100.96%

部门负责人：刘西雷

统计报告人：朱建荣

集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第四季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
7	零口至马召一级公路改建工程 I 标	10648.14	9082.75	5241.00	5268.99	100.53%							85.30%
8	江苏徐州 G206 大吴桥、G310 秦洪桥危桥 改造工程 QL2 标段	4372.38	3158.96	4342.00	3158.96	72.75%	780.00	37.50	4.81%	37.00	37.50	101.34%	72.25%
9	青海西宁市民和工业园主干道 A 标	4533.08	478.87		478.87								10.56%
10	西安绕城公路杏园立交改造 6 标	4307.97	1083.75		1083.75								25.16%
11	西安绕城公路杏园立交房建工程	2960.49	564.39		564.39								19.06%
12	西安绕城公路杏园立交改造工程房建 14	2784.69	295.86		295.86			295.86			295.86		10.62%
13	国道 541 石泉至汉王段公路改建工程 SH-2H 标段	8806.99	582.84		582.84			582.84			582.84		6.62%
14	尾留项目产值	2000.00	2701.53		594.20								
第三工程公司		173575.88	165198.10	40000.00	34186.93	85.47%	1941.00	139.61	7.19%	567.00	139.61	24.62%	95.17%
1	西海南绕城公路土建工程 9 标	39318.64	39786.47	245.00	127.80	52.16%							101.19%
2	西海南绕城公路土建工程 12 标	39421.00	40504.16	2995.00	4077.87	136.16%							102.75%
3	黄延公路扩能路基桥隧工程 LJ3 标	57750.88	56725.91	18565.00	18676.17	100.60%							98.23%
4	西海南绕城公路房建工程 XN-FJ6 标	1947.00	1085.15	1947.00	1085.15	55.73%	196.00	139.61	71.23%	137.00	139.61	101.91%	55.73%
5	西铜 14 年养护工程路基桥隧加固	248.00	222.69	248.00	222.69	89.79%							89.79%
6	汉宁高速 LMYH-2015-HN	3716.80	3300.09	3647.00	3300.09	90.49%							88.79%
7	汉宁高速 HNJG-2015	1474.10	1478.79	1540.00	1478.79	96.03%							100.32%
8	陕西交建 2015 年养护 LM-1 标	5425.64	4343.34	5425.00	4343.34	80.06%							80.05%
9	青海省共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4	16516.92	16862.61		890.05								102.09%
	待定新承接项目			5388.00			1745.00			430.00			

部门负责人：刘西雷

统计报告人：朱建荣

集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第四季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
	尾留项目产值	7756.90	888.87		-15.02								11.46%
第四工程公司		142173.03	135875.77	42100.00	36303.17	86.23%	4238.00	495.41	11.69%	480.00	495.41	103.21%	95.57%
1	西咸新区北环线路基 LJ-8 标	54278.38	53279.41	19320.00	19466.26	100.76%							98.16%
2	渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标	16958.00	17396.48	4316.00	5739.59	132.98%							102.59%
3	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	19712.26	19213.24	7326.00	5451.75	74.42%	1878.00						97.47%
4	西铜高速公路 TH-20 标	33577.74	36914.30	1138.00	1183.88	104.03%							109.94%
5	西咸新区北环线路基 LJ-1 标	3644.20	4428.11		396.38								121.51%
6	殡仪馆专用公路马鸣路工程尾留工程	20.80	20.28		20.28								97.48%
7	店塔红碱淖一级公路路基桥涵工程 N1 标	9855.16	2981.88	3000.00	2981.88	99.40%	560.00	495.41	88.47%	480.00	495.41	103.21%	30.26%
8	店红一级公路房建工程	3587.68	1144.28		1144.28		1800.00						31.89%
	待定新承接项目			7000.00									
	尾留项目产值	538.81	497.82		-81.11								92.39%
	神木石窑大桥	538.81	497.82		-81.11								92.39%
陕西路桥路面工程有限公司		243664.17	218337.17	150000.00	146802.68	97.87%	15398.00	5220.51	33.90%	6137.00	5220.51	85.07%	89.61%
集团公司承揽项目		127587.23	112387.81	72990.00	61410.82	84.14%	10774.00	2490.37	23.11%	3915.00	2490.37	63.61%	88.09%
1	延延高速公路路基 LM-1 标	25900.00	25552.94	17852.00	17444.91	97.72%							98.66%
2	渭玉高速路面 WY-M01 标	27050.60	21904.35	25006.00	19860.13	79.42%	4475.00						80.98%
3	安平高速公路路面 LM1 标	11363.00	9914.32	11363.00	9914.32	87.25%	1935.00	486.47	25.14%	1935.00	486.47	25.14%	87.25%
4	西宝改扩建工程 B-M07 标	15302.80	17143.67	5685.00	7340.06	129.11%	737.00	2003.90	271.90%	1980.00	2003.90	101.21%	112.03%
5	商丹一级公路路面工程	18607.00	6198.54	13084.00	6198.54	47.37%	3627.00						33.31%
6	机场线小修 2012-2015 年度小修养护工程	804.00	548.67		253.77								68.24%

部门负责人：刘西雷

统计报告人：朱建荣


集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第四季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
7	2014年榆靖公路养护工程 DL-2 标	658.92	781.24		-1.12								118.56%
8	榆绥高速公路路面 LM-2 标段	27900.91	30344.08		400.23								108.76%
	子公司承揽项目	116076.94	105949.36	77010.00	85391.86	110.88%	4624.00	2730.14	59.04%	2222.00	2730.14	122.87%	91.28%
9	黄延高速公路 HY-M1 标	35809.00	28907.18	35809.00	28907.18	80.73%	2833.00						80.73%
10	新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标	28812.00	25935.78	21121.00	19799.78	93.74%	269.00	730.28	271.48%	700.00	730.28	104.33%	90.02%
11	铜旬高速公路 TX-M01 标	12912.99	12689.47	8683.00	12689.47	146.14%	1522.00	1552.10	101.98%	1522.00	1552.10	101.98%	98.27%
12	铜黄公路何黄段路面工程施工 TH-3 标	20816.00	20693.05	11397.00	11274.03	98.92%							99.41%
13	2015年养护项目(吴靖养护 WJYH-7 标)	129.10	120.41		120.41								93.27%
14	铜延路面养护(LMYH-2015)	6322.97	6450.94		6450.94								102.02%
15	西宝路面养护工程 LMYH-2015-XB 标	4982.94	5597.61		5597.61			447.76			447.76		112.34%
16	2014年靖王养护 DL-1 标	788.84	654.27		12.04								82.94%
17	2014年吴靖公路养护工程 DL-4 标	1743.32	1559.11		52.40								89.43%
18	吴靖养护 QS-1 标	3007.87	2490.71		453.04								82.81%
19	吴靖养护 DL-14-A1 标	751.91	600.83		34.95								79.91%
	省道 102 线二级公路(II期) V 标		250.00										
	试验检测中心			400.00	287.73	71.93%					79.97		
	兴通监理公司			3400.00	4980.96	146.50%					1809.43		

部门负责人: 刘西雷


统计报告人: 朱建荣

2015年重点项目生产计划完成情况图表

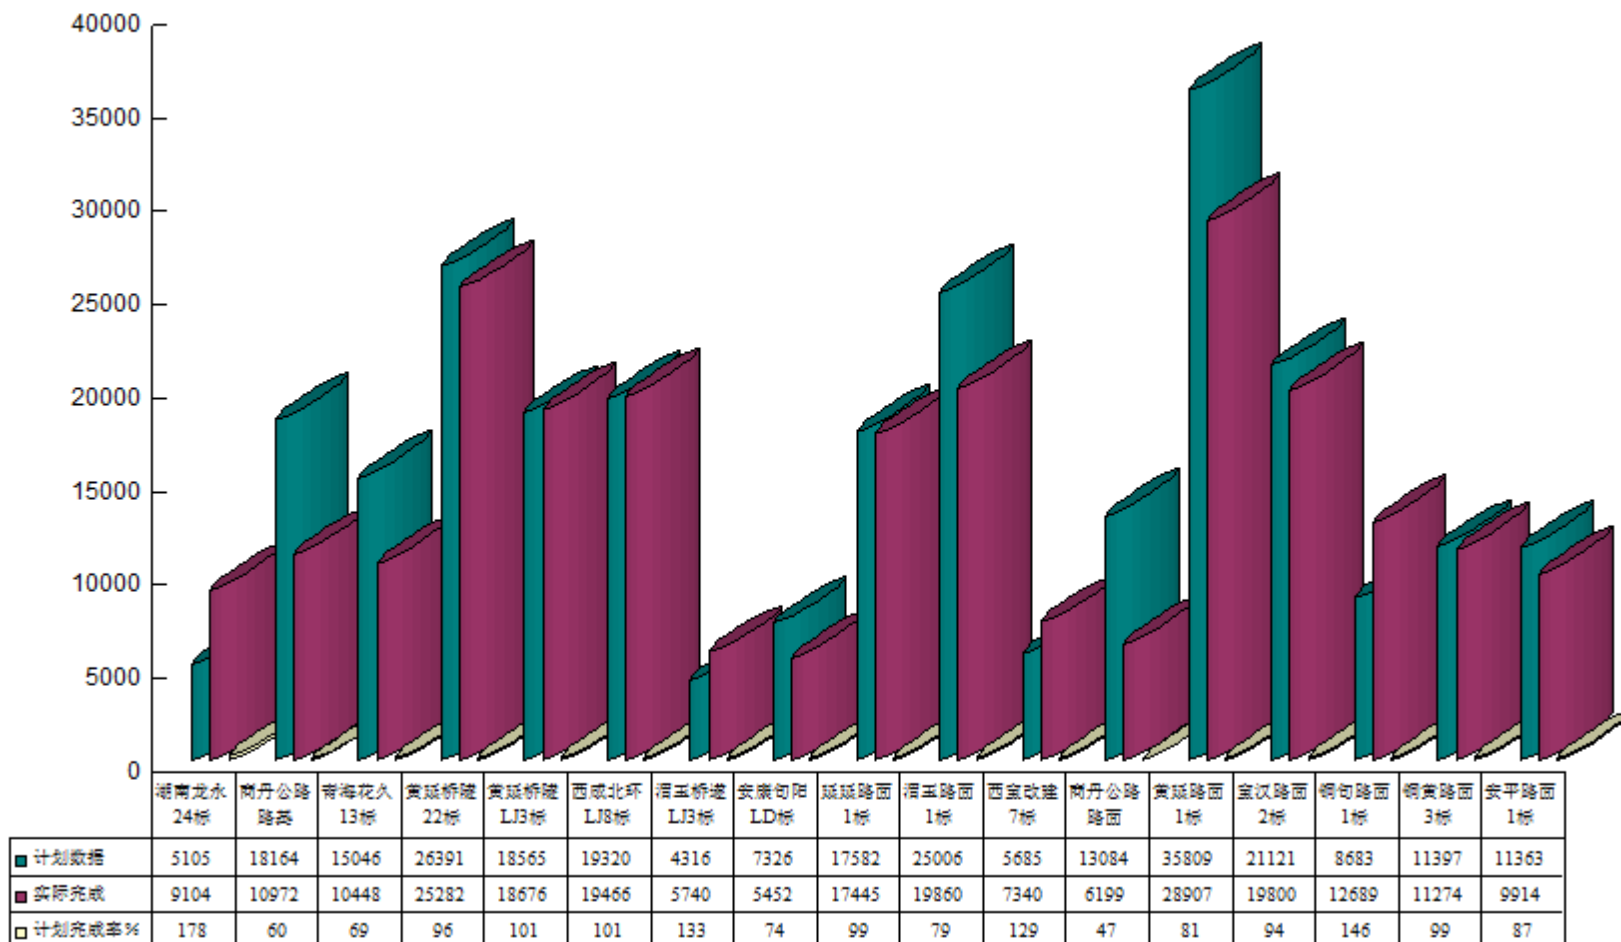

■ 计划数据 ■ 实际完成 □ 计划完成率%

2015年重点项目合同履行统计图表

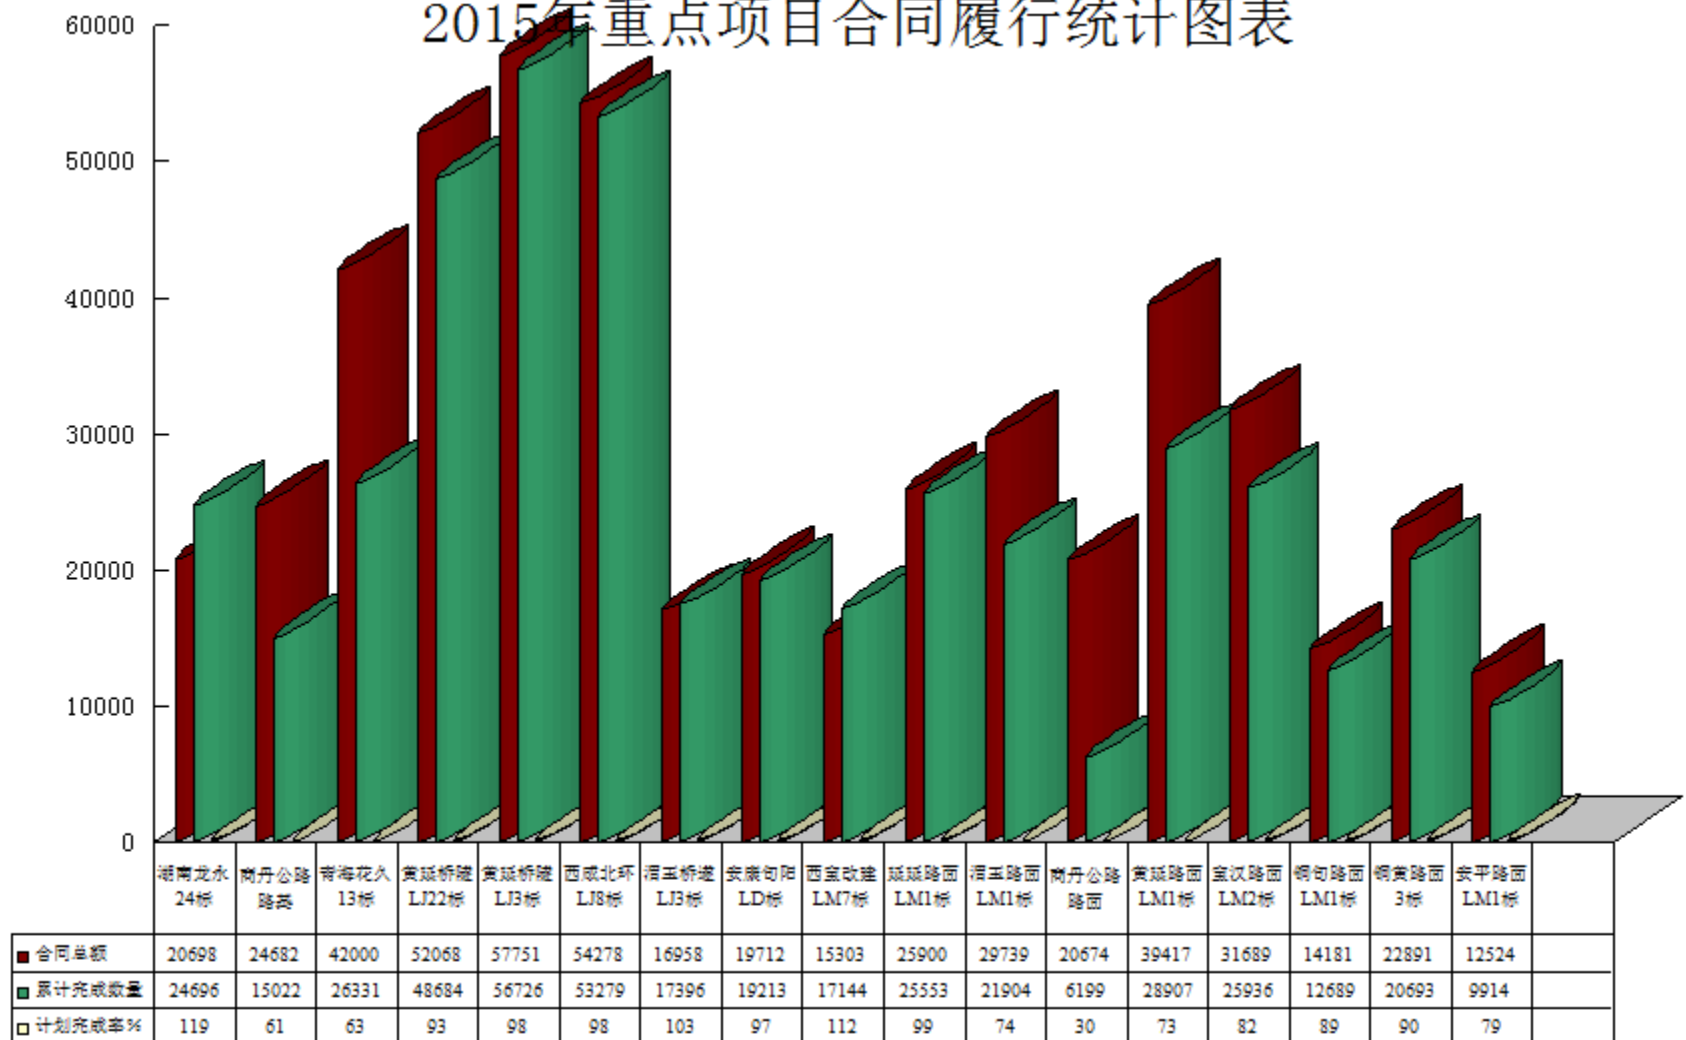

■ 合同总额 ■ 累计完成数量 □ 计划完成率%
