


# 陕西路桥统计简报

(第4期总第304期)

主办: 陕西路桥集团有限公司工程管理部

二〇一五年五月

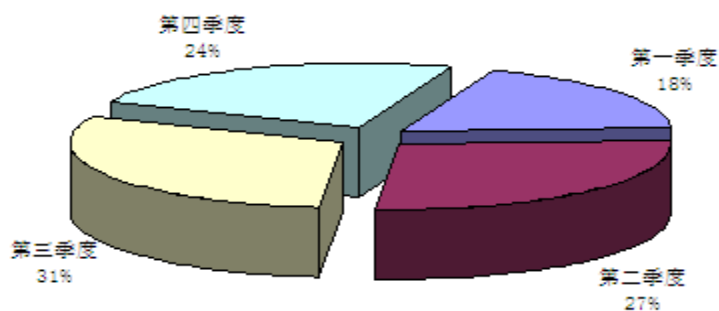

施工计划完成动态图

二〇一五年五月三十日

## 2015年5月份计划执行情况分析

### 一、主要经济指标

截止本月底累计完成产值 139952.42 万元，为年计划的 42.66%，全员劳动生产率 269904 元/人，分别高于去年同期水平 19.43%、18.48%，第二季度完成季度的计划的 63.04%，本月完成产值 44369.48 万元。

累计新承接项目 8.63 亿元，为年计划的 28.77%。

试验检测中心完成服务产值 59.16 万元，为年计划的 14.79%；兴通监理公司完成服务费用 1901.40 万元，为年计划的 55.92%，新承接任务 1920.13 万元，为年计划 66.21%。（季度报表）

### 二、主要工程形象进度（累计完成情况）

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 694/567 km<sup>3</sup>、钻孔桩 345/345 根、墩柱 258/258 根、盖梁 63/63 个、梁预制 215/215 片，箱梁安装 215/215 片，现浇箱梁 14 联，悬臂浇筑 104/104 块，为合同量 122%、100%、100%、100%、100%、100%、100%、100%。

#### 青海西宁南绕城公路土建工程 12 标

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 195km、土方 1317 km<sup>3</sup>，分别为合同量的 100%、87%、87%。钻孔桩 756/756 根、墩柱 620/620 根、盖梁 263/268 个、梁板 1250/1250 片、梁板安装 1240/1250 片、现浇箱梁 55/55 孔，为合同量 100%、100%、98%、100%、99%、100%。桥面系完成合同量的 100%。

#### 青海省花石峡至久治公路 HD13 标段

累计完成借土填方 390/542 km<sup>3</sup>，为合同量的 72%。隧道全断面开挖 1368/3790m、初期支护 1368/3790m、二衬 1135/3790m，为合同量 36%、36%、30%。

#### 黄延高速公路扩能工程 LJ-3 标

累计完成挖方 197/122 km<sup>3</sup>，为合同量的 161%，填方 271/338 km<sup>3</sup>，为合同量的 80%；水泥搅拌桩 420km。钻孔桩 99/99 根、墩柱 72/72 根、盖梁 31/31 个、箱梁预制 185/185 片、箱梁安装 185/185 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%；全断面掘进 4330/4330m、支护 4330/4330m、衬砌 4507/4507m，分别为合同量的 100%、100%、100%。

### 黄延高速公路扩能工程 LJ-22 标

累计完成挖方 779/585 km<sup>3</sup>，为合同量的 133%，抗滑桩 94/98 根，为合同量的 96%。隧道全断面掘进 3738/4570m、全断面支护衬砌 3593/4570m，隧道路面及附属 2080/4570m，分别为合同量的 81.79%、78.62%、45.51%。挡土墙完成合同量的 85.81%。

### 铜黄高速公路路面 TH-03 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 497/511km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 428/502 km<sup>2</sup>、粗粒式沥青混合料 ATB-30 下面层 364/489 km<sup>2</sup>、中粒式 SBS 改性沥青 AC-20 中面层 611/920 km<sup>2</sup>、细粒式沥青 AC-13 上面层 167/920 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 97%、85%、74%、66%、18%。

### 延（安）至延（川）高速公路路面 LM-1 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 523/520km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 500/581km<sup>2</sup>、粗粒式沥青碎石 368/391 km<sup>2</sup>、中粒式改性沥青 133/901km<sup>2</sup>，分别为合同量的 100%、86%、94%、15%。

### 黄（陵）至延（安）高速公路路面 LM-1 标

累计完成 4%水泥稳定碎石底基层 643/1000km<sup>2</sup>、4.5%水泥稳定碎石基层 545/1275km<sup>2</sup>、粗粒式沥青碎石 282/775 km<sup>2</sup>，中粒式沥青碎石 65/775 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 64%、43%、36%、4%。

### 西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 306/377km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 321/527 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 81%、61%。粗粒式密级配沥青混凝土 271/418km<sup>2</sup>、中粒式沥青混凝土 555/726km<sup>2</sup>、改性沥青混凝土 82/726km<sup>2</sup>，为合同量的

65%、76%、11%。

### 新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 505/514km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 543/634km<sup>2</sup>，分别为合同量的 98%、86%。粗粒式密级配沥青 374/477km<sup>2</sup>、中粒式改性沥青 550/813km<sup>2</sup>、改性沥青混凝土 6/814km<sup>2</sup>，为合同量的 78%、68%。

### 西咸北环线路基 LJ-8 标

累计完成借土填方 852/852 km<sup>3</sup>、强夯 508/508 km<sup>2</sup>、灰土、碎石桩 1258/1258km，分别为合同量的 100%、100%、100%；桥梁桩基 813/813 根、墩柱 468/468 根、盖梁 242/242 个、梁板预制 896/896 片、安装 896/896 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%。箱梁现浇完成合同 100%。

### 十天高速公路旬阳 LD 连接线 AD-LD 标

累计完成桥梁基础桩 326/326 根、墩柱 284/284 根、盖梁 159/159 个、箱梁预制 483/483 片、箱梁安装 483/483 片、桥面铺装 2632/4701m，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%、56%。隧道全面开挖 316/1243m、支护 316/1244m、衬砌 257/1245m，为合同量的 25.4%、25.4%、20.6%。

### 渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标

累计完成挖方 988/996 km<sup>3</sup>，为合同量的 99%。桥梁桩基 408/408 根、墩柱 258/258 根、盖梁 169/169 个、箱梁预制 532/532 片、安装 523/532 片，分别为合同总量 100%、100%、100%、100%、98%。挡墙完成合同 86%。

### 渭玉高速公路路面 WY-M01 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 437/753km<sup>2</sup>、水泥稳定碎石基层 477/825 km<sup>2</sup>、下面层 258/715 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 58%、58%、36%。

### 商丹一级公路路基桥隧改扩建工程

累计完成挖方 749/1042 km<sup>3</sup>、填方 293/369 km<sup>3</sup>，分别为合同量的 72%、

79%。桥梁桩基 209/241 根、墩柱 154/155 根、盖梁 93/125 个、板梁预制 184/206 片、安装 65/206 片、箱梁预制 298/308 片、安装 134/308 片、涵洞 50/72 道，分别为合同总量 87%、99%、74%、89%、31%、97%、43%、72%。铣刨沥青路面 52/342km<sup>2</sup>、铣刨水泥稳定基层 42/170 km<sup>2</sup>、铣刨石灰稳定底基层 20/80 km<sup>2</sup>，分别为合同量的 15%、24%、25%。

### 河南省道 250 线灵宝至朱阳段改建工程 S250SG-2 标

累计完成桥梁桩基 42/42 根、立柱 10/10 根、薄壁墩 6/6 根、盖梁 15/15 个，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%；隧道开挖 606/606m、初期支护 606/606m、二衬 606/606m，分别为合同总量 100%、100%、100%。

### 湖南龙永高速公路 24 标

累计完成路基挖填土石方 245/331 km<sup>3</sup>，为合同量的 74%。隧道开挖 4310/4488m、初期支护 4310/4488m、二次衬砌 3893/4488m，分别为合同总量 96%、96%、86.7%。

## 三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成产值 44369.48 万元，为计划的 93.87%。其中：

- 1 新宝汉高速公路路面 2 标完成计划的 145.30%；
- 2 黄延高速公路路面 1 标完成计划的 114.94%；
- 3 西咸新区北环线路基 8 标完成计划的 108.98%；
- 4 黄延公路扩能路基桥隧工程 3 标完成计划的 107.94%；
- 5 西宝高速公路改扩建路面 7 标完成计划的 100.61%；
- 6 十天高速公路旬阳连接线完成计划的 84.65%；
- 7 延延高速公路路面 1 标完成计划的 93.81%。
- 8 青海花石峡至久治公路 13 标完成计划的 76.64%；
- 9 黄延公路扩能路基桥隧工程 22 标完成计划的 74.52%；
- 10 铜黄公路何黄段路面工程 3 标完成计划的 71.37%；
- 11 渭玉高速公路路面 1 标完成计划的 69.26%；
- 12 湖南龙永公路 24 标完成计划的 53.22%；
- 13 渭玉公路路基桥隧工程 3 标完成计划的 45.01%；
- 14 铜旬高速公路路面 1 标完成计划的 37.91%；
- 15 安平高速公路路面 1 标完成计划的 27.82%；

- 16 商丹一级公路路面完成计划的 20.66%;
- 17 商丹一级公路工程完成计划的 13.34%。

#### 四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 30.91%;
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 57.06%;
- 3 第三工程公司完成计划的 51.60%;
- 4 第四工程公司完成计划的 53.01%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 35.27%;
- 6 试验检测中心完成计划的 14.97%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 55.92%。

#### 五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 黄延公路扩能路基桥隧工程 3 标段完成计划的 100.58%;
- 2 渭玉公路路基桥隧工程 3 标完成计划的 95.71%;
- 3 西咸新区北环线路基 8 标完成计划的 70.80%;
- 4 黄延公路扩能路基桥隧 22 标段完成计划的 58.61%;
- 5 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 55.49%;
- 6 新宝汉高速公路路面 2 标完成计划的 46.52%;
- 7 铜黄公路何黄段路面 3 标完成计划的 45.42%;
- 8 延延高速公路路面 1 标完成计划的 38.92%;
- 9 安平高速公路路面 1 标完成计划的 33.67%;
- 10 黄延高速公路路面 1 标完成计划的 30.37%;
- 11 青海花石峡至久治公路 13 标完成计划的 29.07%;
- 12 铜旬高速公路路面 1 标完成计划的 25.14%;
- 13 渭玉高速公路路面 1 标完成计划的 23.56%。

#### 六、简要分析与建议:

- 1 分析: 本月完成月度总体计划的 93.87%, 重点项目控制目标、节点

计划、质量、安全计划基本完成。

**2 存在问题：**①省内商丹一级公路总承包工程受到环境、农民阻工和设计方案的调整、雨水天气等因素影响，施工进度缓慢；

②省外隧道标段围岩极及不稳定，掌子面开挖进度缓慢，项目迎接检查问题整改，也是影响施工进度主要原因；

③影响路面进度缓慢存在一是路基单位路床交验迟缓；二是现场管理不到位，计划执行力差等因素，严重影响水稳（底）基层的施工。

**3 建议与措施：**要求加强施工现场管控，做好施工的安全防范和施工过程的病害预防与处置；细化施工班（组）节点目标，做到资源调配合理，责任落实到人，加强施工环境协调工作，确保项目施工正常。同时抓紧已完工程量计量，保证施工进度所需资金供给。

## 七、其他情况说明

1 统计资料截止日期为5月28日。

2 集团公司各部门采用数据，以统计简报数据为准。

2015年5月30日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

## 集团公司2015年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第二季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划产值	实际完成	完成 比率	本月计 划	实际 完成	完成 比率	
<b>陕西路桥集团有限公司合计</b>		<b>804467.45</b>	<b>622968.16</b>	<b>328100.00</b>	<b>139952.42</b>	<b>42.66%</b>	126880.00	<b>79988.58</b>	<b>63.04%</b>	<b>47267.00</b>	<b>44369.48</b>	<b>93.87%</b>	77.44%
<b>陕西路桥第一工程有限公司</b>		<b>134920.07</b>	<b>116358.40</b>	<b>41000.00</b>	<b>12674.73</b>	<b>30.91%</b>	<b>14466.00</b>	<b>8458.09</b>	<b>58.47%</b>	<b>5310.00</b>	<b>4159.78</b>	<b>78.34%</b>	86.24%
1	龙永高速公路24标	20697.52	18425.19	5105.00	2832.67	55.49%	2166.00	1947.91	89.93%	704.00	374.65	53.22%	89.02%
2	陕西商丹一级公路项目	22214.00	11371.09	18164.00	7321.16	40.31%	9392.00	4311.14	45.90%	3444.00	2934.85	85.22%	51.19%
3	安康市汉滨区石梯汉江大桥	2223.52	740.69	1231.00	740.69	60.17%	453.00	418.84	92.46%	158.00	145.19	91.89%	33.31%
4	彬县邕风泾河大桥	9698.57	881.88		881.88			881.88		1004.00	705.10	70.23%	9.09%
5	京台公路廊坊路基桥隧工程LQ1标	45482.00	46142.99		254.87			254.87					101.45%
6	十堰至天水高速公路汉中段H-C21标	34604.46	38796.55		643.45			643.45					112.11%
	待定新承接项目			16500.00			2455.00						
<b>陕西路桥第二工程有限公司</b>		<b>163827.93</b>	<b>125472.31</b>	<b>55000.00</b>	<b>31382.05</b>	<b>57.06%</b>	<b>19986.00</b>	<b>13912.45</b>	<b>69.61%</b>	<b>7359.00</b>	<b>7367.03</b>	<b>100.11%</b>	76.59%
1	西宁南绕城公路土建工程11标	19800.00	21897.91		1864.92			946.32		458.00	458.03	100.01%	110.60%
2	延延高速公路基桥涵工程LJ-6标	25291.45	25286.89	746.00	741.58								99.98%
3	青海花九HD-13标	42000.00	20352.50	15046.00	4469.11	29.70%	5111.00	2248.24	43.99%	1200.00	919.64	76.64%	48.46%
4	黄延公路改扩建能路基桥隧22标	52067.98	38868.57	26391.00	15467.39	58.61%	11189.00	8385.28	74.94%	4120.00	4446.97	107.94%	74.65%
5	榆林收费站北迁工程SJ-TJ-2标	3153.58	2898.15	1536.00	1281.02	83.40%	261.00	215.81	82.69%	216.00	215.81	99.91%	91.90%
6	S250线灵朱段改建工程SG-2标	6494.40	6434.25	1698.00	1637.73	96.45%	125.00	51.19	40.95%	100.00	51.19	51.19%	99.07%
7	零口至马召一级公路改建工程I标	10648.14	7482.49	5241.00	3668.73	70.00%	2072.00	1290.98	62.31%	764.00	770.44	100.84%	70.27%
8	G310秦洪桥危桥改造工程QL2标段	4372.38	2251.56	4342.00	2251.56	51.86%	1228.00	774.64	63.08%	501.00	504.96	100.79%	51.50%
<b>第三工程公司</b>		<b>138685.52</b>	<b>134776.61</b>	<b>40000.00</b>	<b>20641.89</b>	<b>51.60%</b>	<b>8569.00</b>	<b>7536.20</b>	<b>87.95%</b>	<b>3065.00</b>	<b>3171.07</b>	<b>103.46%</b>	97.18%
1	西宁南绕城公路土建工程9标	39318.64	39786.47	245.00	127.80	52.16%	245.00	127.80	52.16%				101.19%
2	西宁南绕城公路土建工程12标	39421.00	37993.19	2995.00	1566.90	52.32%	1873.00	1566.90	83.66%	720.00	792.85	110.12%	96.38%
3	黄延公路扩能路基桥隧工程LJ3标	57750.88	56420.18	18265.00	18370.43	100.58%	5520.00	5264.74	95.38%	2100.00	2220.11	105.72%	97.70%
4	西宁南绕城房建工程XN-FJ6标	1947.00	354.08	1947.00	354.08	18.19%	683.00	354.08	51.84%	245.00	158.11	64.53%	
5	2014年养护工程路基桥隧类加固	248.00	222.69	248.00	222.69	89.79%	248.00	222.69	89.79%				
	待定新承接项目			16300.00									
<b>第四工程公司</b>		<b>138564.55</b>	<b>121925.62</b>	<b>42100.00</b>	<b>22353.01</b>	<b>53.10%</b>	13302.00	<b>11365.78</b>	<b>85.44%</b>	<b>6127.00</b>	<b>6349.57</b>	<b>103.63%</b>	87.99%
1	西咸新区北环线路基LJ-8标	54278.38	47492.50	19320.00	13679.35	70.80%	8256.76	7484.29	90.64%	4120.00	4490.10	108.98%	87.50%

部门负责人：王旭亮

统计报告人：朱建荣




## 集团公司2015年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第二季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划产值	实际完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
2	渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标	16958.00	15787.83	4316.00	4130.94	95.71%	2405.85	1300.76	54.07%	1167.00	525.28	45.01%	93.10%
3	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	19712.26	16161.64	7326.00	2400.15	32.76%	2639.42	1561.20	59.15%	840.00	711.05	84.65%	81.99%
4	西铜高速公路 TH-20 标	33577.74	36914.30	1138.00	1183.88								109.94%
5	西咸新区北环线路基 LJ-1 标	3644.20	4428.11		396.38			396.38					121.51%
6	殡仪馆专用公路马鸣路工程		20.28		20.28								
	店塔立交 N1 标	9855.16	623.14		623.14			623.14			623.14		
	待定新承接项目			10000.00									
	<b>尾留项目产值</b>	<b>538.81</b>	<b>497.82</b>		<b>-81.11</b>								92.39%
	<b>陕西路桥路面工程有限公司</b>	<b>228469.38</b>	<b>124435.23</b>	<b>150000.00</b>	<b>52900.74</b>	<b>35.27%</b>	<b>70557.00</b>	<b>38716.06</b>	<b>54.87%</b>	<b>25406.00</b>	<b>23322.03</b>	<b>91.80%</b>	54.46%
1	延延高速公路路基 LM-1 标	25900.00	15055.74	17852.00	6947.70	38.92%	10610.00	5983.06	56.39%	3582.00	3360.38	93.81%	58.13%
2	渭玉高速路面 WY-M01 标	27050.60	7934.43	25006.00	5890.21	23.56%	12306.00	5107.40	41.50%	4061.00	2812.51	69.26%	29.33%
3	安平高速公路路面 LM1 标	11363.00	3826.37	11363.00	3826.37	33.67%	5226.00	1461.79	27.97%	2239.00	622.94	27.82%	33.67%
4	西宝改扩建工程 B-M07 标	15302.80	10703.75	5685.00	900.14	15.83%	1500.00	900.14	60.01%	700.00	704.25	100.61%	69.95%
5	商丹一级公路路面工程	18607.00	1772.69	13084.00	1772.69	13.55%	3399.00	499.61	14.70%	969.00	200.15	20.66%	
6	机场线小修 2012-2015 年度小修养护	804.00	480.13		185.23			185.23					59.72%
7	2014 年榆靖公路养护工程 DL-2 标	658.92	781.24		-1.12								118.56%
8	榆绥高速公路路面 LM-2 标段	27900.91	30344.08		400.23			400.23					108.76%
9	黄延高速公路 HY-M1 标	35809.00	10876.45	35809.00	10876.45	30.37%	17704.00	8026.94	45.34%	6555.00	4884.91	74.52%	
10	新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标	28812.00	15961.01	21121.00	9825.01	46.52%	8670.00	7258.05	83.71%	3068.00	4457.76	145.30%	55.40%
11	铜旬高速公路 TX-M01 标	12912.99	2183.26	8683.00	2183.26	25.14%	5280.00	1184.42	22.43%	2194.00	831.67	37.91%	
12	铜黄公路何黄段路面工程施工 TH-3 标	20816.00	14595.91	11397.00	5176.89	45.42%	5861.00	3464.36	59.11%	2038.00	1454.53	71.37%	70.12%
13	2015 年养护项目		120.41		120.41								
14	铜延路面养护 (LMYH-2015)		2238.31		2238.31						1986.41		
15	西宝路面养护工程 LMYH-2015-XB 标		2006.53		2006.53			2006.53			2006.53		
16	2014 年靖王养护 DL-1 标	788.84	654.27		12.04								82.94%
17	2014 年吴靖公路养护工程 DL-4 标	1743.32	1559.11		52.40								89.43%
18	吴靖养护 QS-1 标		2490.71		453.04								
19	吴靖养护 DL-14-A1 标		600.83		34.95								
	<b>试验检测中心</b>			<b>400.00</b>	<b>59.16</b>	14.79%							
	<b>兴通监理公司</b>			<b>3400.00</b>	<b>1901.42</b>	55.92%							

部门负责人: 王旭亮

统计报告人: 朱建荣

### 2015年重点项目生产计划完成情况图表

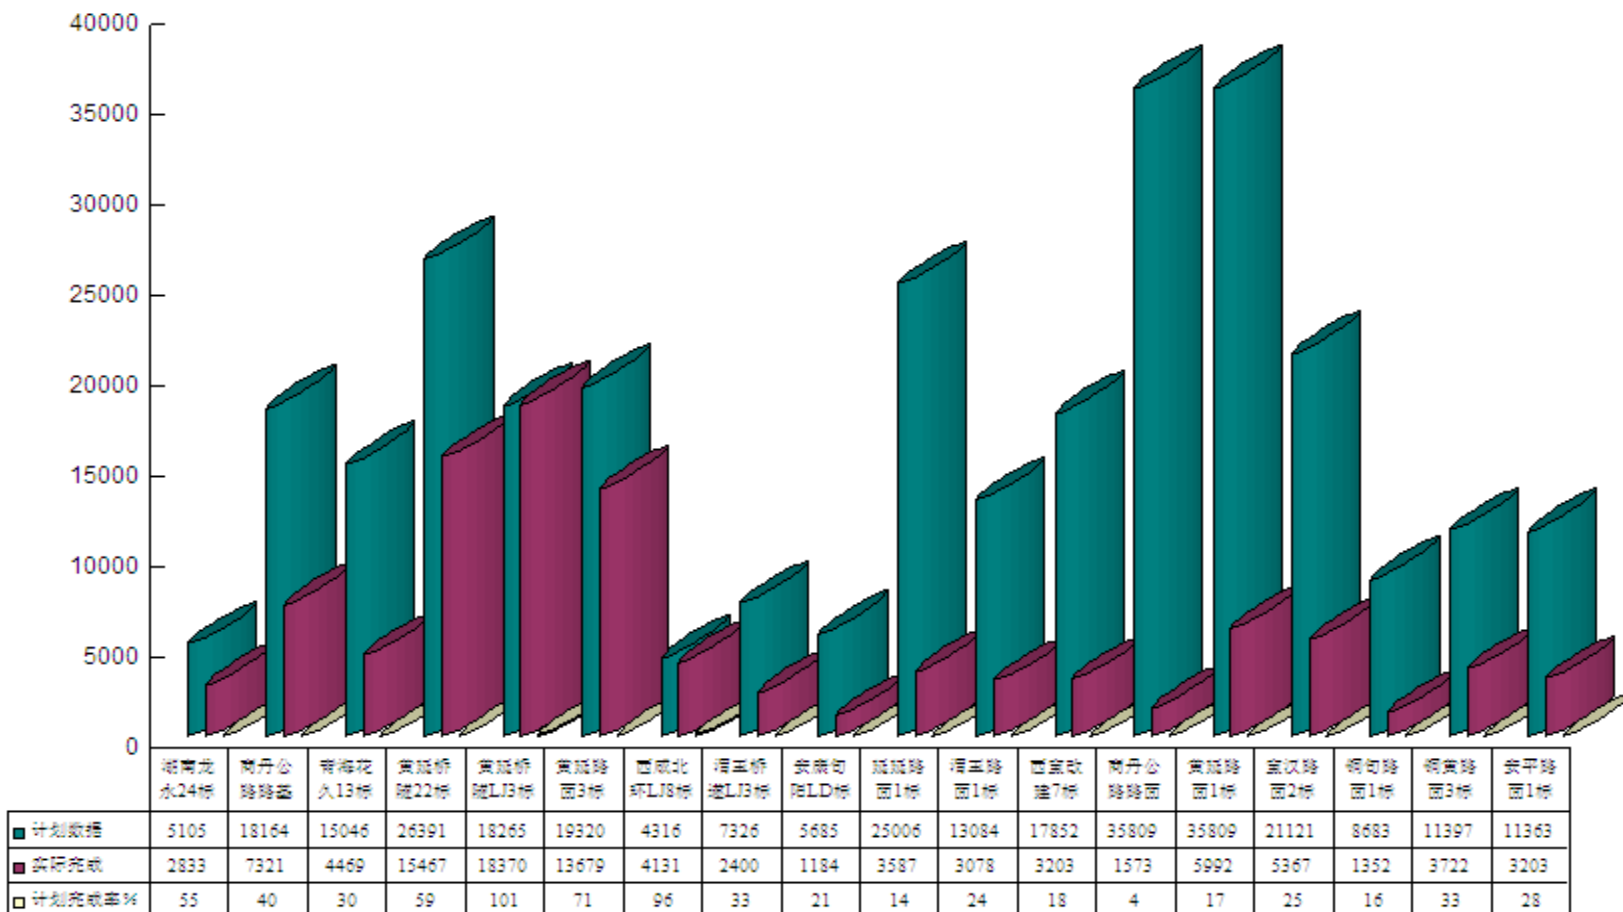


■ 计划数据 ■ 实际完成 □ 计划完成率%

部门负责人：王旭亮

统计报告人：朱建荣

### 2015年重点项目合同履行统计图表

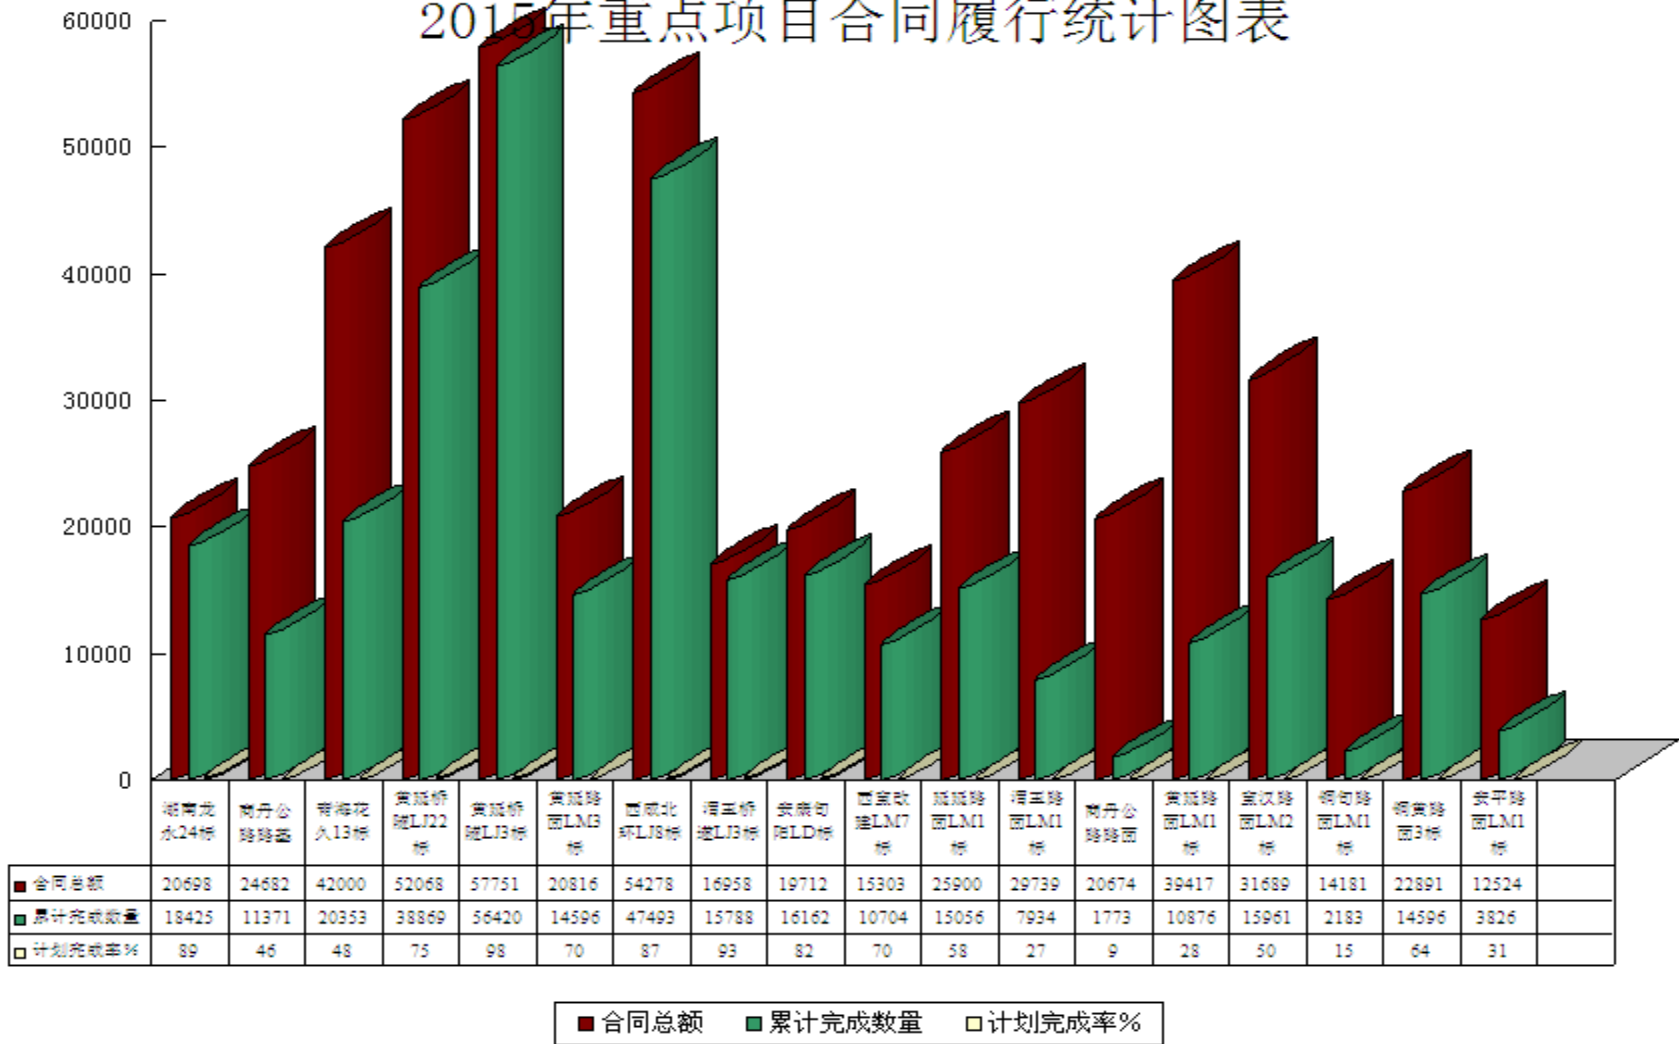

部门负责人：王旭亮

统计报告人：朱建荣
