


陕西路桥统计简报

(第6期总第317期)

主办：陕西路桥集团有限公司工程管理部

二〇一六年七月

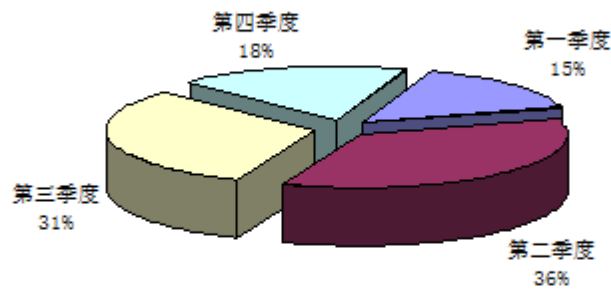

施工计划完成动态图

陕西路桥工程管理部

2016年7月份计划执行情况分析

一、主要经济指标

截止本月底累计完成产值 173431.45 万元，为年计划的 58.22%，为去年同水平的 76.34%。其中：母公司（含分公司自营项目 23759.11 万元在内）累计统计产值 132071.96 万元，子公司（含自营项目在内）完成 41359.47 万元。全员劳动生产率 347062 元/人，低于去年同期水平。

本月完成产值 28110.28 万元。其中：母公司（含分公司自营项目 4912.50 万元在内）完成 22688.06 万元，子公司（含自营项目在内）完成产值 5422.22 万元。

累计新承接项目 22.6545 亿元，为年计划的 75.51%。其中母公司新承接项目 15.1702 亿元。

试验检测中心完成服务产值 171.27 万元，为年计划的 42.82%；兴通监理公司完成服务费用 1809.82 万元（自营），为年计划的 51.71%，新承接任务 1614.02 万元，为年计划 46.11%。

二、主要工程形象进度（累计完成情况）

青海省花石峡至久治公路 HD13 标段

累计完成借土填方 405/542 km³，为合同量的 74.72%。隧道全断面开挖 3074/3790m、初期支护 3074/3790m、二衬 2499/3790m，为合同量 81.11%、81.11%、65.94%。

柞山高速公路路基桥隧 LJ-1 标

累计完成钻孔桩 192/223 根、墩柱 136/201 根、盖梁 28/62 片，为合同量的 86.09%、67.66%、45.16%。隧道开挖、支护、衬砌、仰拱分别完成合同量的 29.35%、29.35%、15.19%、22.22%。

吴定高速公路路基桥隧 LJ-2 标

累计完成桩基础 24/46 根，完成合同量 52.17%。隧道全断面掘进 2549/4188m、仰拱及回填 2072/4220m、全断面衬砌支护 2301/4188m，分别

为合同量的 60.02%、45.14%、40.09%。

国道 541 石泉至汉王段公路改建工程（路基、桥梁类）SH-2 标

累计完成挖土方 720/521 km³，分别为合同量的 138%。钻孔桩 40/54 根、墩柱 24/38 根、盖梁 12/31 个、箱梁预制 68/75 片，为合同量 81%、63%、39%、80%。挡土墙完成合同量的 50%。

宝汉高速公路汉川界 HC-10 标

累计完成挖方 412/350 km³、填方 308/260 km³，分别为合同量的 118%、118%。钻孔桩 437/440 根、墩柱 185/231 根、盖梁 113/160 个、梁板预制 309/587 片、板梁安装 157/587 片，为合同量 99%、80%、70%、53%、27%。

神木西过境红柳林至赵家梁公路工程

累计完成挖土石方 2800/3038 km³、填土石方 153/140 km³，分别为合同量的 92.17%、109.28%。钻孔桩 192/230 根、墩柱 48/89 根、梁板预制 147/310 片、薄壁墩 7.6/26 根，为合同量 83.47%、53.93%、47.42%、29.23%。通道涵洞完成合同总量的 100%。

G108 勉县至宁强公路建设项目宁强段路基桥隧工程（隧道类一组）

累计完成超前支护 314/3471m，隧道开挖 314/3471m，衬砌 131/3471m，仰拱 211/3471m，为合同量的 9.05%、9.05%、3.77%、6.08%。

十天高速公路旬阳 LD 连接线 AD-LD 标

累计完成桥梁基础桩 326/326 根、墩柱 284/284 根、盖梁 159/159 个、箱梁预制 483/483 片、箱梁安装 483/483 片、桥面铺装 4701/4701m，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%、100%。隧道全面开挖 1243/1243m、支护 1243/1243m、衬砌 1243/1243m，为合同量的 100%、100%、100%。

彬县幽风经河大桥

累计完成路基土方 145/145km³，基础桩 137/137 根、墩柱(肋板) 106/108 根、盖梁 27/27 个、箱梁预制、安装 230/230 片、T 梁预制、安装 45/45 片、桥面铺装 830/830m，分别为合同量的 100%、100%、98%、100%、100%、100%、100%。

西安至宝鸡改扩建工程（潘家湾至凉泉段）及宝鸡过境公路

本项目永久征地严重滞后，目前无法施工。

延志吴高速公路志丹东隧道治理工程 ZL-1 标

累计完成衬砌渗漏治理 1114/1114m、恢复装饰 115/115 km²、钢管桩注浆加固 109/126km、洞内排水 2966/2966m、基层 23/23 km²、路面 23/23 km²，分别为合同量的 100%、100%、86.50%、100%、100%、100%。

商丹一级公路路基桥隧改扩建工程

累计完成挖方 1080/1042 km³、填方 365/369 km³，分别为合同量的 104%、99%。桥梁桩基 230/232 根、墩柱 165/165 根、盖梁 119/121 个、板梁预制 187/187 片、安装 183/187 片、箱梁预制 305/305 片、安装 305/305 片、涵洞 96/84 道，分别为合同总量 99%、100%、98%、100%、84%、100%、100%、114%。铣刨沥青路面 109/350km²、铣刨水泥稳定基层 85/187 km²、铣刨石灰稳定底基层 85/208 km²，分别为合同量的 31%、45%、41%。4%水泥稳定碎石 454/470km²、4.5%水泥稳定碎石 451/478km²、下面层 638/668km²、上面层 652/809km²，为合同量的 96%、94%、95%、81%。

三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成产值 28110.28 万元，为计划的 95.22%。其中：

- 1 吴定高速公路路基桥隧 LJ-2 标完成计划的 115.13%；
- 2 柞山公路路基桥隧 A 组 1 标完成计划的 112.64%；
- 3108 国道勉县至宁强公路项目宁强段路基完成计划的 111.83%；
- 4 神木西过境红柳林至赵家梁公路工程完成计划的 109.18%；
- 5 宝汉高速公路汉川界 HC-10 标完成计划的 91.17%；
- 6 商丹一级公路路面完成计划的 82.75%；
- 7 青海花石峡至久治公路 13 标完成计划的 68.94%；
- 8 彬县幽风泾河大桥完成计划的 63.90%；
- 9 国道 541 石王段公路改建工程 SH-2H 标完成计划的 35.64%。

四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 45.01%；
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 54.50%；
- 3 第三工程公司完成计划的 51.91%；

- 4 第四工程公司完成计划的 41.56%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 43.85%;
- 6 陕西路桥集团总承包公司完成计划的 41.32%;
- 7 试验检测中心完成计划的 42.82%;
- 8 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 51.71%。

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 彬县幽风泾河大桥完成计划的 107.45%;
- 2 延志吴志丹东隧道治理 2 标完成计划的 84.20%;
- 3 柞山公路路基桥隧 A 组 1 标完成计划的 69.17%;
- 4 青海花石峡至久治公路 13 标完成计划的 65.86%;
- 5 吴定高速公路路基桥隧 LJ-2 标完成计划的 62.26%;
- 6 宝汉高速公路汉川界 HC-10 标完成计划的 56.88%;
- 7 神木西过境红柳林至赵家梁公路工程完成计划的 55.42%;
- 8 国道 541 石王段公路改建工程 SH-2H 标完成计划的 48.36%;
- 9 G108 宁强段工程建设项目 SD 标完成计划的 28.38%。

六、简要分析与建议：

1 **分析：**本月完成月度总体计划的 95.22%，重点项目管制目标、节点计划、质量、安全计划基本完成。

2 **存在问题：**新承揽项目征地滞后，严重影响进度。

3 **建议与措施：**项目要加强施工现场的管控，做好防洪和施工安全防范工作，确保施工人员人身安全。建议各单位加强施工计划管理，抓紧时间做好新承接项目总体计划编制，并报工程管理部。

七、其他情况说明

- 1 统计资料截止日期为 8 月 1 日。
- 2 集团公司各部门采用数据，以统计简报数据为准。

2016年8月1日

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

集团公司2016年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	累计完成 合同比率	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			本月实际 完成产值
					计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	
	陕西路桥集团有限公司合计	908330.27	803176.30	88.42%	287472.00	173431.44	60.33%	84658.00	28110.27	31.66%	28110.27
	其中：母公司在建项目小计	210699.98	175840.71	83.46%	162139.00	87184.71	53.77%	48301.00	16170.82	31.02%	16170.82
	子公司在建项目小计	74018.95	35596.18	48.09%	72070.00	27423.19	38.05%	19689.00	5395.70	26.81%	5395.70
	分公司在建项目小计	100080.00	23759.91	23.74%	53263.00	23759.91	44.61%	16668.00	4912.50	29.47%	4912.50
	母公司尾留项目小计	391931.51	429825.05	109.67%		21127.34			1604.74		1604.74
	子公司尾留项目小计	131599.83	138154.44	104.98%		13936.28			26.51		26.51
	2016年待定项目计划				62937.00			3600.00			
	一、陕西路桥第一工程有限公司	74561.38	59242.77	79.46%	50000.00	28545.11	57.09%	14236.00	2862.52	20.11%	2980.31
	1、母公司在建项目小计	54861.50	46680.18	85.09%	40733.00	21775.23	53.46%	11591.00	2516.93	21.71%	2516.93
1	陕西商丹一级公路项目	22214.00	19582.68	88.15%	1261.00	4561.02		330.00			
2	彬县邕风泾河大桥	9698.57	10894.56	112.33%	2955.00	3175.07	107.45%	1169.00	334.83	28.64%	334.83
3	宝汉高速公路汉川界HC-10标	14685.41	9863.30	67.16%	11701.00	9557.73	81.68%	5576.00	1679.36	30.12%	1679.36
4	安康汉阴县喜河索桥拆除新建工程	3442.00	1451.57	42.17%	1700.00	1451.57	85.39%	457.00	89.55	19.59%	89.55
5	安康市汉滨区石梯汉江大桥建设工程	2223.52	2182.07	98.14%	516.00	323.84	62.76%	339.00	49.74	14.67%	49.74
6	安平高速公路边坡滑坡治理工程	1500.00	1158.50	77.23%	1500.00	1158.50	77.23%	540.00			
7	安川高速高滩2#桥抢险工程	1098.00	1098.78	100.07%	1100.00	1098.78	99.89%				
8	陕西交通集团蓝田管理所职工餐厅改扩建工程		85.26			85.26					
9	312国道改线工程LJ-05标		363.46		1500.00	363.46		750.00	363.46		363.46
10	吴定高速公路LJ-8标				4815.00			405.00			
11	吴定高速公路LJ-3标				5044.00			2025.00			
	待定新承接项目				8641.00						
	2、子公司在建项目小计	19699.88	12562.59	63.77%	9267.00	6769.88	73.05%	2645.00	345.59	13.07%	463.39
1	108国道礼武公路改建N2标	5734.13	3384.95	59.03%	5170.00	2401.60	46.45%	2645.00	345.59	13.07%	345.59
2	其他项目(含抢险项目在内)	7695.00	4388.13	57.03%	4097.00	4388.13	107.11%				117.79
4	镇安黄高公路改建工程C标	979.32	1123.57	114.73%		156.05					
5	S307省道改扩建工程LJ2标	5291.44	3665.95	69.28%		-175.89					

部门负责人：刘西雷

统计报告人：朱建荣

集团公司2016年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	累计完成 合同比率	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			本月实际 完成产值
					计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	
二、	陕西路桥第二工程有限公司	172245.10	144344.31	83.80%	60000.00	38052.53	63.42%	22288.00	7761.21	34.82%	7761.21
	1、母公司在建项目小计	60342.52	54878.90	90.95%	20550.00	15936.90	77.55%	6301.00	1812.24	28.76%	1812.24
1	青海花九 HD-13 标	42000.00	38269.73	91.12%	10926.00	11938.51	109.27%	4133.00	931.73	22.54%	931.74
2	江苏 G310 秦洪桥危桥改造 QL2 标	4372.38	4243.18	97.05%	844.00	715.14	84.73%	220.00	208.03	94.56%	208.03
3	2015 年徐州国道桥梁改造 WQ15-1 标	756.00	693.63	91.75%	756.00	693.63	91.75%				
4	商丹一级公路交通安全设施	2566.00	1421.08	55.38%	2566.00	1421.08	55.38%	1948.00	402.48	20.66%	402.48
5	零马一级公路改建工程 I 标	10648.14	9471.29	88.95%	388.00	388.54	100.14%				
6	商丹一级公路改建工程房建工程		780.00			780.00			270.00		270.00
	待定新承接项目				5070.00						
	2、母公司尾留项目小计	52050.13	61978.71	119.08%		2504.69			1020.10		1020.10
1	黄延公路改扩能路基桥隧 22 标	52067.98	50403.22	96.80%		1020.10			1020.10		1020.10
2	省级神府高速公路声屏障工程	540.01	516.13	95.58%		-2.71					
3	2014 年公路养护工程 JT-6 标	1295.71	1355.10	104.58%		253.64					
4	2014 年公路养护交安完善 JT-3 标	442.90	437.74	98.84%		359.94					
5	西宝高速咸阳收费站改扩建工程 XY-TJ 标	1990.00	1906.24	95.79%		-86.76					
6	榆绥高速公路交安设施 BZ-1 标	1189.57	1642.92	138.11%		-27.77					
7	西商高速公路 LJ-25 标	39775.99	48308.87	121.45%		69.45					
8	陕甘界至永寿起点段路基路面交安绿化 55 标	2027.00	1912.85	94.37%		-15.07					
9	福银高速公路彬县东收费站 3 标	1725.19	2253.25	130.61%		523.89					
10	勉县收费站改扩建 MX-KJ 合同段	659.39	740.35	112.28%		80.76					
11	2011 年水毁治理工程 TJ-ZL-1 标段	158.25	272.00	171.88%		65.55					
12	咸阳西收费站改扩建工程	1841.18	2236.54	121.47%		227.44					
13	西安绕城高速公路桥梁加固维修工程	184.64	184.40	99.87%		16.54					
14	青银高速吴靖段桥梁维修工程	220.30	212.33	96.38%		19.69					
	3、子公司在建项目小计	51044.07	20212.18	39.60%	39450.00	17831.89	45.20%	15987.00	4928.87		4928.87
1	青海西宁市民和工业园主干道 A 标	4533.08	1936.43	42.72%	2992.00	1457.56	48.72%	1928.00	163.19	8.46%	163.19

部门负责人：刘西雷

统计报告人：朱建荣

集团公司2016年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	累计完成 合同比率	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			本月实际 完成产值
					计划产值	实际完成	完成比率	计划产值	实际完成	完成比率	
2	国道541石王段公路改建工程SH-2H标段	8806.99	4691.14	53.27%	7548.00	3649.97	48.36%	2774.00	329.07	11.86%	329.07
3	西安绕城公路杏园立交房建13标	2677.00	564.39	21.08%	2113.00						
4	西安绕城公路杏园立交房建14标	2093.00	518.31	24.76%	1797.00	222.45	12.38%				
5	108国道勉县至宁强公路项目宁强段路基	9068.00	1418.81	15.65%	5000.00	1418.81	28.38%	1001.00	390.27	38.99%	390.27
6	神木西过境红柳林至赵家梁公路工程	23866.00	11083.09	46.44%	20000.00	11083.09	55.42%	10284.00	4046.33	39.35%	4046.33
	4、子公司尾留产值小计	8808.39	7274.53	82.59%		1779.05					
1	西安绕城通行能力提升KN-STJ-1标	3630.35	958.37	26.40%		958.37					
2	榆绥高速公路交安设施AQ-5标	2764.09	2869.22	103.80%		-57.27					
3	西长四个一房建工程3标	439.79	766.83	174.36%		200.83					
4	福银高速公路彬县东收费站4标	1974.16	2680.10	135.76%		677.11					
	第三工程公司	213338.48	165534.35	77.59%	60000.00	33192.12	55.32%	13183.00	4430.64	33.61%	4430.64
	1、母公司在建项目小计	13548.00	11224.43	82.85%	20335.00	10062.95	49.49%	1078.00	1207.71	112.03%	1207.71
1	延志吴公路志丹东隧道治理工程1标	9698.00	8166.13	84.20%	9698.00	8166.13	84.20%		795.86		795.86
2	宝鸡秦岭森林防火通道暨宝坪便道	2486.00	1694.28	68.15%	2491.00	1694.28	68.02%	1078.00	391.84	36.35%	391.84
3	西宁南绕城公路房建工程XN-FJ6标	1364.00	1364.02	100.00%	203.00	202.54	99.77%		20.00	#DIV/0!	20.00
	待定新承接项目				7943.00						
	2、分公司在建项目小计	72881.00	16523.07	22.67%	39665.00	16523.07	41.66%	12105.00	3222.93	26.62%	3222.93
1	吴定公路路基桥隧试验段LJ-2标	29368.00	13628.46	46.41%	18608.00	13628.46	73.24%	5558.00	2289.81	41.20%	2289.81
2	渭南经济技术开发区市政道路改建	3000.00	2459.47	81.98%	3000.00	2459.47	81.98%	1019.00	497.97	48.87%	497.97
3	西宝改扩建工程及宝鸡过境公路	35956.00			13500.00			2527.00			
4	延志吴公路志丹东隧道治理工程2标	4557.00	435.14	9.55%	4557.00	435.14		3001.00	435.14	14.50%	435.14
	3、母公司尾留项目小计	126909.48	137786.85	108.57%		6606.10					
1	西宁绕城公路12标	35007.86	42082.70	120.21%		708.43					
2	青海省共和至玉树(结古)公路GYI-SGA4标	16516.92	20293.27	122.86%		3430.66					
3	神渭管道输煤项目六(1)标段	2928.53	3583.95	122.38%		161.01					
4	吴靖段事故多发路段整治工程	1911.21	1578.03	82.57%		18.32					
5	商界桥梁桩基加固工程	420.00	420.00	100.00%		66.50					
6	陕西交建2015年养护LM-1标	5425.64	5363.49	98.85%		777.37					
7	交建2015年新增路面养护工程	1757.53	1866.91	106.22%		638.13					
8	汉宁高速HNJG-2015	1474.10	1608.63	109.13%		129.84					
6	汉宁高速LMYH-2015-HN	3716.80	4263.96	114.72%		675.84					
	四、第四工程公司	162436.31	146658.83	90.29%	41000.00	22328.72	54.46%	9258.00	2960.54	31.98%	2960.54

部门负责人：刘西雷

统计报告人：朱建荣

集团公司2016年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	累计完成合 同比率	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			本月实际 完成产值
					计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	
1、母公司在建项目小计		30376.61	28695.06	94.46%	27402.00	9481.83	34.60%	4305.00	686.33	15.94%	686.33
1	汉江水电站南岸坝址段二级公路	3265.00	1300.03	39.82%	3265.00	1300.03		34.00			
2	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	23135.00	24313.08	105.09%	1127.00	5099.85	452.52%				
3	西铜庄里连接线 XT-FL01 合同段路基养护工程	39.85	39.85	100.00%		39.85					
4	郑卢公路洛宁段地质灾害及完善设计工程 LNTJ-1 标	3763.97	2931.27	77.88%	3328.00	2931.27		1083.00	686.33	63.37%	686.33
5	旬阳县旬河大桥改建工程-人行便桥建设工程	172.79	110.84	64.15%	111.00	110.84					
6	柞山公路路基桥隧工程施工 10 标				3366.00			1188.00			
	待定新承接项目				16205.00			2000.00			
2、分公司在建项目小计		27199.00	7236.84	26.61%	13598.00	7236.84	53.22%	4563.00	1689.57	37.03%	1689.57
1	柞山公路路基桥隧工程施工 1 标	27199.00	7236.84	26.61%	10463.00	7236.84	69.17%	3545.00	1689.57	47.66%	1689.57
2	柞山公路路基桥隧工程施工 11 标				3135.00			1018.00			
3、母公司尾留项目小计		104860.70	110726.92			5610.05			584.64		584.64
1	西咸新区北环线路基 LJ-8 标	54278.38	55266.71	101.82%		1043.26					
2	店塔红碱淖一级公路路基桥涵工程 N1 标	9855.16	4066.35	41.26%		730.39			60.71		60.71
3	店红一级公路房建工程	3587.68	3638.69	101.42%		2494.41					
4	西铜公路陵前立交庄里连接线立交桥	20181.48	29376.81	145.56%		360.11			523.93		523.93
2	渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标	16958.00	18378.36	108.38%		981.88					
五、陕西路桥路面工程有限公司		264277.00	276458.27	104.61%	50000.00	40375.18	80.75%	18611.00	8602.14	39.83%	8602.14
1、母公司在建项目小计		30099.36	23424.38	77.82%	26647.00	18990.04	71.27%	17554.00	7382.88	42.06%	7382.88
1	商丹一级公路路面工程	19338.00	16538.21	85.52%	11712.00	10339.67	88.28%	4465.00	1655.09	37.07%	1655.09
2	黄延高速扩能 LJ-25 标段	1974.09	868.27		1974.00	868.27		1491.00	547.97		547.97
3	交建 2016 年第一批养护工程 DL-2 标	8415.82	5968.41		8420.00	5968.41		7057.00	4604.92		4604.92
4	机场小修 2016-2017 年度小修养护	371.45	49.49			49.49					
5	高速公司养护工程 LMYH-2016-02 标				4541.00	1764.20		4541.00	1764.20		1764.20
2、母公司尾留项目小计		108111.20	119332.56			6406.50					
1	机场线小修 2012-2015 年度小修养护工程	804.00	580.86	72.25%		32.20					
2	西宝改扩建工程 B-M07 标	15302.80	17359.24	113.44%		215.57					
3	渭玉高速路面 WY-M01 标	27050.60	26946.72	99.62%		5042.37					
4	十天高速公路陕西汉略 HL-M04 标	9075.29	14992.14	165.20%		1204.11					
5	青兰高速公路公路路面工程 LM5 标	28784.69	32230.56	111.97%		-48.18					
6	西镇 2013 年公路养护工程 DL-6 标	93.93	92.93	98.94%		-6.00					

部门负责人：刘西雷

统计报告人：朱建荣


集团公司2016年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	累计完成 合同比率	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			本月实际 完成产值
					计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	
7	宝汉高速公路 LM1 标	26999.89	27130.11	100.48%		-33.56					
	3、子公司在建项目小计	3275.00	2821.41	86.15%	23353.00	2821.41	12.08%	1057.00	3.45	0.33%	3.45
1	姜眉公路太白过境段改建工程路面工程 E 标	3275.00	2821.41	86.15%	3275.00	2821.41	86.15%	457.00	3.45	0.76%	3.45
	待定计划				20078.00			600.00			
	4、子公司尾留项目小计	122791.45	130879.92	106.59%		12157.23			26.51		26.51
1	黄延高速公路 HY-M1 标	35809.00	37589.97	104.97%		8682.80					0.00
2	新宝汉高速公路路面 HC-LM2 标	28812.00	26235.79	91.06%		300.01					
3	铜旬高速公路 TX-M01 标	12912.99	14474.51	112.09%		333.27					
	西宝路面养护工程 LMYH-2015-XB 标	4982.94	5624.13	112.87%		26.51			26.51		26.51
4	2015 年养护项目(吴靖养护 WJYH-7 标)	129.10	125.35	97.10%		125.35					
5	2015 年西潼项目	632.41	632.41	100.00%		632.41					
6	吴靖养护 DL-14-A1 标	751.91	602.98	80.19%		2.15					
7	吴靖养护 DL-14-A2 标	171.98	156.45			12.57					
8	2014 年靖王养护 DL-1 标	788.84	810.17	102.70%		155.90					
9	2014 年吴靖公路养护工程 DL-4 标	1743.32	1111.04	63.73%		-448.07					
10	吴靖养护 QS-1 标	3007.87	2277.41	75.72%		-213.29					
11	延志吴高速公路 LM-3 标段	12208.00	18392.41	150.66%		1256.63					
12	西长桥涵 XC-LM3(2014 年)	25.09	25.09	100.02%		-9.45					
13	铜黄公路何黄段路面工程施工 TH-3 标	20816.00	22822.18	109.64%		1300.43					
	总承包公司在建项目小计	21472.00	10937.77	50.94%	26472.00	10937.77	41.32%	7472.00	1375.45	18.41%	1378.45
1	宁夏国道 338 线甘塘至营盘水(宁甘界)段公路	2472.00	894.59		2472.00	894.59		2472.00	894.59		894.59
2	商丹一级公路路基路面安全设施	19000.00	9495.56	49.98%	19000.00	9495.56	49.98%	4000.00	-66.76	-1.67%	-66.76
	待定新承接项目				5000.00			1000.00			
1	青兰 2016 年至 2017 年小修保养工程		318.23			318.23			318.23		318.23
2	包茂 2016 年至 2017 年小修保养工程		216.41			216.41			216.41		216.41
3	青兰 2016 年至 2017 年肇事维修工程		12.98			12.98			12.98		12.98
	试验检测中心				400.00	171.27	42.82%	100.00			
	兴通监理公司				3500.00	1809.82	51.71%	1000.00			

部门负责人:刘西雷

统计报告人:朱建荣

2016年重点项目生产计划完成情况图表

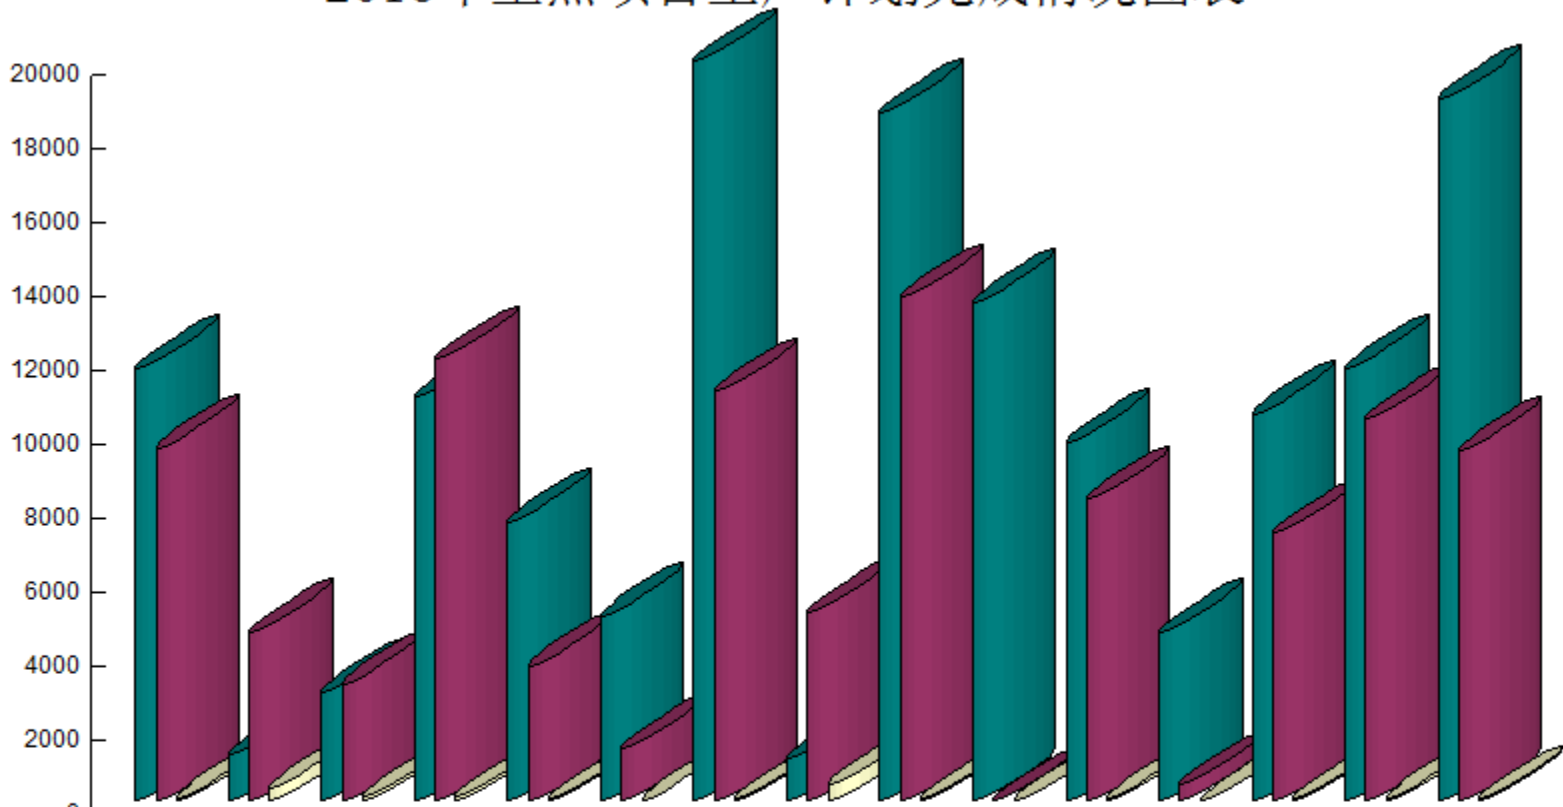

	宝汉路高10标	商丹公路路高	彬县唐风泾河大桥	青海花火13标	石王公路路高2标	勉宁公路路高	神木过境路高隧道	安康旬阳LD标	吴定路高桥隧2标	西宝改建隧道	延安吴陵道安治	延安吴陵道安治	作山路高桥隧	商丹公路路面	商丹路高交安
■ 计划数据	11701	1261	2955	10926	7548	5000	20000	1127	18608	13500	9698	4557	10463	11712	19000
■ 实际完成	9558	4561	3175	11939	3650	1419	11083	5100	13628	0	8166	435	7237	10340	9496
□ 计划完成率%	82	362	107	109	48	28	55	453	73	-	84	10	69	88	50

■ 计划数据 ■ 实际完成 □ 计划完成率%

2016年重点项目合同履行统计图表

